

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

1ο: Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για το έργο:

«Σύμβουλος για (α) την εκτίμηση των Κινδύνων μη υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” με βάση τις πράξεις και (β) την αξιολόγηση της πορείας Εφαρμογής του, με στόχο τη διαμόρφωση της πρότασης 4ης Αναθεώρησής του»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

**ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ)**



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη»



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αθήνα , Νοέμβριος 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	1
1.1	Κίνδυνος και Διαχείριση Κινδύνου	1
1.2	Ορισμοί – Διευκρινήσεις.....	3
1.3	Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.	4
1.4	Αντικείμενο – Στόχος της παρούσας εκτίμησης κινδύνων.....	4
2	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 6	
2.1	Αρχικοποίηση – Πλαίσιο Εφαρμογής.....	6
2.2	Αναγνώριση Κινδύνων.....	6
2.3	Ανάλυση Κινδύνων	8
2.4	Εκτίμηση Κινδύνων	9
2.5	Αποτίμηση Κινδύνων	9
2.6	Διαχείριση / Αντιμετώπιση Κινδύνων.....	12
2.7	Αποτίμηση Κινδύνων ανά Φάση του Κύκλου Ζωής Έργων.....	14
2.8	Στάδιο Αναγνώρισης Κινδύνων Μεθοδολογικής Προσέγγισης για την αποτίμηση και διαχείρισης κινδύνων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.....	15
3	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.....	35
3.1	Μεθοδολογία για την αποτίμηση κινδύνου των Δικαιούχων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.	35
3.1.1	Παράγοντες κινδύνου Δικαιούχων	35
3.2	Ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων και εξαγόμενα στοιχεία μεθοδολογίας αποτίμησης κινδύνου των Δικαιούχων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.	43
3.3	Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου των Δικαιούχων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.....	50
3.3.1	Συνολικά συμπεράσματα	Error! Bookmark not defined.
3.3.2	Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Δικαιούχων του Τομέα Μεταφορών του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.	50
3.3.3	Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.	52
4	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.....	62
4.1	Αποτίμηση κινδύνου των Ενταγμένων έργων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.....	62
4.1.1	Μεθοδολογία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Ενταγμένων έργων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.	62
4.1.2	Παράγοντες κινδύνου διασύνδεσης του συστήματος.....	70
4.1.3	Εξαγόμενα Στοιχεία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Ενταγμένων Πράξεων Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.....	72
4.2	Αποτίμηση συνολικού κινδύνου των Προγραμματικών Πράξεων Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. ...	73
4.2.1	Μεθοδολογία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Προγραμματικών Πράξεων Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.	73

4.2.2	<i>Εξαγόμενα Στοιχεία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Προγραμματικών Πράξεων Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.</i>	75
5	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 76	
5.1	Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Ενταγμένων Πράξεων.....	76
5.2	Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Προγραμματικών Πράξεων.....	89
6	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ερωτηματολόγια & πίνακες υπολογισμού επικινδυνότητας Δικαιούχων	103
7	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες τελικής κατάταξης Ενταγμένων και Προγραμματικών έργων & Πίνακες Υπολογισμού Παραγόντων	121
7.1	Πίνακας Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας Ενταγμένων έργων.....	121
7.2	Πίνακας Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας Προγραμματικών έργων	139
7.3	Πίνακας Βαθμολογίας Παραγόντων κινδύνου για τα Ενταγμένα έργα	145
7.4	Πίνακας Βαθμολογίας Παραγόντων κινδύνου για τα Προγραμματικά έργα	160

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Κίνδυνος και Διαχείριση Κινδύνου

Ο κίνδυνος είναι παρών σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Κάθε προσπάθεια για την επίτευξη οφελών, κερδών ή θετικών αποτελεσμάτων είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ανάληψη κινδύνων. Καμία απολύτως δραστηριότητα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να έχει απόλυτα εξασφαλισμένη την επιτυχία, όσο καλά κι αν είναι οργανωμένη. Εξωτερικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί ή άλλοι παράγοντες, φυσικά φαινόμενα, απειρία, λάθη, παραλείψεις, κακή οργάνωση, υπερεκτίμηση δυνατοτήτων, υποτίμηση / υπερτίμηση στόχων ή αντιπάλων συνιστούν μια μακροσκελέστατη λίστα κινδύνων, που μπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία ακόμα και τα πιο φιλόδοξα σχέδια. Ο ασφαλέστερος τρόπος άλλωστε για την αποφυγή κάθε κινδύνου είναι η αντίστοιχη αποφυγή κάθε δραστηριότητας.

Με δεδομένη την σπουδαιότητα του κινδύνου, αλλά και τις επιπτώσεις του στην επίτευξη των στόχων και του σχεδιασμού, η διαχείριση του κινδύνου καθίσταται επίσης μια δραστηριότητα έμφυτη σχεδόν στην ανθρώπινη φύση. Στην πλειοψηφία βέβαια των περιπτώσεων αποτελεί μία αδόμητη δραστηριότητα, βασισμένη στην κοινή λογική, την εμπειρία και το ένστικτο. Γι' αυτό και ίσως αναφέρεται συχνά ότι η διαχείριση κινδύνου είναι περισσότερο τέχνη και λιγότερο επιστήμη.

Ως δομημένη και αυτόνομη δραστηριότητα, η διαχείριση κινδύνου ξεκίνησε να καθιερώνεται τις δεκαετίες του 1970 και 1980 μέσω της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Έκτοτε, η διαχείριση κινδύνου έχει αποκτήσει ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και έχει συστηματοποιηθεί για εφαρμογή σε ένα μεγάλο και ετερόκλητο πλήθος δραστηριοτήτων, από την διαχείριση χρηματο-οικονομικών κινδύνων, έως την διαχείριση κινδύνων σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων και εγκαταστάσεων, ή την διαχείριση ιατρικών – υγειονομικών κινδύνων.

Έχει καταστεί σχεδόν αυτονόητο πλέον ότι οι οργανισμοί, που διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους για την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, μπορούν όχι μόνο να αποφύγουν «απρόβλεπτες» δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα να απελευθερώσουν πόρους προς άλλες κατευθύνσεις και να επωφεληθούν ευκαιριών, οι οποίες διαφορετικά ενδεχομένως να απορρίπτονταν ως απλά πολύ «επικίνδυνες». Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η οργανωμένη προσπάθεια ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων έχει να προσφέρει σημαντική βοήθεια στους οργανισμούς, όχι μόνο προς την κατεύθυνση ελέγχου επικίνδυνων καταστάσεων, που σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούνταν απρόβλεπτες, αλλά ταυτόχρονα και προς την θεώρηση

νέων πρακτικών ή προσπαθειών που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες. Υπό αυτή την οπτική γωνία είναι σαφές ότι ο κίνδυνος εμπεριέχει τόσο την έννοια της απειλής, όσο και αυτήν της ευκαιρίας.

Στην διαχείριση έργων και προγραμμάτων, η διαχείριση κινδύνων καλείται να παίξει έναν εξίσου θεμελιώδη ρόλο, καθώς αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση βασική προϋπόθεση για την επιτυχία, ήτοι την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών. Εξάλλου είναι σαφές ότι όλα τα έργα αντιμετωπίζουν κινδύνους, με αποτέλεσμα η ανάλυση και η διαχείριση κινδύνου να έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης έργων. Δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο άλλωστε η αποτυχία έργων ή προγραμμάτων, απλά και μόνο επειδή εμφανίστηκε ένας κίνδυνος που είτε δεν είχε προβλεφθεί είτε προβλέφθηκε, αλλά διαχειρίστηκε ανεπαρκώς. Έτσι η επιτυχία διαχείρισης ενός έργου είναι άμεσα συνυφασμένη με την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών κινδύνων.

Εκτός όμως από την διαχείριση των απειλών, η διαχείριση κινδύνου καλείται να διαδραματίσει έναν ακόμη σημαντικότερο ρόλο. Εξάλλου, η βασική σκοπιμότητα της διαχείρισης κινδύνου έργων είναι να συνδράμει σημαντικά στην βελτίωση της απόδοσης των έργων, μέσω της συστηματικής αναγνώρισης, ανάλυσης και διαχείρισης όλων των σχετιζόμενων κινδύνων. Ο στόχος όμως της βελτίωσης της απόδοσης των έργων θέτει έναν πιο διευρυμένο ρόλο για την διαχείριση κινδύνου, η οποία δεν θα πρέπει να αρκείται ως δραστηριότητα στην διαχείριση των απειλών, αλλά και στην αποτελεσματική εκμετάλλευση όλων των ευκαιριών. Με αυτό τον ευρύ ορισμό, η διαχείριση κινδύνου έργων θα πρέπει να θεωρείται μια πολύ σημαντική προέκταση της συμβατικής διαχείρισης έργων, η οποία μπορεί δυνητικά να επηρεάσει / διαμορφώσει ακόμα και τον βασικό σχεδιασμό του έργου.

Εξάλλου, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με κάποιο έργο δεν μπορούν να διαχωριστούν απόλυτα από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την επιλογή του έργου, τον σχεδιασμό του έργου, την διαχείριση και τον έλεγχο του έργου, αλλά αντίθετα είναι ενσωματωμένοι στις παραπάνω διαδικασίες. Η αντίληψη της διαχείρισης κινδύνου σαν μια ξεχωριστή, επιπρόσθετη διαδικασία είναι λάθος προσέγγιση, μιας και υπαινίσσεται ότι οι κίνδυνοι ενυπάρχουν απλά στα έργα και επομένως μπορούν να διαχειριστούν από την ομάδα έργου. Αντίθετα, πολλοί από τους κινδύνους που εμφανίζονται τελικά στα έργα οφείλονται / είναι άμεσα συσχετισμένοι με τις επιλογές της ομάδας έργου και γενικότερα της διοίκησης. Ως αποτέλεσμα, η διαχείριση κινδύνου δεν είναι απλά μια ποσοτικοποιημένη διαδικασία, όπως συχνά εμφανίζεται, αλλά αποτελεί μια πρόκληση ηγεσίας και διοίκησης, που πολλές φορές απαιτεί ποιοτικές και διαισθητικές προσεγγίσεις σε υψηλό επίπεδο. Η πεμπτουσία άλλωστε της διαχείρισης κινδύνου είναι

ότι η υπερνίκηση των κινδύνων και η εκμετάλλευση των ευκαιριών είναι αυτή που τελικά οδηγεί στην επιχειρησιακή επιτυχία.

1.2 Ορισμοί – Διευκρινήσεις

Κίνδυνος: Σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου PMI, κίνδυνος είναι ένα αβέβαιο γεγονός ή συνθήκη, η οποία αν συμβεί θα έχει θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στην επίτευξη των στόχων ενός έργου / προγράμματος. Με βάση τον παραπάνω ορισμό ο όρος «κίνδυνος» δεν περιλαμβάνει μόνο την έννοια της απειλής, αλλά και την έννοια της ευκαιρίας, καθώς και την γενικότερη έννοια της αβεβαιότητας, η οποία δεν μπορεί ενδεχομένως να αξιολογηθεί από την αρχή ως ευκαιρία ή απειλή.

Παράγοντες Κινδύνου: Ως «παράγοντες κινδύνου» ή διαφορετικά «οδηγοί κινδύνου» (Risk Factors) ορίζονται οι παράγοντες που είναι πιθανόν να προκαλέσουν την εμφάνιση κινδύνων, (π.χ. πολυπλοκότητα, ταχύτητα, καινοτομία, απαιτήσεις τεχνολογίας, απαιτήσεις προσπάθειας, κτλ.).

Επίπτωση ή Αντίκτυπος (Impact): Η επίπτωση ενός κινδύνου είναι οι συνέπειες του κινδύνου ή το αποτέλεσμα που έχει. Αυτή μπορεί να είναι άμεση ή μακροπρόθεσμη. Η μελέτη και εξέταση της επίπτωσης, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα στενά όρια ενός έργου. Μερικές ενδιάμεσες επιπτώσεις μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλοιώσεις των στόχων του προγράμματος μακροπρόθεσμα, ενώ άλλες μπορεί να επηρεάσουν μη κρίσιμα σημεία και στοιχεία του προγράμματος. Επιπλέον, ένας κίνδυνος μπορεί να έχει πολλαπλές επιπτώσεις και πολλοί κίνδυνοι να οδηγούν στην ίδια επίπτωση.

Αποτίμηση κινδύνου: Η αποτίμηση κινδύνου ή στα Αγγλικά Risk Assessment για προγράμματα ή έργα είναι μια διεργασία που σκοπό έχει να ταυτοποιήσει τις απειλές και να αποτιμήσει τον κίνδυνο εξετάζοντας την πιθανότητα υλοποίησης των απειλών καθώς και την επίπτωση που θα έχει η υλοποίηση της απειλής σε ένα πρόγραμμα έργων ή σε ένα έργο.

Διαχείριση Κινδύνου: Η διαχείριση κινδύνου (risk management) είναι κάτι διαφορετικό και πάντα έπεται της αποτίμησης κινδύνου. Η διαχείριση του κινδύνου μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησής του, καθώς σκοπός της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου, είναι να παρακολουθεί και να ενεργεί σε ταυτοποιημένους κινδύνους και όχι να τους ανιχνεύει και να τους ταυτοποιεί.

1.3 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

1.4 Αντικείμενο – Στόχος της παρούσας εκτίμησης κινδύνων

Στόχος της εκτίμησης κινδύνων που εκπονείται στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι ο Σύμβουλος να αναπτύξει και να εφαρμόσει κατάλληλη μεθοδολογία για την εκτίμηση των κινδύνων που επηρεάζουν την υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Στη δεδομένη χρονική στιγμή και βάσει της πορείας υλοποίησης των ενταγμένων έργων και της απορρόφησης του Προγράμματος έως τον Ιούλιο του 2020, κρίνεται αναγκαία η εκτίμηση της επικινδυνότητας ως προς την υλοποίηση των έργων:

(α) των δικαιούχων φορέων των έργων του προγράμματος

(β) των ενταγμένων έργων, σε επίπεδο βασικού υποέργου, (εκτίμηση μη ολοκλήρωσης υποέργων που οδηγεί σε μη ομαλή ολοκλήρωση των έργων),

(γ) των προγραμματικών έργων, σε επίπεδο κατηγορίας έργων,

προκειμένου στη συνέχεια να διαμορφωθούν προτάσεις (σενάρια) πλήρους αξιοποίησης των πόρων του Προγράμματος (αποφυγή απώλειας) για την επίτευξη των στόχων του.

Ως προγραμματικά ορίζονται όσα έργα δεν είναι ενταγμένα αλλά περιγράφονται στα Σχέδια Δράσης του Προγράμματος, όσα έχουν υποβληθεί και βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης καθώς και έργα που αποτελούν «υποχρέωση» του ΕΠ (π.χ.τα συμφωνημένα έργα λυμάτων, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων).

Η αξιολόγηση προόδου και επικινδυνότητας των έργων (σε επίπεδο βασικού υποέργου) πραγματοποιείται στη βάση επίσημων στοιχείων υλοποίησης από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ (με αναφορά τεκμηρίωσης όπου απαιτείται), αλλά και άλλων επίσημων πηγών ή στοιχείων που έχει στην διάθεσή της η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Τα στοιχεία και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, είναι:

- στοιχεία του ΟΠΣ,
- το αρχείο των έργων της ΕΥΔ (κατάλογος ενταγμένων και προγραμματιζόμενων έργων),
- υλικό που συγκεντρώθηκε από συνεντεύξεις και ομάδες εργασίας με τα στελέχη της ΕΥΔ για την παροχή πληροφορίας και διευκρινήσεων,

- συλλογή στοιχείων και πληροφοριών με τους δικαιούχους φορείς των έργων του προγράμματος, όπου αυτό κατέστη δυνατό.

Η αποτίμηση των κινδύνων θα γίνει βάσει κοινών παραγόντων κινδύνου και πραγματοποιείται τόσο για τα έργα του Ε.Π. όσο και για τους Δικαιούχους των έργων.

2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

2.1 Αρχικοποίηση – Πλαίσιο Εφαρμογής

Πρώτο στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου αποτελεί η αρχικοποίηση της διαδικασίας και η αποσαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής (defining the context). Σκοπό της αρχικοποίησης της διαδικασίας αποτελεί η πλήρης κατανόηση του προβλήματος, με την κατάλληλη αποτύπωση όλων των δεδομένων και των υπό εξέταση παραμέτρων.

Στα πλαίσια της αρχικοποίησης, πρώτο βήμα αποτελεί η πλήρης αποσαφήνιση του σκοπού και των στόχων της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, έτσι όπως θα λάβει χώρα για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης. Η αποσαφήνιση των σκοπών / στόχων της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου είναι σαφές ότι αποτελεί αναμφισβήτητο το στάδιο εκείνο στο οποίο θα δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας.

Δεύτερο βήμα της αρχικοποίησης της διαδικασίας αποτελεί η πλήρης αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και του πλαισίου εφαρμογής της υπό ανάπτυξης μεθοδολογίας.

2.2 Αναγνώριση Κινδύνων

Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα με:

- Τις επιπτώσεις τους σε:
 - Κινδύνους αντικειμένου (scope risks), οι οποίοι σχετίζονται με αλλαγές στο σκοπό και το αντικείμενο του υπό εξέταση έργου / προγράμματος.
 - Κινδύνους ποιότητας (quality risks), οι οποίοι σχετίζονται με αδυναμία εκτέλεσης εργασιών στο απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης.
 - Κινδύνους προγράμματος (schedule risks), οι οποίοι σχετίζονται με αδυναμία εκτέλεσης εργασιών μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια.
 - Κινδύνους κόστους (cost risks), οι οποίοι σχετίζονται με αδυναμία εκτέλεσης εργασιών εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.
- Τη φύση τους σε:
 - Διακριτούς, χρονικά ανεξάρτητους, σε περίπτωση που μπορεί να συμβούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

- Χρονικά εξαρτημένους, στην περίπτωση που η πιθανότητα εμφάνισης τους ή η σοβαρότητα των συνεπειών τους εξαρτάται από την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

➤ Από πού προέρχονται:

Εσωτερικούς ή εξωτερικούς (external vs. internal). Οι εσωτερικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που μπορούν να ελεγχθούν από τη διοίκηση του οργανισμού, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι τη δυνατότητα να το επιτύχει, ενώ οι εξωτερικοί κίνδυνοι είναι αυτοί επί των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί κανένας έλεγχος. Η διάκριση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει στον εκτιμητή να κατανοήσει τη φύση και τον μηχανισμό δημιουργίας τους. Οι εσωτερικοί / εξωτερικοί κίνδυνοι μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω σε:

- Εξωτερικούς, απρόβλεπτους (π.χ. η πανδημία του COVID-19).
- Εξωτερικούς, προβλέψιμους αλλά αβέβαιους (π.χ. πολιτικούς).
- Εσωτερικούς, μη τεχνικούς (π.χ. κίνδυνοι που πηγάζουν από το ανθρώπινο δυναμικό).
- Εσωτερικούς τεχνικούς.
- Εσωτερικούς νομικούς (π.χ. κανονισμοί).

Ο προσδιορισμός των κινδύνων για μια σειρά από παρόμοια έργα / προγράμματα είναι μία επαναληπτική διαδικασία και για αυτόν τον λόγο η εμπειρία και τα ιστορικά αρχεία αποτελούν σημαντικές πηγές πληροφόρησης. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της διαδικασίας (Πίνακας 2.1) είναι η δημιουργία ενός καταλόγου κινδύνων με όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των παραμέτρων που τον χαρακτηρίζουν και των επιπτώσεων που θα επέφερε η εμφάνισή του.

Αναγνώριση των Κινδύνων	
Προσδιορισμός Κινδύνων	• Προβληματισμός για το τι μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές ή θετικές εξελίξεις (risk drivers) • Εξέταση των επακόλουθων κινδύνων / ευκαιριών • Ονομασία κάθε κινδύνου • Ταξινόμηση των κινδύνων χρησιμοποιώντας κατάλληλες κατηγοριοποιήσεις
Προσδιορισμός επιπτώσεων	• Εξέταση των επιπτώσεων • Εξέταση των αλληλεπιδράσεων • Ταξινόμηση των επιπτώσεων χρησιμοποιώντας τις σχετικές κατηγοριοποιήσεις
Τεκμηρίωση Κινδύνων	• Δημιουργία καταλόγου των κινδύνων (ανά κλάση) και των επιπτώσεων (ανά κατηγορία)

Πίνακας 2.1.: Αναγνώριση Κινδύνων

Τέλος, επειδή η αναγνώριση κινδύνων είναι το αρχικό και ίσως το πιο βασικό στάδιο της όλης διαδικασίας, ο κίνδυνος να μην αναγνωρισθούν όλοι οι κίνδυνοι μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, τόσο για την διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, όσο και για το ίδιο το υπό εξέταση έργο / πρόγραμμα. Οι κυριότεροι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε παραβλέψεις κατά την αναγνώριση των κινδύνων είναι:

- ✓ Η έλλειψη εμπειρίας, ή η ελλιπής γνώση του υπό εξέταση συστήματος.
- ✓ Η ανεπάρκεια της διαθέσιμης πληροφορίας.
- ✓ Ο μεγάλος βαθμός εξοικείωσης του εκτιμητή με το υπό εξέταση σύστημα, με αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενες και υποτιθέμενες γνωστές διαδικασίες να αναλύονται μη διεξοδικά, οδηγώντας πολλές φορές σε αγνόηση προφανών κινδύνων.

2.3 Ανάλυση Κινδύνων

Η διαδικασία της ανάλυσης κινδύνων έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της αντίληψής του αποφασίζοντας σχετικά με τους αναγνωρισμένους κινδύνους, την εκτίμηση της σπουδαιότητάς τους, την εμπεριστατωμένη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεών τους και τελικά την κατάταξή τους σε μία ιεραρχική λίστα για την διερεύνηση και την ιεράρχηση των δράσεων διαχείρισης κινδύνου.

Η ανάλυση κινδύνων περιλαμβάνει την εκτίμηση και αποτίμηση των κινδύνων και μπορεί να διενεργηθεί είτε με ποιοτικούς είτε με ποσοτικούς όρους. Ο κίνδυνος εκτιμάται με βάση δύο παραμέτρους, την πιθανότητα εμφάνισής του και τις συνέπειές του, εφόσον εμφανιστεί.

Σε κάθε περίπτωση, βασικό στάδιο της ανάλυσης κινδύνων είναι η επιλογή και υιοθέτηση της κατάλληλης κλίμακας μέτρησης των ανωτέρω μεγεθών. Η χρήση μιας συμφωνημένης κλίμακας για την περιγραφή και μέτρηση των κινδύνων, αν και είναι παρακινδυνευμένη εξαιτίας της μη απόλυτης φύσης της, είναι απαραίτητη για την κάλυψη της αδυναμίας της γλώσσας να παρέχει αναμφίβολους, μονοσήμαντους ορισμούς και έννοιες σχετικά με τους κινδύνους. Η χρήση μιας ενιαίας κλίμακας είναι επιπρόσθετα αναγκαία όχι μόνο για την κατάταξη των κινδύνων, αλλά και για να είναι δυνατή η σύγκριση εναλλακτικών λύσεων. Με αυτή την έννοια, σκοπός της χρήσης της δεν είναι η «θεωρητική ορθότητα» αλλά η δημιουργία ενός κοινού μεγέθους αναφοράς έτσι ώστε τα μέλη του οργανισμού να έχουν κοινή αίσθηση για τους κινδύνους.

2.4 Εκτίμηση Κινδύνων

Η εκτίμηση κινδύνων είναι η διαδικασία εκτίμησης της πιθανότητας (probability) εμφάνισης των επικίνδυνων γεγονότων και της δριμύτητας των επιδράσεών τους (impact). Αυτό οδηγεί σε μια εκτίμηση του βαθμού έκθεσης του έργου / προγράμματος στον κίνδυνο.

Εκτίμηση Κινδύνων	
Πιθανότητα Κινδύνου	Εκτίμηση της πιθανότητας κάθε κινδύνου να συμβεί (ποιοτικά ή ποσοτικά).
Επίπτωση Κινδύνου	Εκτίμηση του μεγέθους της κάθε επίπτωσης (ποιοτικά ή ποσοτικά).
Έκθεση στον Κίνδυνο	Εκτίμηση της συνολικής έκθεσης στον κίνδυνο (ποιοτικά ή ποσοτικά).
Τεκμηρίωση κινδύνων	- Ταξινόμηση των κινδύνων ανάλογα με το βαθμό έκθεσης. - Καταγραφή των πιθανοτήτων κινδύνου, σοβαρότητας επιπτώσεων και έκθεσης στον κίνδυνο.

Πίνακας 2.2: Εκτίμηση Κινδύνων


Η ποσοτική ανάλυση στον προσδιορισμό των παραμέτρων του κινδύνου (πιθανότητα – επίπτωση) απαιτεί ουσιαστικά στατιστική επεξεργασία ιστορικών δεδομένων από την διαχείριση των έργων / προγραμμάτων για ένα εύγλωττο βάθος χρόνου. Στην πράξη, η ποσοτική ανάλυση είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, καθώς τα ιστορικά δεδομένα συνήθως δεν είναι διαθέσιμα ή δεν βρίσκονται στην κατάλληλη μορφή για επεξεργασία, και ως εκ τούτου περιορίζεται σε λίγους τομείς. Αντίθετα, η ποιοτική ανάλυση είναι τις περισσότερες των περιπτώσεων η πιο κατάλληλη προς χρήση κατά την ανάλυση κινδύνων. Η ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιεί υποκειμενικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες εκφράζεται ουσιαστικά η σχετική μέτρηση της ανθρώπινης κρίσης, αίσθησης και εκτίμησης. Αν και η ποιοτική ανάλυση επηρεάζεται τελικά σε μεγάλο βαθμό από αυτή την υποκειμενικότητα, καθώς εξαρτάται ουσιαστικά από τις προτιμήσεις, προκαταλήψεις, αλλά και την εξειδίκευση των εμπειρογνομόνων που χρησιμοποιούνται, και επιπλέον έχει κατηγορηθεί για σωρεία ελαττωμάτων, κυρίως σχετικά με την χρήση ακατάλληλων κλιμάκων και παραπλανητικών αθροίσεων ποιοτικών μεγεθών, εντούτοις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και εφαρμόζεται ευρέως, καθώς είναι πιο εύκολη και ταχύτερη και παρέχει μία πάρα πολύ καλή βάση για την εκτίμηση των κινδύνων.

Η έκθεση σε κίνδυνο ορίζεται με βάση τον συνδυασμό της πιθανότητας ενός ενδεχομένου να συμβεί και των επιπτώσεων που θα έχει σε περίπτωση που συμβεί. Εάν οι πιθανότητες και οι επιπτώσεις του κινδύνου έχουν ποσοτικοποιηθεί, η έκθεση σε κίνδυνο, η οποία μετράται με την σοβαρότητα (severity) του εκάστοτε κινδύνου, μπορεί να υπολογιστεί ως το γινόμενο της πιθανότητας και των

επιπτώσεων. Από αυτόν τον συνδυασμό της πιθανότητας και των επιπτώσεων ενός κινδύνου προκύπτει η σοβαρότητα (severity) του εκάστοτε κινδύνου.

Στο παρόν παραδοτέο, για την διαδικασία της εκτίμησης κινδύνων, ο Σύμβουλος χρησιμοποιεί ως εργαλείο τις **Μήτρες Πιθανότητας / Επιπτώσεων (probability – impact grids)**.

Οι κίνδυνοι που αναγνωρίζονται ταξινομούνται γραφικά σε μήτρες, στις οποίες ο ένας άξονας αναπαριστά την πιθανότητα και ο άλλος την επίπτωση των κινδύνων. Οι μήτρες πιθανότητας / επιπτώσεων παρέχουν ένα απλό πλαίσιο για την γραφική απεικόνιση της σοβαρότητας κάθε κινδύνου και την καταγραφή της σχετικής σπουδαιότητάς του, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα:

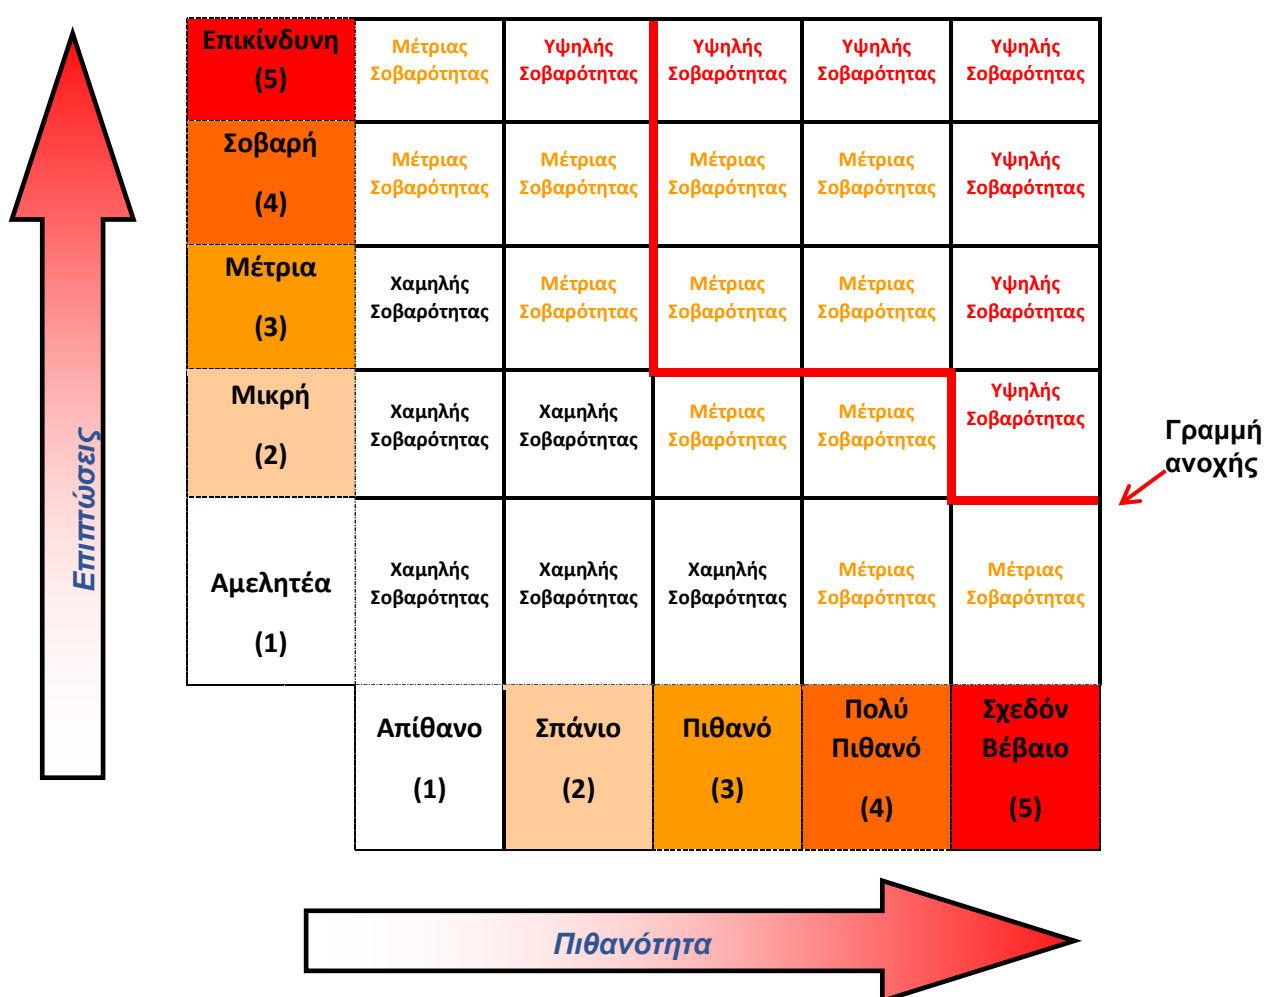

Σχήμα 2.1: Μήτρα Πιθανότητας/ Επιπτώσεων

Για την κατασκευή του παραπάνω πίνακα και προκειμένου να βαθμονομηθούν οι κλίμακες της πιθανότητας και των επιπτώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από γλωσσολογικές (ordinal scales) και αριθμητικές τιμές. Στην παρούσα ανάλυση, ο Σύμβουλος χρησιμοποιεί αριθμητικές τιμές,

έτσι ώστε να παρακαμφθούν τα δύο βασικά μειονεκτήματα της ποιοτικής – γλωσσικής ανάλυσης κινδύνων:

-  Η αδυναμία υπολογισμού του βαθμού επικινδυνότητας σε περιπτώσεις πολλαπλών αιτιών ή επιπτώσεων (ένας κίνδυνος μπορεί να έχει περισσότερες από μια αιτίες ή επιπτώσεις).
-  Η αδυναμία υπολογισμού του συνολικού βαθμού έκθεσης στους κινδύνους

2.5 Αποτίμηση Κινδύνων

Η αποτίμηση του κινδύνου είναι μία διαδικασία, η οποία έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση του βαθμού της αποδοχής της έκθεσης του έργου / προγράμματος σε κάθε κίνδυνο σε σχέση με τα κριτήρια κινδύνου που καθορίζονται για το έργο / πρόγραμμα. Διερευνά, επίσης σε πρώτο επίπεδο και τις αντιδράσεις / μέσα, με τα οποία μπορούν να μειωθούν τα απαράδεκτα επίπεδα έκθεσης σε κίνδυνο.

Η αποτίμηση του κινδύνου είναι ένα ζωτικής σημασίας προαπαιτούμενο βήμα για την διαχείριση κινδύνου. Χωρίς αυτή, η αποτελεσματική διαχείριση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι οι υπεύθυνοι δεν θα έχουν γνώση και άποψη για τους σημαντικότερους κινδύνους που ενδέχεται να οδηγήσουν το έργο / πρόγραμμα σε αστοχίες. Υπάρχει επομένως ο γενικότερος κίνδυνος να διαχειριστούν πρώτα τα προβλήματα με τα οποία αισθάνονται πιο οικείοι, ή με τα οποία έχουν προγενέστερη εμπειρία και να καθυστερήσουν ή να μην προσπαθήσουν να ελέγξουν άλλες σημαντικές δραστηριότητες. Όποια κι αν είναι η περίπτωση, η επιτυχής επίτευξη των στόχων του προγράμματος γίνεται πολύ λιγότερο πιθανή υπό αυτό το πρίσμα.

Αποδοχή και Αποτίμηση των Κινδύνων	
Αποδοχή	- Καθιέρωση κριτηρίων αποδοχής κινδύνων. - Εκτίμηση του βαθμού αποδοχής της έκθεσης σε κάθε κίνδυνο.
Εναλλακτικές	Διερεύνηση σε πρώτο επίπεδο των δυνατών εναλλακτικών αντιδράσεων σε κάθε κίνδυνο.
Τεκμηρίωση Κινδύνων	Καταγραφή για κάθε κίνδυνο του βαθμού αποδοχής του και των προτεινόμενων εναλλακτικών αντιδράσεων για την αντιμετώπισή του.

Πίνακας 2.3: Αποδοχή και Αποτίμηση Κινδύνων

Εφόσον στο παρόν παραδοτέο, η ανάλυση κινδύνου έχει εκτελεσθεί σε ποσοτική βάση, είναι σχετικά εύκολο να συγκριθούν τα αριθμητικά επίπεδα έκθεσης με τα αποδεκτά όρια που εκφράζονται στις ίδιες μονάδες.

Η ανοχή απέναντι σε ένα κίνδυνο μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την σοβαρότητα του, αλλά και τον χρόνο και την περιοχή, που ενδέχεται να προκύψει.

2.6 Διαχείριση / Αντιμετώπιση Κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνου είναι ο προγραμματισμός και η εφαρμογή ενεργειών για να μειωθεί η πιθανότητα ή / και οι επιπτώσεις των κινδύνων που έχουν προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης και ανάλυσης κινδύνου, αλλά και για να γίνει εφικτή και η εκμετάλλευση των ευκαιριών.

Στόχο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων αποτελεί η χρησιμοποίηση των συμπερασμάτων των προηγούμενων σταδίων της ανάλυσης κινδύνου για την παραγωγή ενός Βασικού Σχεδίου Δράσης. Εκτός του Βασικού Σχεδίου, παράγωγα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου αποτελούν και τα Εναλλακτικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (Ε.Σ.Ε.Α.). Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενέργειες αντιμετώπισης ενός σημαντικού κινδύνου, μετά την εκδήλωσή του. Οι ενέργειες αυτές, όπως ακριβώς και οι δράσεις του Βασικού Σχεδίου, θα πρέπει να περιγράφονται όσο πιο αναλυτικά είναι εφικτό, σε όρους κόστους, χρονοδιαγράμματος και πόρων. Η κύρια διαφοροποίηση των Ε.Σ.Ε.Α. από το Βασικό Σχέδιο είναι ότι περιέχουν όλες τις «κατασταλτικές» ενέργειες, μετά την εκδήλωση του κινδύνου, ενώ το Βασικό Σχέδιο ενσωματώνει όλες τις προληπτικές ενέργειες διαχείρισης κινδύνων.

Οι δυνατότητες που παρέχονται στην διαχείριση κινδύνων ταξινομούνται ουσιαστικά σε 4 μεγάλες κατηγορίες:

- ❖ Αποφυγή του Κινδύνου.
- ❖ Μεταφορά του Κινδύνου ή επιμερισμός του.
- ❖ Δράση, για τον έλεγχο / περιορισμό του Κινδύνου.
- ❖ Αποδοχή του Κινδύνου.

Αναλυτικά, οι τακτικές Διαχείρισης Κινδύνων παρουσιάζονται στη συνέχεια:

- **Αποφυγή Κινδύνου:** Πρόκειται για την χρησιμοποίηση εναλλακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες δεν περιέχουν καθόλου κίνδυνο. Αυτή η δυνατότητα, αν και είναι η πιο αποτελεσματική από τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, δεν είναι πάντα διαθέσιμη, καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πρακτικά αδύνατη η υιοθέτηση μιας στρατηγικής χωρίς καθόλου κίνδυνο. Τέλος δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι ο κίνδυνος

εμπλέκεται σε πάρα πολλά έργα του προγράμματος, καθώς η πορεία προς την υλοποίηση σημαντικών στόχων πολύ σπάνια μπορεί να γίνει χωρίς την εμπλοκή κάποιων κινδύνων.

- **Μεταφορά Κινδύνου:** Πρόκειται για την μεταφορά του κινδύνου σε κάποιο άλλο εμπλεκόμενο μέρος. Πρακτικά, η υλοποίηση αυτής της τακτικής γίνεται με την μεταφορά του κινδύνου μέσα σε μια σύμβαση και άρα με την ανάληψη του κινδύνου από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος. Όπως τονίζεται από τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις ο όρος «μεταφορά του κινδύνου» είναι αδόκιμος, καθώς ποτέ δεν μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη πλήρης μεταφορά και αποποίηση των ευθυνών. Αντίθετα, η σωστή ορολογία είναι επιμερισμός ή κατανομή του κινδύνου, η οποία τελικά μπορεί να επιτευχθεί με (i) ασφάλιση (insurance), όπου ένα τρίτο μέρος ασφαρίζει ένα κίνδυνο ή μέρος αυτού έναντι ποσού ασφάλισης, (ii) παροχή εγγυήσεων (bonding) από ένα ή περισσότερα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εμφάνισης των κινδύνων και (iii) συμπερίληψη των κινδύνων σε συμβόλαιο προκειμένου να διαμοιραστούν κατάλληλα στα εμπλεκόμενα μέρη.
- **Δράση για τον έλεγχο / περιορισμό του Κινδύνου:** Πρόκειται για την τακτική, στην οποία υπάγονται οι περισσότεροι κίνδυνοι. Σε αυτήν εντάσσονται όλες οι δράσεις που στοχεύουν στον περιορισμό είτε της πιθανότητας εμφάνισης ενός κινδύνου είτε των συνεπειών από την εμφάνιση ενός κινδύνου. Οι δράσεις περιορισμού των κινδύνων δεν είναι δυνατόν να εξειδικευθούν περαιτέρω σε αυτό το επίπεδο, καθώς εξαρτώνται από την φύση και το είδος του υπό εξέταση κινδύνου κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει βέβαια να εξετάζονται και από την σκοπιά ανάλυσης κόστους / οφέλους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι (i) το κόστος της εφαρμογής τους δεν θα ξεπερνά τα προσδοκώμενα οφέλη (ii) υπάρχει λογική πιθανότητα επιτυχίας τους και (iii) η χρήση πόρων για την εφαρμογή τους δεν θα προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα.
- **Αποδοχή Κινδύνου:** Πρόκειται για την αποδοχή του κινδύνου, χωρίς τον προγραμματισμό καμιάς απολύτως ενέργειας διαχείρισής του. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις, που αφορούν βεβαίως μη κρίσιμους για την επιτυχία του έργου / προγράμματος κινδύνους, στις οποίες είτε η οποιαδήποτε προγραμματιζόμενη αντίδραση θα έχει μεγαλύτερο κόστος από τις συνέπειες της ενδεχόμενης εμφάνισης του κινδύνου είτε ο κίνδυνος ελέγχεται εξ' ολοκλήρου από εξωτερικούς παράγοντες στους οποίους υπάρχει αδυναμία παρέμβασης.

Οι τακτικές διαχείρισης κινδύνου εφαρμόζονται σε όλες τις φάσεις του έργου. Όσο πιο νωρίς όμως ενταχθούν στην διαδικασία διαχείρισης του έργου / προγράμματος, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη, καθώς είναι φανερό ότι άλλες δυνατότητες παρέχονται για αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων όταν το έργο είναι στην φάση της σύλληψης και του σχεδιασμού του και άλλες δυνατότητες

παρέχονται όταν πια βρίσκεται στην διαδικασία εφαρμογής του. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η τακτική της «Αποφυγής του Κινδύνου» είναι ουσιαστικά ανέφικτη σε προχωρημένα στάδια της εφαρμογής του έργου / προγράμματος, στα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν αλλαγές στον σχεδιασμό, ώστε να αποφευχθεί κάποιος συγκεκριμένος κίνδυνος.

Ο Σύμβουλος, στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης δεν θα προτείνει κάποιο πλάνο αντιμετώπισης των επιμέρους κινδύνων. Η αναφορά στην διαδικασία αντιμετώπισης κινδύνου, παρουσιάζεται για λόγους πληρότητας, καθώς αποτελεί το τελευταίο στάδιο της συνολικής διαδικασίας «διαχείριση κινδύνου».

Ωστόσο η τελική αποτίμηση κινδύνων ανά δικαιούχο και ανά έργο θα επιτρέψει στα στελέχη της ΕΥΔ να εντοπίσουν τα σημεία/περιοχές που πρέπει να εστιάσουν περισσότερο προκειμένου να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2.7 Αποτίμηση Κινδύνων ανά Φάση του Κύκλου Ζωής Έργων

Στην παρούσα προσέγγιση, η αποτίμηση των κινδύνων πραγματοποιείται με βάση την φάση του κύκλου ζωής του κάθε έργου του προγράμματος.

Ο κύκλος ζωής των έργων (project life cycle – PLC) είναι ουσιαστικά ένας αρκετά εύκολος και διαδοσμένος τρόπος για την αντίληψη της γενικής δομής των έργων, με το πέρασμα του χρόνου. Ο κύκλος ζωής των έργων μπορεί να περιγραφεί με διαφορετικούς όρους, ανάλογα με την σκοπιά εξέτασης, η οποία μπορεί να είναι για παράδειγμα οι απαιτούμενοι πόροι, το επίπεδο συγκρούσεων και αλληλεπιδράσεων ή ο ρυθμός απορρόφησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού κτλ.

Η κλασική περιγραφή ωστόσο γίνεται συνήθως με τέσσερις φάσεις: σύλληψη (conceptualization), σχεδιασμός (planning), εκτέλεση (execution), τερματισμός (termination).

Το σχήμα που ακολουθεί προσφέρει μια γραφική αναπαράσταση της σχέσης των φάσεων του κύκλου ζωής των έργων, της συσσώρευσης εξόδων, αλλά και της εμφάνισης κινδύνων (για λόγους απλότητας, στο σχήμα αναφέρονται οι τέσσερις φάσεις του κύκλου ζωής, σύμφωνα με την κλασική προσέγγιση).



Σχήμα 2.2: Επίπτωση κινδύνων στον κύκλο ζωής ενός έργου

2.8 Στάδιο Αναγνώρισης Κινδύνων Μεθοδολογικής Προσέγγισης για την αποτίμηση και διαχείριση κινδύνων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνονται τα στάδια της μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε από τον Σύμβουλο στην παρούσα περίπτωση, με βάση το βασικό περίγραμμα της μεθοδολογίας που παρουσιάστηκε παραπάνω. Ο βασικός λόγος που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο η μεθοδολογική προσέγγιση της αναγνώρισης των κινδύνων και των παραγόντων κίνδυνου των έργων του προγράμματος και όχι στα επιμέρους υποσυστήματα που περιγράφονται στην συνέχεια, είναι γιατί η μεθοδολογία είναι κοινή για τα επιμέρους υποσυστήματα και εξειδικεύεται κατά περίπτωση στο στάδιο της αποτίμησης των κινδύνων. Ο στόχος τα παρούσας προσέγγισης είναι να δημιουργηθεί κατά βάση μία κοινή μήτρα πιθανών κινδύνων για όλο το πρόγραμμα και στην πορεία στο κάθε υποσύστημα να εξειδικευτούν οι επιμέρους κίνδυνοι μέσω των παραγόντων επικινδυνότητας.

Η διαδικασία της αναγνώρισης κινδύνων, αποτελεί ουσιαστικά την δημιουργία ενός καταλόγου με όλους τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τόσο το κάθε έργο που είναι ενταγμένο ή πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα όσο και το ίδιο το πρόγραμμα. Στην παρούσα μεθοδολογία, η αναγνώριση των κινδύνων γίνεται μέσω της δημιουργίας της διευρυμένης γενικής δομής αναλυτικής παράθεσης κινδύνων (RBS) για το πρόγραμμα, αφού προηγουμένως προσεγγιστούν οι κίνδυνοι σε επίπεδο κατηγορίας υποέργου μέσω Δομών Αναλυτικής Παράθεσης

Εργασιών (WBS) (Large Scale Program Risk Analysis Using a Risk Breakdown Structure, O. Zacharias et Al., European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ISSN 1450-2275 Issue 12 (2008)).

Η αναγνώριση κινδύνων είναι μια δομημένη διαδικασία, που βασικός της στόχος είναι να διασφαλίσει ότι εξετάζονται όλοι οι εκείνοι οι παράγοντες και τα γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά (ή ακόμα και θετικά) την υλοποίηση των έργων και του προγράμματος.

Με βάση τα δεδομένα και τις απαιτήσεις του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας αναγνώρισης των κινδύνων, συντάχθηκαν από τον Σύμβουλο δομές αναλυτικής παράθεσης εργασιών (Work Breakdown Structures - WBS) για κάθε τύπο υποέργου που μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, ήτοι για:

- υποέργο κατασκευής ή ανάπτυξης,
- υποέργο υπηρεσιών,
- υποέργο προμηθειών και
- υποέργο μελετητικό.

Η Δομή Αναλυτικής Παράθεσης Εργασιών (Work Breakdown Structure – WBS) είναι μια θεμελιώδης τεχνική διαχείρισης έργων, η οποία περιγράφει ιεραρχικά τις επιμέρους εργασίες που απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθεί ο στόχος ενός έργου. Είναι επομένως μια διαδικασία κατά την οποία το συνολικό έργο υποδιαιρείται σε τμήματα, σε μικρότερα έργα που αποτελούν το συνολικό. Κάθε νέο επίπεδο της WBS καθορίζει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το συνολικό έργο, ενώ οι εργασίες που έχουν προκύψει στο τελευταίο επίπεδο της WBS είναι δυνατό να προγραμματιστούν, να κοστολογηθούν, να παρακολουθηθούν και να ελεγχθούν από τον αναλυτή. Είναι σαφές ότι όσο πιο πολύπλοκο είναι το έργο, τόσο πιο πολλά θα είναι και τα επίπεδα της αντίστοιχης WBS.

Η περίπτωση Πράξης του προγράμματος που συνδυάζει κάποιες από τις τέσσερις παραπάνω γενικές κατηγορίες υποέργων, που είναι και η συνηθέστερη άλλωστε, προκύπτει από τον κατάλληλο συνδυασμό των WBS της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης. Οι αναπτυχθείσες WBS καταβλήθηκε προσπάθεια να είναι αρκετά γενικές, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν εφαρμογή, με την κατάλληλη βέβαια εξειδίκευση, σε κάθε έργο.

Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης αναπτύχθηκε μία γενική WBS για κάθε κατηγορία υποέργου, καθώς και για το στάδιο του αρχικού σχεδιασμού, ως ακολούθως:

WBS ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ		
ΕΠΙΠΕΔΟ 1	ΕΠΙΠΕΔΟ 2	ΕΠΙΠΕΔΟ 3
Αρχικός σχεδιασμός και προγραμματισμός - προετοιμασία έργου	Έλεγχος σκοπιμότητας	Έλεγχος συμβατότητας με γενικούς και ειδικούς στόχους προγράμματος
		Αξιολόγηση βαθμού κάλυψης αναγκών
		Αξιολόγηση χωροθέτησης
		Αξιολόγηση λειτουργικότητας
		Αξιολόγηση άμεσων και έμμεσων ωφελειών
		Αξιολόγηση επιπτώσεων (περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών, κτλ.)
		Αξιολόγηση εμπλεκόμενων φορέων
		Αξιολόγηση συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλα έργα
		Αξιολόγηση ωριμότητας
	Καθορισμός πλαισίου υλοποίησης	Καθορισμός φορέα υλοποίησης – επίβλεψης & αποσαφήνιση ρόλων
		Αποσαφήνιση θεσμικού και νομικού πλαισίου υλοποίησης
		Αποσαφήνιση πλαισίου χρηματοδότησης
	Προσδιορισμός τεχνικού αντικειμένου	Καθορισμός παραδοτέων
		Επιμερισμός του έργου σε συμβάσεις – υποέργα
		Καθορισμός δεικτών εκροών και αποτελέσματος
		Διαστασιολόγηση
		Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων
	Οικονομική ανάλυση	Εκτίμηση προϋπολογισμού
		Εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης (δάνεια, ίδια κεφάλαια, επιδότηση, κτλ)
		Εκτίμηση χρηματο-ροών
		Εκτίμηση πιθανών εσόδων
		Εκτίμηση κόστους συντήρησης – λειτουργίας
	Χρονικός προγραμματισμός	Προσδιορισμός χρόνου τμηματικών παραδόσεων
		Εκτίμηση χρόνου ολοκλήρωσης έργου

Πίνακας 2.4: WBS αρχικού σχεδιασμού

WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ		
ΕΠΙΠΕΔΟ 1	ΕΠΙΠΕΔΟ 2	ΕΠΙΠΕΔΟ 3
Μελ έτες		Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ		
ΕΠΙΠΕΔΟ 1	ΕΠΙΠΕΔΟ 2	ΕΠΙΠΕΔΟ 3
	Προ-συμβατικές ενέργειες	Δημόσια διαβούλευση
		Προκήρυξη διαγωνισμού
	Κατάρτιση σύμβασης	Κατακύρωση διαγωνισμού
		Έλεγχος νομιμότητας
		Οριστικοποίηση χρονοδιαγράμματος
	Υλοποίηση μελέτης	Αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού
		Αξιοποίηση εξοπλισμού
		Εκπόνηση αναγνωριστικών – προκαταρκτικών μελετών
		Εκπόνηση κύριων – υποστηρικτικών μελετών
		Αδειοδοτήσεις
		Ποιοτικός έλεγχος
		Οικονομικός προγραμματισμός
		Χρονικός προγραμματισμός
	Ολοκλήρωση σύμβασης	Ποιοτικός έλεγχος
		Έγκριση και οριστική παραλαβή

Πίνακας 2.5: WBS υποέργων μελετών

WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
ΕΠΙΠΕΔΟ 1	ΕΠΙΠΕΔΟ 2	ΕΠΙΠΕΔΟ 3
Υπηρεσίες	Προ-συμβατικές ενέργειες	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
		Δημόσια διαβούλευση
		Προκήρυξη διαγωνισμού
	Κατάρτιση σύμβασης	Κατακύρωση διαγωνισμού
		Έλεγχος νομιμότητας

WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
ΕΠΙΠΕΔΟ 1	ΕΠΙΠΕΔΟ 2	ΕΠΙΠΕΔΟ 3
	Υλοποίηση υπηρεσίας	Οριστικοποίηση χρονοδιαγράμματος
		Αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού
		Συνεργασία με εμπλεκόμενα μέρη
		Υλοποίηση πακέτων εργασιών
		Logistics & υποστήριξη
		Ποιοτικός έλεγχος
		Οικονομικός προγραμματισμός
		Χρονικός προγραμματισμός
	Ολοκλήρωση σύμβασης	Ποιοτικός έλεγχος
		Έγκριση και οριστική παραλαβή

Πίνακας 2.6: WBS υποέργων υπηρεσιών

WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ		
ΕΠΙΠΕΔΟ 1	ΕΠΙΠΕΔΟ 2	ΕΠΙΠΕΔΟ 3
Προμήθειες	Προ-συμβατικές ενέργειες	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
		Δημόσια διαβούλευση
		Προκήρυξη διαγωνισμού
	Κατάρτιση σύμβασης	Κατακύρωση διαγωνισμού
		Έλεγχος νομιμότητας
		Οριστικοποίηση χρονοδιαγράμματος
	Υλοποίηση προμήθειας	Συνεργασία με εμπλεκόμενα μέρη
		Οικονομικός προγραμματισμός
		Χρονικός προγραμματισμός
	Παραλαβή προμήθειας	Ποιοτικός έλεγχος – δοκιμαστική λειτουργία
		Εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού
		Έγκριση και οριστική παραλαβή

Πίνακας 2.7: WBS υποέργων προμηθειών

WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ		
ΕΠΙΠΕΔΟ 1	ΕΠΙΠΕΔΟ 2	ΕΠΙΠΕΔΟ 3
Κατασκευή – Υλοποίηση	Προ-συμβατικές ενέργειες	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
		Δημόσια διαβούλευση
		Προκήρυξη διαγωνισμού
	Κατάρτιση σύμβασης	Κατακύρωση διαγωνισμού
		Έλεγχος νομιμότητας
		Οριστικοποίηση χρονοδιαγράμματος
	Κατασκευή – υλοποίηση	Λεπτομερής σχεδιασμός
		Καθορισμός υπεργολαβιών
		Στήσιμο εργοταξίου
		Αξιοποίηση εργατικού δυναμικού
		Logistics & υποστήριξη
		Οικονομικός προγραμματισμός
		Χρονικός προγραμματισμός
	Παραλαβή έργου	Ποιοτικός έλεγχος
		Δοκιμαστική λειτουργία
		Οριστική παραλαβή

Πίνακας 2.8: WBS υποέργων κατασκευών

Με βάση τις αναπτυχθείσες WBS καταρτίστηκε μία γενική δομή αναλυτικής παράθεσης κινδύνων (RBS). Για την ανάπτυξη της RBS, χρησιμοποιήθηκε ένα ευρύτερο πλαίσιο θέτοντας στο επίπεδο 0 τον συνολικό κίνδυνο του προγράμματος, αντί για τον κίνδυνο του έργου (Zacharias et al., 2007b). Με αυτή την παραδοχή, η αναπτυχθείσα RBS έχει ως ακολούθως:

Δομή Αναλυτικής Παράθεσης Κινδύνων (RBS) για Πρόγραμμα Μεγάλης Κλίμακας						
ΕΠΙΠΕΔΟ 0	ΕΠΙΠΕΔΟ 1		ΕΠΙΠΕΔΟ 2		ΕΠΙΠΕΔΟ 3	
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Α	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	I	ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	1	ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
					2	ΕΜΠΕΙΡΙΑ
					3	ΓΝΩΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
					4	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ
					5	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
					6	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
					7	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
					8	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΟΡΟΙ
					9	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
			II	ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	1	ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
					2	ΕΜΠΕΙΡΙΑ
					3	ΓΝΩΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
					4	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
					5	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
					6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
					7	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΟΡΟΙ
					8	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
	Β	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	I	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	1	ΣΤΟΧΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
					2	ΠΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
					3	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ: ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΧΡΗΣΤΕΣ – ΩΦΕΛΩΜΕΝΟΙ – ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ
					4	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
					5	ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ
					6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
					7	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
					8	ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
					9	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
					10	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
					11	ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
					12	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
					13	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΠΟΕΡΓΑ
					14	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ
			II	ΣΥΜΒΑΣΗ	1	ΣΑΦΗΝΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
					2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
					3	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
					4	ΡΗΤΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δομή Αναλυτικής Παράθεσης Κινδύνων (RBS) για Πρόγραμμα Μεγάλης Κλίμακας						
ΕΠΙΠΕΔΟ 0	ΕΠΙΠΕΔΟ 1		ΕΠΙΠΕΔΟ 2		ΕΠΙΠΕΔΟ 3	
			III	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ	1	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
					2	ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
					3	LOGISTICS & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
					4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
					5	ΑΣΦΑΛΙΣΗ
					6	ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ
					7	ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
			IV	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
					2	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ
	Γ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ	I	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ	1	ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
					2	ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ
			II	ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ	1	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
					2	ΠΛΑΙΣΙΟ & ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
					3	ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
					4	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
			III	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ	1	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
					2	ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
			IV	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ	1	ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
					2	ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
	Δ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	I	ΣΤΟΧΟΙ	1	ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ
					2	ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
					3	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
			II	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
					2	ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΩΝ
			III	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (STAKEHOLDERS)	1	ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
					2	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας 2.9: Δομή Αναλυτικής Παράθεσης Κινδύνων (RBS) για Πρόγραμμα Μεγάλης Κλίμακας

Όπως καθίσταται σαφές από τον παραπάνω πίνακα, οι αναγνωρισθέντες κίνδυνοι δεν ανταποκρίνονται σε κάποιο συγκεκριμένο είδος έργου ή προγράμματος, αλλά αντίθετα θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή, με την κατάλληλη βέβαια εξειδίκευση, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας. Ο παραπάνω πίνακας δημιουργήθηκε για το υψηλότερο επίπεδο διαχείρισης του προγράμματος, την αρχή διαχείρισης.

Ο παραπάνω πίνακας προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο πρόβλημα αναγνώρισης κινδύνων προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας, καθώς περιέχει όλους τους αναγνωρισθέντες κινδύνους

όλων των επιπέδων του προγράμματος. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω RBS ενσωματώνονται τόσο οι κίνδυνοι της γενικής διαχείρισης του προγράμματος (program governance), όσο και οι κίνδυνοι διαχείρισης των οφελών του προγράμματος (benefits management), αλλά και οι κίνδυνοι διαχείρισης των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders management). Στόχο άλλωστε αποτέλεσε να αποκτηθεί όσο το δυνατόν πληρέστερη και συνοπτική εικόνα για όλους τους κινδύνους.

Η παραπάνω δομή εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο, σε ένα ακόμα επίπεδο ανάλυσης (επίπεδο 5 της RBS), όπου καταγράφονται πλέον όλοι οι κίνδυνοι:

A. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
A.I	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
A.I.1	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
	• Τυποποιημένη γενική οργανωτική δομή, που δεν έχει εξειδικευθεί στις ανάγκες διαχείρισης του υπό εξέταση προγράμματος. • Δύσκαμπτη – γραφειοκρατική οργανωτική δομή. • Εξάρτηση της Αρχής Διαχείρισης από πολλούς εξωτερικούς φορείς. • Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. • Έλλειψη προσωπικού.
A.I.2	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
	• Έλλειψη εμπειρίας στην διαχείριση προγραμμάτων. • Έλλειψη εμπειρίας στην διαχείριση έργων. • Έλλειψη εμπειρίας στον έλεγχο έργων και προγραμμάτων. • Έλλειψη συνέχειας (στελεχών και εμπειρίας) από προηγούμενα έργα / προγράμματα.
A.I.3	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
	• Πλημμελής εκπαίδευση των στελεχών της αρχής διαχείρισης ως προς τις προβλεπόμενες διαδικασίες του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης. • Χρονοβόρες διαδικασίες εκπαίδευσης / ενημέρωσης ως προς τις αλλαγές των διαδικασιών του θεσμικού πλαισίου. • Πλημμελής τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. • Πλημμελής τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας.
A.I.4	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
	• Ανεπαρκή ή ακατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης έργων προς ένταξη. • Μη επαρκής ωριμότητα (μελετών, αδειοδοτήσεων, κτλ.) εντασσόμενων έργων. • Χρονοβόρες διαδικασίες ένταξης έργων (συντονισμός). • Μη επαρκής συμβατότητα εντασσόμενων έργων με τους όρους επιλεξιμότητας. • Μη επαρκής επίτευξη συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των εντασσόμενων έργων • Μη επαρκής αριθμός προτάσεων προς αξιολόγηση για ένταξη έργων. • Ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου του προβλεπόμενου ανά κατηγορία δράσης (υπερ-δέσμευση πόρων).
A.I.5	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
	• Μη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων. • Πλημμελής παρακολούθηση υλοποίησης φυσικού αντικείμενου. • Πλημμελής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργων.

	• Πλημμελής παρακολούθηση πληρωμών έργων. • Πλημμελής συλλογή & διασταύρωση στοιχείων έργων. • Πλημμελής ενημέρωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του προγράμματος. • Ανεπαρκής συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων. • Ανεπαρκής υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων.
A.I.6	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΩΝ
	• Λανθασμένη επιλογή δείγματος έργων προς έλεγχο. • Ανεπαρκής (αριθμητικά / ποιοτικά) σύνθεση ομάδας ελέγχου. • Προκαταλήψεις / έλλειψη αντικειμενικής κρίσης ομάδας ελέγχου. • Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. • Περιορισμένος χρόνος για την ουσιαστική διεξαγωγή των ελέγχων. • Μη συλλογή του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού κατά τον έλεγχο. • Μη παρακολούθηση συμμορφώσεων με τις υποδείξεις των ελέγχων. • Αδυναμία εξασφάλισης εξειδικευμένης εξωτερικής υποστήριξης για την διενέργεια των ελέγχων.
A.I.7	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	• Έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου. • Μη επαρκής δέσμευση της διοίκησης για την λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. • Μη τήρηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. • Ανεπαρκής (αριθμητικά / ποιοτικά) σύνθεση ομάδας ελέγχου. • Προκαταλήψεις / έλλειψη αντικειμενικής κρίσης ομάδας ελέγχου. • Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. • Περιορισμένος χρόνος για την ουσιαστική διεξαγωγή των ελέγχων. • Μη συλλογή του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού κατά τον έλεγχο. • Μη παρακολούθηση συμμορφώσεων με τις υποδείξεις των ελέγχων. • Έλλειψη συστήματος διασφάλισης ποιότητας. • Μη πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. • Μη επαρκής δέσμευση της διοίκησης για την λειτουργία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. • Υπερβολικά γραφειοκρατικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. • Υπερβολικά απλοϊκό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. • Μη επαρκής στοχοθεσία συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
A.I.8	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ & ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
	• Ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής. • Ανεπάρκεια συντήρησης υποδομής. • Ασυμβατότητες μεταξύ διαφορετικών τμημάτων εξοπλισμού. • Ανεπάρκεια προγραμματισμού προμήθειας εξοπλισμού. • Ανεπάρκεια συντονισμού προμηθευτών – συντηρητών. • Ανεπάρκεια συστήματος αξιολόγησης προμηθευτών – εξοπλισμού. • Έλλειψη πόρων. • Ανεπαρκής εκτίμηση χρηματο-ροών. • Ανεπαρκής ιεράρχηση αναγκών.
A.I.9	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
	• Έλλειψη συστήματος εκπαίδευσης και υποστήριξης στελεχών. • Έλλειψη πόρων για την χρήση υπηρεσιών εξωτερικής υποστήριξης.

	• Ανεπαρκής εκτίμηση των αναγκών. • Λανθασμένη κατανομή πόρων υποστήριξης.
A.II	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
A.II.1	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
	• Δύσκαμπτη – γραφειοκρατική οργανωτική δομή. • Εξάρτηση του Φορέα Υλοποίησης από πολλούς εξωτερικούς φορείς. • Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. • Έλλειψη προσωπικού.
A.II.2	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
	• Έλλειψη εμπειρίας στην διαχείριση έργων. • Έλλειψη εμπειρίας στον έλεγχο έργων. • Έλλειψη συνέχειας (στελεχών και εμπειρίας) από προηγούμενα έργα / προγράμματα
A.II.3	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
	• Πλημμελής εκπαίδευση των στελεχών ως προς τις προβλεπόμενες διαδικασίες του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης. • Χρονοβόρες διαδικασίες εκπαίδευσης / ενημέρωσης ως προς τις αλλαγές των διαδικασιών του θεσμικού πλαισίου. • Πλημμελής τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. • Πλημμελής τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας.
A.II.4	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
	• Μη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων. • Πλημμελής παρακολούθηση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου. • Πλημμελής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργων. • Πλημμελής παρακολούθηση πληρωμών έργων. • Πλημμελής συλλογή & διασταύρωση στοιχείων έργων. • Μη ύπαρξη ή πλημμελής ενημέρωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων. • Προβλήματα συντονισμού και επικοινωνίας με την αρχή διαχείρισης του προγράμματος.
A.II.5	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΩΝ
	• Ανεπαρκής (αριθμητικά / ποιοτικά) σύνθεση ομάδας ελέγχου. • Προκαταλήψεις / έλλειψη αντικειμενικής κρίσης ομάδας ελέγχου. • Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. • Περιορισμένος χρόνος για την ουσιαστική διεξαγωγή των ελέγχων. • Μη συλλογή του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού κατά τον έλεγχο. • Μη παρακολούθηση συμμορφώσεων με τις υποδείξεις των ελέγχων. • Αδυναμία εξασφάλισης εξειδικευμένης εξωτερικής υποστήριξης για την διενέργεια των ελέγχων.
A.II.6	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	• Έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου. • Μη επαρκής δέσμευση της διοίκησης για την λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. • Μη τήρηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. • Ανεπαρκής (αριθμητικά / ποιοτικά) σύνθεση ομάδας ελέγχου. • Προκαταλήψεις / έλλειψη αντικειμενικής κρίσης ομάδας ελέγχου. • Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων.

	• Περιορισμένος χρόνος για την ουσιαστική διεξαγωγή των ελέγχων. • Μη συλλογή του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού κατά τον έλεγχο. • Μη παρακολούθηση συμμορφώσεων με τις υποδείξεις των ελέγχων. • Έλλειψη συστήματος διασφάλισης ποιότητας. • Μη πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. • Μη επαρκής δέσμευση της διοίκησης για την λειτουργία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. • Υπερβολικά γραφειοκρατικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. • Υπερβολικά απλοϊκό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. • Μη επαρκής στοχοθεσία συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
A.II.7	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ & ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
	• Ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής. • Ανεπάρκεια συντήρησης υποδομής. • Ασυμβατότητες μεταξύ διαφορετικών τμημάτων εξοπλισμού. • Ανεπάρκεια προγραμματισμού προμήθειας εξοπλισμού. • Ανεπάρκεια συντονισμού προμηθευτών – συντηρητών. • Ανεπάρκεια συστήματος αξιολόγησης προμηθευτών – εξοπλισμού. • Έλλειψη πόρων. • Ανεπαρκής εκτίμηση χρηματο-ροών. • Ανεπαρκής ιεράρχηση αναγκών.
A.II.8	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
	• Έλλειψη συστήματος εκπαίδευσης και υποστήριξης στελεχών. • Έλλειψη πόρων για την χρήση υπηρεσιών εξωτερικής υποστήριξης. • Ανεπαρκής εκτίμηση των αναγκών. • Λανθασμένη κατανομή πόρων υποστήριξης.
B. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	
B.I	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
B.I.1	ΣΤΟΧΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
	• Ασαφείς στόχοι έργου. • Ασυμβατότητα στόχων και αναγκών. • Υπερβολικοί / ανεπαρκείς στόχοι για την δεδομένη συγκυρία / ανάγκες / απαιτήσεις / δυνατότητες. • Ασαφής ανάλυση των προσδοκώμενων άμεσων / έμμεσων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. • Ανεπαρκής εκτίμηση πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων έργου.
B.I.2	ΠΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
	• Μη εξασφάλιση χρηματοδότησης. • Ανεπαρκής εκτίμηση χρηματο-ροών. • Ανεπαρκής εκτίμηση εναλλακτικών (δάνεια, κτλ.). • Ανεπαρκής / ασαφής προσδιορισμός παραδοτέων έργου. • Ασυμβατότητα παραδοτέων με στόχους και ανάγκες.
B.I.3	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ: ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΧΡΗΣΤΕΣ – ΩΦΕΛΩΜΕΝΟΙ – ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ
	• Ανεπαρκής / ασαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και ρόλων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ιδιοκτήτης, φορέας υλοποίησης, φορέας χρηματοδότησης, φορέας λειτουργίας, κτλ.). • Ανεπαρκής προσδιορισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων. • Υπερεκτίμηση / υποτίμηση δυνατοτήτων παρέμβασης φορέων.

	• Ανεπαρκής εκτίμηση αναγκών / συμφερόντων εμπλεκομένων. • Λανθασμένη πρόβλεψη αντιδράσεων / αποδοχής έργου. • Ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων.
B.I.4	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
	• Χρονοβόρες διαδικασίες. • Ανεπαρκής παρουσίαση έργου. • Ανεπαρκής δημοσιότητα της διαβούλευσης. • Λανθασμένη στοχοθέτηση δημοσιότητας. • Ανεπαρκής ενσωμάτωση παρατηρήσεων.
B.I.5	ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ
	• Έλλειψη μελέτης σκοπιμότητας. • Έλλειψη προκαταρκτικών μελετών και οικονομο-τεχνικής αξιολόγησης. • Ανεπάρκεια εκτίμησης προϋπολογισμού έργου.
B.I.6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
	• Ανεπαρκής εκτίμηση λειτουργικότητας έργου. • Ανεπαρκής εκτίμηση κόστους λειτουργίας και συντήρησης. • Ανεπαρκής προσδιορισμός πόρων για την κάλυψη κόστους λειτουργίας και συντήρησης. • Ανεπαρκής εκτίμηση αναγκών διασύνδεσης / ένταξης σε γενικότερο σύστημα λειτουργίας.
B.I.7	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
	• Λανθασμένη επιλογή είδους έργου (δημόσιο, παραχώρηση, σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, κτλ.) • Υπερεκτίμηση / υποτίμηση πόρων και δυνατοτήτων για κάθε είδους έργο.
B.I.8	ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
	• Ανεπαρκής εκτίμηση επιπέδου πολυπλοκότητας έργου • Υπερεκτίμηση / υποτίμηση δυνατοτήτων ανταπόκρισης στο αναγνωρισθέν επίπεδο πολυπλοκότητας.
B.I.9	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
	• Ανεπαρκής εξέταση διαθέσιμων τεχνολογιών. • Λανθασμένη επιλογή τεχνολογίας, με δεδομένες τις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου. • Επιλογή υπερβολικά καινοτόμας τεχνολογίας, χωρίς εξασφάλιση της κατάλληλης υποστήριξης και εναλλακτικών επιλογών. • Επιλογή απαξιωμένης / ξεπερασμένης τεχνολογίας.
B.I.10	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	• Ανεπαρκής εξέταση περιβαλλοντικών συνθηκών. • Εμπλοκή έργου με προστατευόμενη περιοχή (π.χ. Natura). • Ανεπαρκής εκτίμηση περιεχομένου περιβαλλοντικών όρων και επίπτωσής τους στο κόστος.
B.I.11	ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
	• Ανεπαρκής εκτίμηση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. • Ανεπαρκής εκτίμηση δυνατότητας αδειοδοτήσεων.
B.I.12	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
	• Λανθασμένη χωροθέτηση έργου (μη επιλογή της καταλληλότερης περιοχής ή/και ασυμβατότητα στόχων / απαιτήσεων / αποτελεσμάτων έργου με ανάγκες / απαιτήσεις / δυνατότητες περιοχής). • Χρονοβόρες διαδικασίες απόκτησης ιδιοκτησίας τοποθεσίας έργου.

B.I.13	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΠΟΕΡΓΑ
	Κατανομή έργου σε πολύ μικρό αριθμό υποέργων, με μεγάλη δυσκολία διαχείρισης.
	Κατανομή έργου σε πολύ μεγάλο αριθμό υποέργων, με μεγάλη δυσκολία συντονισμού.
	Ανεπαρκής ενσωμάτωση περιορισμών νομοθεσίας κατά την κατανομή σε υποέργα (π.χ. «κατάτμηση» έργου).
	Ανεπαρκής εκτίμηση συνδέσεων και διεπαφών μεταξύ δραστηριοτήτων, κατά την κατανομή σε υποέργα.
B.I.14	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ
	Ανεπαρκής εκτίμηση συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλα έργα.
	Επιλογή έργων χωρίς συνέργειες και συμπληρωματικότητα.
B.II	ΣΥΜΒΑΣΗ
B.II.1	ΣΑΦΗΝΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	Χρονοβόρες διαδικασίες σύνταξης των τευχών δημοπράτησης.
	Ύπαρξη ασαφειών στα τεύχη δημοπράτησης.
	Ύπαρξη ελλείψεων στα τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα και με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
	Ύπαρξη ασυμβατοτήτων / αντιφάσεων μεταξύ των τευχών.
	Χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης των τευχών.
	Ανεπάρκεια συστήματος σύνταξης και ελέγχου των τευχών.
B.II.2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	Λανθασμένη επιλογή συστήματος δημοπράτησης, με βάση το είδος του έργου, το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και τις ανάγκες.
	Χρονοβόρες διαδικασίες δημοπράτησης.
	Μη επίτευξη ικανοποιητικής συμμετοχής στη δημοπράτηση.
	Ασάφεια / ανεπάρκεια στα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών.
	Διαβλητότητα συστήματος αξιολόγησης των προσφορών.
	Ανεπαρκής τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων (τήρηση πρακτικών, εγκρίσεις, κοινοποιήσεις, κτλ.)
	Ύπαρξη αμφισβητήσεων και ενστάσεων κατά του αποτελέσματος.
B.II.3	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
	Ανεπαρκής εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος όλων των δραστηριοτήτων.
	Ανεπαρκής εκτίμηση των καθυστερήσεων κατά την διαδικασία δημοπράτησης.
	Ανεπαρκής εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφορετικών υποέργων ή/και έργων – ανελαστικότητα χρονοδιαγραμμάτων.
B.II.4	ΡΗΤΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	Ασαφής / ανεπαρκής καθορισμός των ρητρών κακής εκτέλεσης ή καθυστερήσεων.
B.III	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ
B.III.1	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
	Έλλειψη / ανεπάρκεια επικοινωνίας μεταξύ αρχής διαχείρισης προγράμματος και φορέα υλοποίησης έργου.
	Έλλειψη / ανεπάρκεια επικοινωνίας μεταξύ αναδόχου και φορέα υλοποίησης έργου.
	Ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ εμπλεκόμενων.

B.III.2	ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
	- Έλλειψη εργατικού δυναμικού. - Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. - Έλλειψη εμπειρίας εργατικού δυναμικού.
B.III.3	LOGISTICS & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
	- Μη έγκαιρη διαθεσιμότητα υλικών. - Μη έγκαιρη διαθεσιμότητα μηχανημάτων και εξοπλισμού. - Βλάβες υλικού και εξοπλισμού. - Ανεπαρκής συντήρηση εξοπλισμού. - Ανεπαρκής ποιότητα υλικών / εξοπλισμού. - Ανεπαρκής αποθήκευση υλικών / εξοπλισμού. - Ανεπαρκής χρονο-προγραμματισμός.
B.III.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
	- Ανεπάρκεια υπεργολάβων. - Μη διαθεσιμότητα υπεργολάβων. - Αντικατάσταση υπεργολάβων, χωρίς την άδεια / ενημέρωση φορέα υλοποίησης.
B.III.5	ΑΣΦΑΛΙΣΗ
	Έλλειψη / ανεπάρκεια ασφαλίσεων.
B.III.6	ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ
	- Μη λήψη / ανεπάρκεια μέτρων ασφάλειας και υγιεινής - Μη συμμόρφωση με την προβλεπόμενη νομοθεσία.
B.III.7	ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
	- Έλλειψη συστήματος ποιοτικού ελέγχου. - Μη τήρηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου. - Ανεπαρκής (αριθμητικά / ποιοτικά) σύνθεση ομάδας ελέγχου. - Προκαταλήψεις / έλλειψη αντικειμενικής κρίσης ομάδας ελέγχου. - Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. - Περιορισμένος χρόνος για την ουσιαστική διεξαγωγή των ελέγχων. - Μη συλλογή του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού κατά τον έλεγχο. - Μη παρακολούθηση συμμορφώσεων με τις υποδείξεις των ελέγχων.
Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ	
Γ.Ι	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Γ.Ι.1	ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
	- Πλημμύρες. - Σεισμοί. - Ακραία καιρικά φαινόμενα. - Κατολισθήσεις.
Γ.Ι.2	ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ
	Τρομοκρατικές ενέργειες – βανδαλισμοί.
Γ.ΙΙ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Γ.ΙΙ.1	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
	- Πιθανές αλλαγές του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. - Καθυστέρηση υλοποίησης αποφάσεων / σχεδιασμού.
Γ.ΙΙ.2	ΠΛΑΙΣΙΟ & ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	- Αλλαγή πολιτικής. - Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων.

Γ.ΙΙ.3	ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
	- Αλλαγή κυβέρνησης / διοίκησης. - Καθυστέρηση υλοποίησης αποφάσεων / σχεδιασμού.
Γ.ΙΙ.4	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
	- Ανταγωνισμός από αντίστοιχα έργα άλλων χωρών. - Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από άλλες χώρες.
Γ.ΙΙΙ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Γ.ΙΙΙ.1	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
	- Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο. - Κίνητρα / αντι-κίνητρα επενδύσεων.
Γ.ΙΙΙ.2	ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
	Αύξηση / μείωση τιμών.
Γ.ΙV	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Γ.ΙV.1	ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	- Κινητοποιήσεις (απεργίες) των εργατικών συνδικάτων. - Υπερ-προσφορά / έλλειψη εργατικού δυναμικού.
Γ.ΙV.2	ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
	Παραδόσεις – προκαταλήψεις.

Πίνακας 2.10: Επίπεδο 5 RBS προγράμματος

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο Πίνακας 2.10 που αποτελεί το επίπεδο 5 της RBS αποτυπώνει τους περισσότερους δυνατούς αναγνωρισθέντες παράγοντες κινδύνου που μπορούν να απειλήσουν το πρόγραμμα. Με δεδομένο το πεπερασμένο του υπό ανάπτυξη συστήματος από τον Σύμβουλο, καθώς πρέπει κατά κύριο λόγο, να είναι ένα ευέλικτο και εύκολα διαχειρίσιμο σύστημα, το οποίο να δίνει όσο το δυνατόν αμεσότερα αποτελέσματα προς όφελος της Δ.Α., απαιτείται οι παράγοντες κινδύνου που θα διαμορφώσουν το σύστημα να περιοριστούν σε αριθμό και εύρος στοιχείων εισαγωγής.

Στην παρούσα ανάλυση, στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν στην μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί οι παράγοντες κινδύνου εκείνοι οι οποίοι θα έχουν ως χαρακτηριστικά:

- Την δυνατότητα εφαρμογής τους σε όλα τα έργα του προγράμματος ανεξάρτητα από την φύση τους, την κατηγοριοποίησή τους, καθώς και τον τομέα του προγράμματος (Τομέας Μεταφορών και Τομέας Περιβάλλον) στα οποία ανήκουν (global approach).
- Την ενσωμάτωση τόσο αντικειμενικής όσο και υποκειμενικής πληροφορίας για την ευρύτητα και την ευαισθησία του συστήματος που θα αναπτυχθεί.
- Την διασπορά τους σε όλες τις κατηγορίες του επιπέδου 1 της RBS που αναπτύχθηκε για το πρόγραμμα καθώς και την διασπορά τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες υποκατηγορίες του επιπέδου 5 της RBS (πίνακας 6).
- Την δυνατότητα υπολογισμού τους από τα στοιχεία του ΟΠΣ και τα στοιχεία του αρχείου του προγράμματος.

Οι παράγοντες κινδύνου έργων και φορέων υλοποίησης που επιλέχθηκαν προς διερεύνηση και επεξεργασία είναι εκείνοι που δύνανται να επιφέρουν την μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην συνολική επικινδυνότητα των Πράξεων και των φορέων υλοποίησης, αντίστοιχα. Εξαιρέθηκαν κάποιοι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι φαίνεται να μην επιφέρουν σημαντική διαφοροποίηση ως προς τον κίνδυνο, όπως:

- ο παράγοντας κινδύνου «Αναγκαίοι πόροι για την χρηματοδότηση του έργου», καθώς τα έργα που εξετάζονται είναι αρκετά ώριμα και θεωρείται ότι έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή τους,
- παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με εξωτερικούς, πολιτικούς και οικονομικούς, κινδύνους ή άλλες απρόοπτες καταστάσεις (π.χ. όπως μία πανδημία), καθώς επιφέρουν κοινό κίνδυνο σε όλες τα έργα
- παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τους αναδόχους των έργων, καθώς το περιορισμένο χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση της ανάλυσης κινδύνου δεν μπορεί να ενσωματώσει στο πλαίσιο του την συγκέντρωση, την διερεύνηση και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τους αναδόχους.

Σημαντικό και κομβικό σημείο της παρούσας προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι οι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας ως οδηγό την αναπτυχθείσα RBS, ταξινομούνται σε δύο (2) μεγάλες κατηγορίες:

- τους **παράγοντες πιθανότητας** και
- τους **παράγοντες επίπτωσης**.

Οι παράγοντες πιθανότητας αποτελούν ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά / καταστάσεις που επιδρούν αρνητικά στην πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων, ενώ οι παράγοντες επίπτωσης αποτελούν τα χαρακτηριστικά / καταστάσεις που επιδρούν αρνητικά στην επίπτωση των κινδύνων, εφόσον εμφανισθούν.

Στους **παράγοντες πιθανότητας** προτείνονται και οι περισσότεροι παράγοντες κινδύνου του συστήματος που αναπτύσσεται και οι οποίοι και ταξινομούνται σε 4 μεγάλες υπο-κατηγορίες:

- **Εγγενείς Παράγοντες Κινδύνου:** Οι εν λόγω παράγοντες ενυπάρχουν σε όλα τα έργα λόγω της φύσης τους ή της πολυπλοκότητάς τους, ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησης και την διαχειριστική του επάρκεια.
- **Παράγοντες Κινδύνου Φορέα Υλοποίησης:** Οι εν λόγω παράγοντες σχετίζονται με τα γενικά χαρακτηριστικά του φορέα υλοποίησης, όπως το είδος του ή τη στελέχωση και την εν γένει επάρκειά του, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο έργο που βρίσκεται υπό εξέταση.

- **Παράγοντες Κινδύνου Διαχείρισης:** Οι εν λόγω παράγοντες σχετίζονται με την διαχειριστική απόδοση του φορέα υλοποίησης στο υπό εξέταση έργο και κατά συνέπεια σχετίζονται και με την συμμόρφωση του φορέα υλοποίησης στους όρους της απόφασης ένταξης του υπό εξέταση έργου στο πρόγραμμα.
- **Παράγοντες Κινδύνου Διασύνδεσης:** Οι εν λόγω παράγοντες αποτελούν μια ειδική κατηγορία, καθώς σχετίζονται ουσιαστικά με την διασύνδεση της διαδικασίας ανάλυσης παραγόντων κινδύνου με την διαδικασία ανάλυσης κινδύνων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εισαγωγή παραγόντων διασύνδεσης είναι μια σημαντική καινοτομία έναντι του συνόλου των προτεινόμενων προσεγγίσεων στη διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίες αποφεύγουν γενικότερα τη χρήση παραγόντων που προϋποθέτουν εξειδικευμένη γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών στα επιμέρους έργα. Στην προτεινόμενη μεθοδολογία κάτι τέτοιο καθίσταται εφικτό, χάρη στην ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία επιτρέπει την χρήση των δεδομένων και της ανάλυσης του επιπέδου της διαχείρισης κινδύνων των έργων του προγράμματος και στο επίπεδο των ελέγχων των έργων, με έναν δομημένο, εύκολο και αυτοματοποιημένο τρόπο.

Εκτός από τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις, οι παράγοντες κινδύνου ταξινομούνται σε δύο επιπλέον κατηγορίες, με βάση το είδος της διαδικασίας αξιολόγησης:

- Στους **παράγοντες κινδύνου αντικειμενικής ανάλυσης.**
- Στους **παράγοντες κινδύνου υποκειμενικής ανάλυσης.**

Οι παράγοντες κινδύνου αντικειμενικής ανάλυσης είναι αυτοί που σχετίζονται ουσιαστικά με τα γενικά χαρακτηριστικά των έργων ή των φορέων υλοποίησης. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου, ακριβώς επειδή αφορούν όλα τα έργα και τα γενικά χαρακτηριστικά τους, μπορούν να αξιολογηθούν εύκολα με γενικό, αντικειμενικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται γνώση των ειδικών συνθηκών των επιμέρους έργων.

Από την άλλη πλευρά, οι παράγοντες κινδύνου υποκειμενικής ανάλυσης αφορούν πιο συγκεκριμένα στα έργα και εκτιμώνται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η ανάλυση αυτού του είδους των παραγόντων δεν μπορεί παρά να βασιστεί στην εμπειρία εξειδικευμένων στελεχών, καθώς και στα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων. Με δεδομένο ότι οι εν λόγω παράγοντες προϋποθέτουν εξειδικευμένη γνώση κάθε επιμέρους έργου, ο απαιτούμενος χρόνος για την αξιολόγησή τους καθίσταται απαγορευτικός στα πλαίσια της παρούσας προσέγγισης, αλλά και η εμπειρία έχει καταδείξει ότι σε προγράμματα μεγάλης κλίμακας, όπως το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία η προσέγγισή τους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, στην εφαρμοσθείσα προσέγγιση χρησιμοποιούνται παράγοντες υποκειμενικής ανάλυσης μόνο για τους παράγοντες κινδύνου των φορέων υλοποίησης και για τους παράγοντες κινδύνου διασύνδεσης, διότι δεν καθίσταται δυνατό να προσεγγιστούν διαφορετικά. Από τους εν λόγω παράγοντες, **οι παράγοντες διασύνδεσης είναι τελικά οι μοναδικοί παράγοντες υποκειμενικής ανάλυσης με εφαρμογή σε επίπεδο έργου**. Αν και εδώ απαιτείται στην γενική περίπτωση ένα υπερβολικό διαχειριστικό κόστος, που συνήθως κάνει απαγορευτική την χρήση τέτοιων παραγόντων, εντούτοις, στην περίπτωση της ολοκληρωμένης προσέγγισης, είναι δυνατόν η διαδικασία αξιολόγησης να απλουστευθεί σημαντικά, με κατάλληλη αξιοποίηση των δεδομένων της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνων. Γι' αυτό, στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης διαχείρισης κινδύνων έργων, ειδικά για τα έργα του τομέα Περιβάλλοντος που είναι πολλά στον αριθμό, οι παράγοντες κινδύνου διασύνδεσης προσεγγίζονται σε επίπεδο κατηγορίας έργων και όχι για κάθε έργο ξεχωριστά.

Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται οι παράγοντες κινδύνου που χρησιμοποιήθηκαν στο υπό ανάπτυξη σύστημα διαχείρισης κινδύνων, κατηγοριοποιημένοι ανάλογα με το είδος του παράγοντα κινδύνου:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ			ΑΝΑΛΥΣΗ		ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ	
			Αντικειμενική	Υποκειμενική	Διακριτές	Συνεχείς
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	Εγγενείς	Φύση Έργου	X		X	
		Είδος Έργου	X		X	
		Είδος Υποέργων	X		X	
		Τεχνολογία	X		X	
		Μέγεθος έργου σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Φ.Υ.στο Πρόγραμμα	X			X
		Αριθμός Υποέργων του Έργου	X			X
		Ιδιοκτησία Οικοπέδου Έργου	X		X	
	Παράγοντες Φορέα Υλοποίησης	Είδος φορέα υλοποίησης	X		X	
		Οργανωτική Δομή Φορέα		X	X	
		Εγχειρίδιο Διαχείρισης - Υλοποίησης Πράξεων / Έργων	X		X	
		Πιστοποίηση επάρκειας φορέα	X		X	
		Επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό		X	X	

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ			ΑΝΑΛΥΣΗ		ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ	
			Αντικειμενική	Υποκειμενική	Διακριτές	Συνεχείς
		Επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό		X		X
		Εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση Πράξεων / Έργων		X		X
		Επάρκεια εξοπλισμού και πόρων φορέα υλοποίησης		X		X
		Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας φορέα και διασφάλιση ποιότητας εργασίας		X		X
		Έλεγχος Πράξεων / Έργων		X		X
		Μέγεθος έργου σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα που έχει ο Φ.Υ.	X		X	
		Αριθμός συγχρημ. Έργων που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί από τον Φ.Υ.	X		X	
	Παράγοντες Διαχείρισης	Καθυστέρηση υποβολής δελτίων προόδου από τον Φορέα Υλοποίησης	X			X
		Τροποποιήσεις αρχικού σχεδιασμού	X			X
		Αριθμός διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων, καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου	X			X
		Διαδικασίες δημοπράτησης	X		X	
		Καθυστερήσεις χρονοδιαγράμματος	X			X
		Αύξηση κόστους έργου	X			X
	Παράγοντες Διασύνδεσης	Αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων		X		X
		Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων		X		X
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ		Προϋπολογισμός Έργου	X			X

Πίνακας 2.11: Πίνακας παραγόντων κινδύνου συστήματος

3 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

3.1 Μεθοδολογία για την αποτίμηση κινδύνου των Δικαιούχων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Η αποτίμηση του κινδύνου που απειλεί τα έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και κατά συνέπεια και το ίδιο το πρόγραμμα και προέρχεται από τους Δικαιούχους που υλοποιούν τα έργα, στην παρούσα μεθοδολογία αποτελεί ένα ξεχωριστό υποσύστημα της συνολικής μεθοδολογίας αποτίμησης και διαχείρισης κινδύνων που παρουσιάζεται στο παρόν πόνημα για τρεις κύριους λόγους:

1. Οι Δικαιούχοι επαναλαμβάνονται σε περισσότερα από ένα έργα του προγράμματος συνήθως, οπότε είναι υπολογιστικά πιο εύκολο να δημιουργηθεί το εν λόγω υποσύστημα.
2. Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα από τα στοιχεία και τις αναφορές του ΟΠΣ ώστε να προσεγγιστούν τα σημεία επάρκειας των δικαιούχων, οπότε κρίθηκε αναγκαίο η διαφοροποίηση στην μεθοδολογία συγκέντρωσης στοιχείων.
3. Το υποσύστημα της αποτίμησης της επικινδυνότητας των δικαιούχων μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα και να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τα στελέχη της Δ.Α. και στο μέλλον.

3.1.1 Παράγοντες κινδύνου Δικαιούχων

Με βάση τον Πίνακα 2.11 όπου φαίνεται η κύρια μήτρα των παραγόντων κινδύνου για το πρόγραμμα συνολικά, οι παράγοντες κινδύνου που αφορούν τους δικαιούχους των έργων του προγράμματος, φαίνεται στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ			ΑΝΑΛΥΣΗ		ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ	
			Αντικειμενική	Υποκειμενική	Διακριτές	Συνεχείς
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ	Εγγενείς	Είδος Δικαιούχου	X		X	
		Οργανωτική Δομή Φορέα		X	X	
		Εγχειρίδιο Διαχείρισης - Υλοποίησης Πράξεων / Έργων	X		X	
		Πιστοποίηση επάρκειας φορέα	X		X	
		Επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό		X	X	

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ			ΑΝΑΛΥΣΗ		ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ	
			Αντικειμενική	Υποκειμενική	Διακριτές	Συνεχείς
		Επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό		X		X
		Εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση Πράξεων / Έργων		X		X
		Επάρκεια εξοπλισμού και πόρων φορέα υλοποίησης		X		X
		Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας φορέα και διασφάλιση ποιότητας εργασίας		X		X
		Έλεγχος Πράξεων / Έργων		X		X
		Αριθμός συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί από τον Φ.Υ.	X		X	
		Μέσος προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο δικαιούχος	X		X	
		Αριθμός έργων Δικαιούχου που είναι ενταγμένα στο Ε.Π. ΥΠΕΠΕΡΑΑ	X		X	
	Παράγοντας Διασύνδεσης	Απόκριση - ετοιμότητα δικαιούχου στις απαιτήσεις της Δ.Α. - Αριθμός αναγνωρισθέντων προβλημάτων		X	X	

Πίνακας 3.1: Παράγοντες κινδύνου υποσυστήματος Δικαιούχων

Σύμφωνα με όλες τις προσεγγίσεις που εμπλέκουν ανάλυση παραγόντων κινδύνου Δικαιούχων κάθε παράγοντας κινδύνου προκαλεί διαφορετική έκθεση σε κίνδυνο που επιφέρει ο Δικαιούχος, ανάλογα με τις πιθανές τιμές / χαρακτηριστικά του κάθε παράγοντα κινδύνου (RFd) που μπορεί να πάρει. Έτσι, στην παρούσα προσέγγιση αξιολόγησης της επικινδυνότητας των παραγόντων κινδύνου, καθορίζονται οι κανόνες που περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ των πιθανών τιμών / χαρακτηριστικών του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου RFd για κάθε παράγοντα κινδύνου i και της προκαλούμενης έκθεσης σε κίνδυνο που επιφέρει ο εκάστοτε Δικαιούχος (Risk d– Rd).

Στην συνέχεια, στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται τα πεδία τιμών των παραγόντων κινδύνου των Δικαιούχων:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ		
	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Είδος Δικαιούχου	Υπηρεσίες Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης	-	Χαμηλή
	Δήμοι	πληθυσμός <= 100.000 κατοίκων	Υψηλή
		100.000 κατ.<πληθ.<=500.000 κατ.	Μέτρια
		πληθυσμός > 500.000 κατοίκων	Χαμηλή
	Περιφέρειες	-	Μέτρια
	ΝΠΔΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου	-	Μέτρια
	ΝΠΙΔ	-	Υψηλή
Οργανωτική Δομή Φορέα	Επάρκεια Οργανωτικής Δομής	Βαθμολογία Επαρκειας Οργανωτικής Δομής >=85%	Χαμηλή
		65%=<Βαθμολογία Επαρκειας Οργανωτικής Δομής <85%	Μέτρια
		50%=<Βαθμολογία Επάρκειας Οργανωτικής Δομής <65%	Υψηλή
Εγχειρίδιο Διαχείρισης - Υλοποίησης Πράξεων / Έργων	Διαδικασίες Διαχείρισης και Υλοποίησης Πράξεων / Έργων	Ύπαρξη πλήρους και επικαιροποιημένου εγχειριδίου και θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες Διαχείρισης και Υλοποίησης Πράξεων/Έργων	Χαμηλή
		Ύπαρξη μη επικαιροποιημένου εγχειριδίου και θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες Διαχείρισης και Υλοποίησης Πράξεων/Έργων	Μέτρια
		Μη ύπαρξη εγχειριδίου και διαδικασιών	Υψηλή

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ		
	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Πιστοποίηση επάρκειας φορέα	Πιστοποίηση Διοικητικής Ικανότητας από τρίτους φορείς	Υπαρξη πιστοποιητικού σε ισχύ	Χαμηλή
		Μη ύπαρξη πιστοποιητικού σε ισχύ αλλά ύπαρξη λήρους και επικαιροποιημένου εγχειριδίου και θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες Διαχείρισης και Υλοποίησης Πράξεων/Εργων	Μέτρια
Επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό	Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού του φορέα για την υλοποίηση - παρακολούθησης Πράξεων / Έργων	Βαθμολόγηση επάρκειας σε ανθρώπινο δυναμικό >=85%	Χαμηλή
		65%=<Βαθμολόγηση επάρκειας σε ανθρώπινο δυναμικό <85%	Μέτρια
		65%=<Βαθμολόγηση επάρκειας σε ανθρώπινο δυναμικό <65%	Υψηλή
Επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό	Ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία στην υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων / Έργων	Πάνω από 50% του προσωπικού	Χαμηλή
		Από 30% έως 50% του προσωπικού	Μέτρια
		Κάτω από το 50% του προσωπικού	Υψηλή
Εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση Πράξεων / Έργων	Εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση Πράξεων / Έργων	Αριθμός Πράξεων>=25	Χαμηλή
		10=<Αριθμός Πράξεων<25	Μέτρια
		Αριθμός Πράξεων<=10	Υψηλή
Επάρκεια εξοπλισμού και πόρων φορέα υλοποίησης	Επάρκεια του εξοπλισμού και των πόρων (π.χ. πρόσβαση σε συστήματα, βάσεις δεδομένων κλπ) σε σχέση με τον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα	Επάρκεια εξοπλισμού από 85% και πάνω σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό	Χαμηλή
		Επάρκεια εξοπλισμού μικρότερη από 85% αλλά μεγαλύτερη από 65% σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό	Μέτρια
		Επάρκεια εξοπλισμού μικρότερη από 65% σε	Υψηλή

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ		
	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
		σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό	
Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας φορέα και διασφάλιση ποιότητας εργασίας	Σύστημα διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας φορέα και διασφάλισης ποιότηταςεργασίας	Ύπαρξη συστήματος	Χαμηλή
		Μη ύπαρξη συστήματος	Μέτρια
Έλεγχος Πράξεων / Έργων	Σύστημα Ελέγχου των Πράξεων /Εργων που υλοποιεί ο φορέας	Ύπαρξη συστήματος	Χαμηλή
		Μη ύπαρξη συστήματος	Μέτρια
Αριθμός συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί από τον Φ.Υ	Συγχρηματοδοτούμενα έργα που έχει υλοποιήσει ο φορέας	0 συγχρηματοδοτούμενα έργα	Πολύ Υψηλή
		1-2 συγχρηματοδοτούμενα έργα	Υψηλή
		3-4 συγχρηματοδοτούμενα έργα	Μέτρια
		5 συγχρηματοδοτούμενα έργα	Χαμηλή
		Πάνω από 5 συγχρηματοδοτούμενα έργα	Πολύ Χαμηλή
Μέσος προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο δικαιούχος	Ο συνολικός προϋπολογισμός των συγχρηματοδοτούμενων έργων του φορέα, προς το πλήθος	Έως και 250.000 €	Πολύ Υψηλή
		Από 250.000 € έως και 500.000 €	Υψηλή
		Από 500.000 € έως και 750.000 €	Μέτρια
		Από 750.000 € έως και 1.000.000 €	Χαμηλή
		Πάνω από 1.000.000 €	Πολύ Χαμηλή
Αριθμός έργων Δικαιούχου που είναι ενταγμένα στο Ε.Π. ΥΠΕΠΕΡΑΑ	Ο αριθμός των έργων του Δικαιούχου που είναι ενταγμένα στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Μόνο 1 έργο	Πολύ Υψηλή
		Έως 2 έργα	Υψηλή
		Έως 3 έργα	Μέτρια
		Έως 4 έργα	Χαμηλή
		Πάνω από 4 έργα	Πολύ Χαμηλή
Απόκριση - ετοιμότητα δικαιούχου στις	Ο αριθμός των διεγνωσμένων προβλημάτων που	Κανένα διεγνωσμένο πρόβλημα	Πολύ χαμηλή

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ		
	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
απαιτήσεις της Δ.Α. - αριθμός αναγνωρισθέντων προβλημάτων	παρακωλύουν την άμεση και απρόσκοπτη απόκριση του Δικαιούχου στις απαιτήσεις της Δ.Α. και εν γένει στις διαχειριστικές ανάγκες των έργων	Ένα διεγνωσμένο πρόβλημα	Μέτρια
		Περισσότερα από δύο διεγνωσμένα προβλήματα	Πολύ Υψηλή

Πίνακας 3.2: Πεδία τιμών παραγόντων κινδύνου φορέα υλοποίησης

Στον παραπάνω πίνακα, τα πεδία ορισμού τιμών των παραγόντων κινδύνου είναι κατά κύριο λόγο εμπειρικά. Η επίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο που εισάγει ο κάθε παράγοντας κινδύνου (risk factor) παίρνει ουσιαστικά ένα λεκτικό χαρακτηρισμό. Με τον όρο «επίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο» αναφερόμαστε στην επίπτωση που επιφέρει η εμφάνιση του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου στην συνολικό κίνδυνο Rd που παρουσιάζει ο εκάστοτε Δικαιούχος. Στην πρώτη προσέγγιση, η επίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με λεκτικούς χαρακτηρισμούς και με κλιμάκωση:

- **Πολύ Υψηλή:** όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται στον Δικαιούχο με τιμή που θα επιφέρει ως επίπτωση πολύ μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας για τον Δικαιούχο.
- **Υψηλή:** όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται στον Δικαιούχο με τιμή που θα επιφέρει ως επίπτωση μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας για τον Δικαιούχο.
- **Μέτρια:** όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται στον Δικαιούχο με τιμή που θα επιφέρει ως επίπτωση πολύ μέτριο βαθμό επικινδυνότητας για τον Δικαιούχο.
- **Χαμηλή:** όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται στον Δικαιούχο με τιμή που θα επιφέρει ως επίπτωση μικρό βαθμό επικινδυνότητας για τον Δικαιούχο
- **Πολύ Χαμηλή:** όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται στον Δικαιούχο με τιμή που θα επιφέρει ως επίπτωση πολύ μικρό βαθμό επικινδυνότητας για τον Δικαιούχο.

Για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου του έργου, κάθε ένας από τους παράγοντες κινδύνου στις παραπάνω κατηγορίες βαθμολογείται σε μια αριθμητική κλίμακα από 10-50, με το 10 να εκφράζει την μικρή επίπτωση εμφάνισης του παράγοντα.

Η λεκτική περιγραφή των κανόνων που περιγράφουν το σύστημα είναι της μορφής:

Εάν (η τιμή / χαρακτηριστικό του i παράγοντα κινδύνου $Rf(i)$ έχει τιμή K), **Τότε** (η επικινδυνότητα του Δικαιούχου $Rd(i)$ είναι ίση με X)

Για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει ο Δικαιούχος, πρέπει να οριστούν οι βαρύτητες (weights - w_d) του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου (Rf_d), δηλαδή του πόσο

«έντονος» είναι ο κίνδυνος που εισάγει ο κάθε παράγοντας κινδύνου σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έτσι, ο γενικός τύπος που περιγράφει τον συνολικό κίνδυνο Rd του Δικαιούχου είναι:

$$Rd(\text{δικαιούχου}) = \sum_{i=1}^{17} wd(i) \cdot RFd(i)$$

Όπου: RFd(i) η τιμή του παράγοντα κινδύνου i του Δικαιούχου

wd(i) η τιμή της βαρύτητας του παράγοντα κινδύνου i Δικαιούχου

Στην διαδικασία ανάλυσης κινδύνων, οι βαρύτητες αξιολογούνται κυρίως με βάση την εμπειρία. Ο καθορισμός των βαρυτήτων ολοκληρώνεται με επιτυχία σε δύο βήματα:

- Αρχικά, οι βαρύτητες καθορίζονται στο ανώτατο επίπεδο της κατηγοριοποίησης των παραγόντων κινδύνου, ήτοι καθορίζεται η βαρύτητα για τους παράγοντες πιθανότητας και επίπτωσης. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι βαρύτητες στο αμέσως επόμενο επίπεδο κατηγοριοποίησης (εγγενείς παράγοντες κινδύνου, παράγοντες κινδύνου φορέων υλοποίησης, παράγοντες κινδύνου διαχείρισης και παράγοντες κινδύνων διαχείρισης).

Κατόπιν, οι βαρύτητες καθορίζονται για όλους τους παράγοντες κινδύνου εντός των κατηγοριών και υποκατηγοριών.

Η αποτίμηση των βαρυτήτων αποτελεί μία σταδιακή διαδικασία. Αρχικά καλούνται να καθορίσουν τις βαρύτητες γενικά και κατόπιν σε κάθε μία από τις κατηγορίες, τις υποκατηγορίες αυτών και, τέλος, στους παράγοντες κινδύνου. Χρησιμοποιώντας την σειριακή και ιεραρχική αυτή διαδικασία εξασφαλίζεται ότι θα εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα βήματα, χωρίς να δημιουργηθούν κενά στην ανάλυση. Η τιμή κάθε βαρύτητας wd(i) για κάθε έναν παράγοντα κινδύνου i χαρακτηρίζεται στην διαδικασία αυτή λεκτικά, με βάση το παρακάτω σύνολο λεκτικών τιμών:

- Πολύ Υψηλή Βαρύτητα (wd(i))
- Υψηλή Βαρύτητα (wd(i))
- Μέτρια Βαρύτητα (wd(i))
- Χαμηλή Βαρύτητα (wd(i))
- Πολύ Χαμηλή Βαρύτητα (wd(i))

Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των ανωτέρω παραγόντων κινδύνου συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία δόθηκαν προ συμπλήρωσης στους Δικαιούχους και στα στελέχη της ΕΥΔ. Καθώς το είδος της πληροφορίας που θα έπρεπε να συγκεντρωθεί από τα στελέχη της ΕΥΔ και από τους Δικαιούχους είναι διαφορετικής φύσης, δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια.

Τα ερωτηματολόγια που αφορούν τα στελέχη της ΕΥΔ στόχο έχουν να συγκεντρώσουν πιο εμπειρική και κριτική πληροφορία σε σχέση με την συνεργασία των στελεχών με τους Δικαιούχους, καθώς και την ανάδραση των Δικαιούχων στις απαιτήσεις της ΕΥΔ και του ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ορθή και ομαλή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Τα ερωτηματολόγια τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τους Δικαιούχους, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να περιέχουν πληροφορία σχετικά με την διαχειριστική και επιχειρησιακή επάρκεια των δικαιούχων σύμφωνα με το ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, δίνοντας όμως και ιδιαίτερη έμφαση και στα συγχρηματοδοτούμενα έργα που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο κάθε φορέας στις δύο τελευταίες Προγραμματικές περιόδους, και που δεν αφορούν μόνο το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Εξάλλου, ο παράγοντας κινδύνου «Αριθμός έργων του φορέα στο πρόγραμμα», αποτελεί κομμάτι του υποσυστήματος αποτίμησης κινδύνων έργων, καθώς τα στοιχεία είναι δυνατό να εξαχθούν από τις τυποποιημένες αναφορές του ΟΠΣ.

Η μορφή των ερωτηματολογίων που στάλθηκαν προς συμπλήρωση στα στελέχη της ΕΥΔ και στους δικαιούχους του προγράμματος, φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος (Πίνακες Ι.1 & Ι.2).

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι λεκτικές τιμές των βαρυτήτων για τους παράγοντες κινδύνου των φορέων υλοποίησης:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Είδος Δικαιούχου	Μέση Τιμή
Οργανωτική Δομή Φορέα	Χαμηλή Τιμή
Εγχειρίδιο Διαχείρισης - Υλοποίησης Πράξεων / Έργων	Μέση Τιμή
Πιστοποίηση επάρκειας φορέα	Μέση Τιμή
Επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό	Χαμηλή Τιμή
Επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό	Μέση Τιμή
Εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση Πράξεων / Έργων	Μέση Τιμή
Επάρκεια εξοπλισμού και πόρων φορέα υλοποίησης	Χαμηλή Τιμή
Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας φορέα και διασφάλιση ποιότητας εργασίας	Χαμηλή Τιμή
Έλεγχος Πράξεων / Έργων	Μέση Τιμή
Αριθμός συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί από τον Φ.Υ	Μέση Τιμή
Μέσος προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενων	Χαμηλή Τιμή

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
πράξεων που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο δικαιούχος	
Αριθμός έργων Δικαιούχου που είναι ενταγμένα στο Ε.Π. ΥΠΕΠΕΡΑΑ	Μέση Τιμή
Απόκριση - ετοιμότητα δικαιούχου στις απαιτήσεις της Δ.Α. - αριθμός αναγνωρισθέντων προβλημάτων	Υψηλή Τιμή

Πίνακας 3.3: Λεκτικές τιμές βαρυτήτων παραγόντων κινδύνου φορέων υλοποίησης

Οι βαρύτητες των παραγόντων κινδύνου για τους φορείς υλοποίησης στην φάση του υπολογισμού του κινδύνου που εισάγει ο φορέας υλοποίησης θα παίρνουν αριθμητικές τιμές:

- Χαμηλή Τιμή: 1
- Μέτρια Τιμή: 3
- Υψηλή Τιμή: 5

3.2 Ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων και εξαγόμενα στοιχεία μεθοδολογίας αποτίμησης κινδύνου των Δικαιούχων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Τα δεδομένα και στοιχεία αναφοράς για το υποσύστημα αποτίμησης της επικινδυνότητας των Δικαιούχων του προγράμματος, αποτελούνται από:

- Στοιχεία και αναφορές του ΟΠΣ,
- Διαθέσιμα στοιχεία από επίσημους ιστότοπους του δημοσίου (π.χ. Διαύγεια)
- Την επεξεργασία και αποδελτίωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από τους δικαιούχους.
- Την επεξεργασία και αποδελτίωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από τα στελέχη της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Αναλυτικότερα, η μεθοδολογία ανάλυσης, διερεύνησης και επεξεργασίας των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των παραγόντων κινδύνου του υποσυστήματος αποτίμησης επικινδυνότητας των δικαιούχων, πραγματοποιήθηκε ως εξής:

i. Από την επεξεργασία των δεδομένων του ΟΠΣ, υπολογίστηκαν οι τιμές δύο παραγόντων επικινδυνότητας, των παραγόντων:

- «Είδος Δικαιούχου»
- «Αριθμός έργων Δικαιούχου που είναι ενταγμένα στο Ε.Π. ΥΠΕΠΕΡΑΑ»

- ii. Από την διερεύνηση στοιχείων σχετικά τους δικαιούχους σε επίσημους ιστότοπους, ο Σύμβουλος κατόρθωσε να εξάγει από την Διαύγεια τα καταστατικά σύστασης και τους οργανισμούς λειτουργίας, κατά περίπτωση, των δικαιούχων, από όπου υπολογίστηκε η τιμή του παράγοντα επικινδυνότητας «Οργανωτική Δομή Φορέα». Για όσους από τους φορείς δεν απέστειλαν την σχετική πληροφορία, κατέστη δυνατό η συγκεκριμένη πληροφορία να συλλεχθεί μέσα από το portal της Διαύγεια.
- iii. Από την επεξεργασία και αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι δικαιούχοι των έργων του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υπολογίστηκαν οι τιμές των κάτωθι παραγόντων κινδύνου:
- Εγχειρίδιο Διαχείρισης - Υλοποίησης Πράξεων / Έργων
 - Πιστοποίηση επάρκειας φορέα
 - Επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό
 - Επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό
 - Εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση Πράξεων / Έργων
 - Επάρκεια εξοπλισμού και πόρων φορέα υλοποίησης
 - Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας φορέα και διασφάλιση ποιότητας εργασίας
 - Έλεγχος Πράξεων / Έργων
 - Αριθμός συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί από τον Φ.Υ
 - Μέσος προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο δικαιούχος

Η κύρια φιλοσοφία του ερωτηματολογίου που στάλθηκαν στους Δικαιούχους των έργων (Πίνακας Ι.2 του Παραρτήματος Ι) είναι να αποτυπωθούν κατά κύριο λόγο τα αντικειμενικά στοιχεία και χαρακτηριστικά που τεκμηριώνουν την επάρκεια των δικαιούχων στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων αλλά και εμμέσως υποκειμενικά στοιχεία τα οποία δύνανται να καταδείξουν πόσο επαρκής αισθάνεται ο δικαιούχος σχετικά με την διαχειριστική του επάρκεια και την εμπειρία του.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κατηγοριοποίηση των παραγόντων κινδύνου που εξάγονται από τα πεδία του ερωτηματολογίου των δικαιούχων σε αντικειμενικούς και υποκειμενικούς, καθώς και η συσχέτισή τους με τα πεδία του ερωτηματολογίου:

Παράγοντας Κινδύνου	Κατηγοριοποίηση με βάση την υποκειμενικότητα	Πεδία ερωτηματολογίου δικαιούχων που αφορά
Εγχειρίδιο Διαχείρισης - Υλοποίησης Πράξεων / Έργων	Αντικειμενικό στοιχείο	Γ. Διαδικασίες Διαχείρισης και Παρακολούθησης Πράξεων
Πιστοποίηση επάρκειας φορέα	Αντικειμενικό στοιχείο	Δ. Πιστοποίηση επάρκειας φορέα από τρίτους φορείς
Επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό	Αντικειμενικό στοιχείο	Α. Οργανωτική Δομή Φορέα (Α.1 έως Α.4)
Επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό	Υποκειμενικό στοιχείο	Α.5 Αριθμός Στελεχών με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα
Εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση Πράξεων / Έργων	Αντικειμενικό στοιχείο	Ε. Εμπειρία Φορέα στην Υλοποίηση Πράξεων / Έργων & πίνακας συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά τις δύο τελευταίες προγραμματικές περιόδους
Επάρκεια εξοπλισμού και πόρων φορέα υλοποίησης	Υποκειμενικό στοιχείο	ΣΤ. Επάρκεια φορέα σε εξοπλισμό και πόρους
Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας φορέα και διασφάλιση ποιότητας εργασίας	Αντικειμενικό στοιχείο	Ζ. Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας φορέα και διασφάλιση ποιότητας εργασιών
Έλεγχος Πράξεων / Έργων	Αντικειμενικό στοιχείο	Η. Έλεγχος Πράξεων / Έργων
Αριθμός συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί από τον Φ.Υ	Αντικειμενικό στοιχείο	Πίνακας έργων / Πράξεων
Μέσος προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο δικαιούχος	Αντικειμενικό στοιχείο	Πίνακας έργων / Πράξεων

Πίνακας 3.4: Παράγοντες κινδύνου δικαιούχων και αντιστοίχισή τους με τα πεδία των ερωτηματολογίου δικαιούχων

Από το σύνολο των 451 δικαιούχων του προγράμματος μόνο οι 79 (ποσοστό 17,52%) συμπλήρωσαν και απέστειλαν το ερωτηματολόγιο. Λόγω του χαμηλού ποσοστού στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, κρίθηκε απαραίτητο να οριστεί μια τιμή βάσης για τον κάθε παράγοντα κινδύνου που υπολογίζεται από τα στοιχεία του παρόντος ερωτηματολογίου. Η τιμή βάσης ενός παράγοντα κινδύνου προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις δύο παραδοχές που ακολουθούν:

- Η μη απόκριση στο ερωτηματολόγιο από έναν φορέα κρίθηκε ότι θα πρέπει να δώσει μία ανεβασμένη επικινδυνότητας βαθμολογία για τον φορέα στους παράγοντες κινδύνου που αφορά το ερωτηματολόγιο.
- Η αυξημένη επικινδυνότητα της τιμής βάσης δεν θα πρέπει να ανήκει στην υψηλότερη κατάταξη, αλλά σε ενδιάμεσες κατατάξεις.

Έτσι η τιμή βάσης, σε λεκτικές τιμές, για κάθε παράγοντα επικινδυνότητας για τους δικαιούχους που δεν απάντησαν στα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκε ως εξής:

Παράγοντας Κινδύνου	Τιμή βάσης	Τεκμηρίωση
Εγχειρίδιο Διαχείρισης - Υλοποίησης Πράξεων / Έργων	Υψηλή	Το συγκεκριμένο στοιχείο μπορούσε να συλλεχθεί μόνο από τα ερωτηματολόγια και η μη απάντηση συνιστά υψηλό βαθμού κινδύνου.
Πιστοποίηση επάρκειας φορέα	Υψηλή	Το συγκεκριμένο στοιχείο μπορούσε να συλλεχθεί μόνο από τα ερωτηματολόγια και η μη απάντηση συνιστά υψηλό βαθμού κινδύνου.
Επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό	Μέση	Από τα καταστατικά και τους οργανισμούς των δικαιούχων που συγκεντρώθηκαν από τη Διαύγεια, ο σύμβουλος έχει μία εικόνα σχετικά με την επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό. Η μη απάντηση των ερωτηματολογίων, ωστόσο, δεν μας δίνει εικόνα για την σημερινή στελέωση των δικαιούχων.
Επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό	Υψηλή	Η υποκειμενική προσέγγιση ως προς το εξειδικευμένο προσωπικό του δικαιούχου σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι μία πληροφορία που, στην παρούσα σύμβαση, μόνο από την απάντηση των ερωτηματολογίων θα μπορούσε να προέλθει.
Εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση Πράξεων / Έργων	Υψηλή	Στην εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση έργων η τιμή βάσης του παράγοντα κινδύνου κρίνεται υψηλή, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για το πλήθος των φορέων να συλλεχθούν με άλλον τρόπο πλην του ερωτηματολογίου ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με την εμπειρία ενός φορέα σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Επάρκεια εξοπλισμού και πόρων φορέα υλοποίησης	Μέση	Η τιμή βάσης του συγκεκριμένου παράγοντα επικινδυνότητας είναι η μέση, καθώς δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός

Παράγοντας Κινδύνου	Τιμή βάσης	Τεκμηρίωση
Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας φορέα και διασφάλιση ποιότητας εργασίας	Μέση	Η ύπαρξη ή μη συστήματος εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας φορέα κρίνεται με τιμή βάσης μέσης επικινδυνότητας, καθώς οι φορείς ανήκουν στην κεντρική, αποκεντρωμένη και γενική κυβέρνηση, οπότε υπάρχει ένα σαφές θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους.
Έλεγχος Πράξεων / Έργων	Μέση	Μέσης επικινδυνότητας η τιμή βάσης του παράγοντα κινδύνου, καθώς ο έλεγχος των έργων πραγματοποιείται και από εξωτερικούς προς τον φορέα ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. Διαχειριστική Αρχή, ΑΔΕΛ κλπ.)
Αριθμός συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί από τον Φ.Υ	Μέση	Στην εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση έργων δεν κρίνεται τόσο υψηλής επικινδυνότητας, καθώς η τιμή του παράγοντα σταθμίζεται μερικώς και από τον αντικειμενικό παράγοντα κινδύνου «Αριθμός έργων Δικαιούχου που είναι ενταγμένα στο Ε.Π. ΥΠΕΠΕΡΑΑ», του οποίου η τιμή υπολογίζεται από τα στοιχεία του ΟΠΣ.
Μέσος προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο δικαιούχος	Υψηλή	Στον συγκεκριμένο παράγοντα η τιμή βάσης κρίνεται υψηλή, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για το πλήθος των φορέων να συλλεχθούν με άλλον τρόπο πλην του ερωτηματολογίου ποσοτικά στοιχεία σε σχέση με τον προϋπολογισμό των συγχρηματοδοτούμενων έργων που έχει υλοποιήσει στο παρελθόν ο φορέας.

Πίνακας 3.5: Τιμές βάσης παραγόντων κινδύνου που προκύπτουν από τη μη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων των δικαιούχων

- iv. Από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν τα στελέχη της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υπολογίζεται η τιμή του σημαντικού παράγοντα κινδύνου διασύνδεσης «Απόκριση - ετοιμότητα δικαιούχου στις απαιτήσεις της Δ.Α. - αριθμός αναγνωρισθέντων προβλημάτων».

Οι παράγοντες κινδύνου διασύνδεσης στα συστήματα αποτίμησης και διαχείρισης κινδύνων είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για την ορθή και ομαλή λειτουργία των συστημάτων, καθώς καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση με έναν αντικειμενικό και δομημένο τρόπο των απόψεων των στελεχών διαχείρισης των έργων σχετικά με τους αναγνωρισθέντες κινδύνους. Οι απόψεις αυτές βέβαια είναι πολύ πιθανό να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από στέλεχος σε στέλεχος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον υποκειμενικό παράγοντα. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους για τους

οποίους η ανάλυση παραγόντων κινδύνων δεν βασίζεται αποκλειστικά στους παράγοντες διασύνδεσης, μιας και με αυτό τον τρόπο θα χανόταν σε μεγάλο βαθμό το κοινό μέτρο σύγκρισης και η δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων συμπερασμάτων. Παρ' όλα αυτά όμως, οι παράγοντες αυτοί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό δομικό συστατικό της μεθοδολογίας, καθώς επιτρέπουν την εξέταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δικαιούχων, αναφορικά με το παρόν υποσύστημα.

Ο παράγοντας κινδύνου διασύνδεσης «Απόκριση - ετοιμότητα δικαιούχου στις απαιτήσεις της Δ.Α. - αριθμός αναγνωρισθέντων προβλημάτων» προκύπτει, κατά κύριο λόγο από την αποδελτίωση και την επεξεργασία των στοιχείων που αποτύπωσαν τα στελέχη της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στα ερωτηματολόγια η δομή των οποίων φαίνεται στον Πίνακα Ι.1 του Παραρτήματος Ι.

Η δομή του ερωτηματολογίου είναι απλή και λιτή, γρήγορη στην συμπλήρωση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα σχολιασμού της απάντησης από τα στελέχη της ΕΥΔ. Η πρώτη ένδειξη για τους δικαιούχους δίνεται μέσω της απάντησης σχετικά με το πόσο ανταποκρίνονται πλήρως και επαρκώς οι δικαιούχοι στις απαιτήσεις των χειριστών από την πλευρά της διαχειριστικής, με κατηγοριοποίηση «Άμεση απόκριση», «Καθυστέρηση μέσου βαθμού» και «Χαμηλή απόκριση / καθόλου απόκριση».

Συγκεντρώθηκαν 692 ερωτηματολόγια από τα στελέχη της ΕΥΔ, αλλά και από στελέχη διαχειριστικών αρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (36 στο σύνολο). Συμμετείχε η συντριπτική πλειοψηφία του στελεχιακού δυναμικού της διαχειριστικής, και από τους δύο υποτομείς, από όλες τις μονάδες και από όλες τις βαθμίδες.

Για το 68% περίπου του πλήθους των φορέων, καταγράφηκε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα (απαντήθηκαν περισσότερα από ένα ερωτηματολόγια ανά φορέα) καθώς συγκεντρώθηκε πληροφορία από στελέχη διαφορετικών μονάδων της ΕΥΔ, αλλά και από τους δύο διακριτούς υποτομείς του προγράμματος.

Η κατηγοριοποίηση με βάση την επιλογή του εκάστωτε στελέχους σχετικά με την απόκριση του δικαιούχου στις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής παίρνει μία τιμή ανάλογα με την απάντηση του στελέχους. Έτσι, για τις απαντήσεις των στελεχών για «Άμεση απόκριση», ο βαθμός που παίρνει ο δικαιούχος είναι 0, για την απάντηση «Καθυστέρηση μέσου βαθμού» παίρνει 1 βαθμό, ενώ για «Χαμηλή απόκριση / καθόλου απόκριση» ο βαθμός που παίρνει ο δικαιούχος από το συγκεκριμένο στέλεχος είναι 2. Σε περίπτωση που η κατάταξη συνοδεύεται και από σχόλια του στελέχους, η ανάλυση προχωράει και στα σχόλια. Έτσι, σε

περίπτωση που στα σχόλια αναφέρεται ένα σημείο αρνητικής αιτιολόγησης της καθυστέρησης ή της μη απόκρισης του φορέα ο αρνητικός βαθμός 1 και 2 παραμένει. Σε περίπτωση όμως που αναφέρονται δύο ή και τρεις αιτίες από το στέλεχος, ο βαθμός ανεβαίνει κατά 1 βαθμό. Για παράδειγμα, στην απάντηση στελέχους για φορέα, όπου έχει επιλεχθεί από το στέλεχος για τον φορέα «Καθυστερήση μέσου βαθμού» χωρίς αιτιολόγηση, ο βαθμός παραμένει 1, για την ίδια επιλογή και αιτιολόγηση μόνο με μία αιτία (π.χ. έλλειψη προσωπικού στον δικαιούχο), ενώ για αιτιολόγηση από δύο αιτίες και πάνω (π.χ. έλλειψη προσωπικού στον δικαιούχο και έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων) ο βαθμός ανεβαίνει κατά μία μονάδα και πάει στο 2.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα στελέχη της ΕΥΔ, στο σύνολό τους δεν έχουν αιτιολόγηση για την απάντηση «Άμεση απόκριση». Για την απάντηση «Καθυστερήση μέσου βαθμού» υπάρχει αιτιολόγηση στα 165 από τα 295 ερωτηματολόγια (ποσοστό 56%) με αυτήν την απάντηση, ενώ για την απάντηση «Χαμηλή απόκριση / καθόλου απόκριση» έχουν αιτιολόγηση τα 56 από τα 80 ερωτηματολόγια (ποσοστό 69%) με αυτή την απάντηση.

Στην μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ερωτηματολόγια των στελεχών όσο και τα ερωτηματολόγια των δικαιούχων. Αρχικός στόχος ήταν να συνεισφέρουν ισοδύναμα στην συνολική επικινδυνότητα των Δικαιούχων, καθώς όμως:

- η συμμετοχή των Δικαιούχων στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν σε χαμηλό ποσοστό και,
- η ανάδραση με τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα στελέχη της ΕΥΔ ήταν πλήρης, με αποτέλεσμα για τους περισσότερους δικαιούχους να έχουμε καταγεγραμμένη άποψη από περισσότερα του ενός από τα στελέχη της ΕΥΔ,

αποφασίστηκε η συμμετοχή στην τελική εξίσωση της άποψης των στελεχών της ΕΥΔ να φέρει βαρύτητα στην συνολική επικινδυνότητα του κάθε δικαιούχου 70% ενώ η ανάδραση του Δικαιούχου να φέρει βαρύτητα 30%.


Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τόσο από τους Δικαιούχους όσο και από τα στελέχη της ΕΥΔ, αποτελούν τμήμα του παρόντος παραδοτέου και θα δοθούν από τον Σύμβουλο σε ηλεκτρονική μορφή (CD) για την δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχείων που παρουσιάζονται στο παρόν πόνημα.

3.3 Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου των Δικαιούχων του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Η διερεύνηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υποσυστήματος αποτίμησης κινδύνου για τους δικαιούχους των έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανέδειξε τα εξής:

3.3.1 Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Δικαιούχων του Τομέα Μεταφορών του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, η κατάταξη της επικινδυνότητας των δικαιούχων στον Τομέα Μεταφορών, φαίνεται στο Σχήμα 3.3 που ακολουθεί:

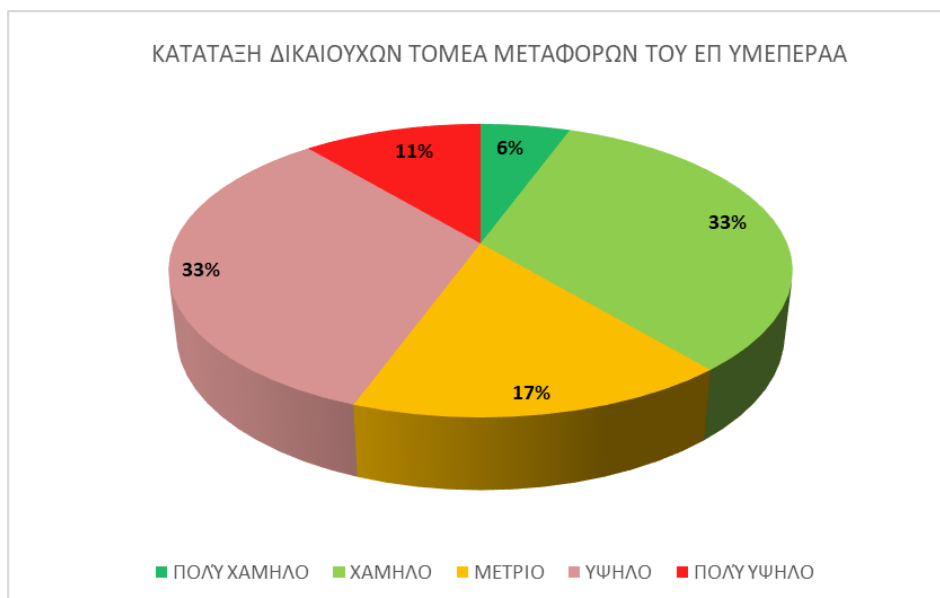

Σχήμα 3.3: Κατάταξη Δικαιούχων Τομέα Μεταφορών

Η κατάταξη των Δικαιούχων του Τομέα Μεταφορών του Προγράμματος, φαίνεται στον Πίνακα Ι.3 του Παραρτήματος Ι του παρόντος παραδοτέου.


Με βάση τον συγκεκριμένο πίνακα, ο Δικαιούχος με την χαμηλότερη βαθμολογία ως προς την επικινδυνότητά του με βάση το σύστημα που αναπτύχθηκε είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με κατάταξη «Πολύ Χαμηλή» ως προς την επικινδυνότητα. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι ένας Δικαιούχος που πήρε πολύ καλή βαθμολογία σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου που υπολογίζονται από τα ερωτηματολόγια των στελεχών της ΕΥΔ. Συνολικά συμπληρώθηκαν 5 ερωτηματολόγια για τον φορέα εκ των οποίων τα 4 είχαν ως απάντηση την «άμεση απόκριση» του φορέα στις απαιτήσεις της ΕΥΔ, ενώ μόλις 1 είχε ως ένδειξη «καθυστέρηση μέσου βαθμού». Επίσης, ο φορέας επέστρεψε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο για τους φορείς, οπότε οι τιμές των παραγόντων κινδύνου που

συμπληρώθηκαν από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο πήραν τεκμηριωμένη βαθμολόγηση σε όλα τα σημεία τους. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα του συστήματος είναι λογικό καθώς η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι ένας φορέας με μεγάλη εμπειρία, που υλοποιεί με επιτυχία μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών πάνω από 20 χρόνια.

Ο Δικαιούχος του Τομέα Μεταφορών με κατάταξη ως προς την επικινδυνότητα «Πολύ Υψηλή» είναι οι ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Για τον συγκεκριμένο φορέα συμπληρώθηκαν δύο ερωτηματολόγια από τα στελέχη της ΕΥΔ, με πολύ υψηλή βαθμολογία ως προς την επικινδυνότητα: το ένα έχει χαρακτηρισμό «χαμηλή απόκριση / καθόλου απόκριση» και το άλλο «καθυστέρηση μέσου βαθμού». Επίσης, ο φορέας δεν έστειλε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, ενώ από το ΟΠΣ φαίνεται να υλοποιεί μόνο μία Πράξη στο πρόγραμμα με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και προϋπολογισμό 1.860.000,00 €.

Ενδιαφέρον προκαλεί η περίπτωση της κατάταξης της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, πήρε από το σύστημα υψηλή κατάταξη σε σχέση με την επικινδυνότητα ως Δικαιούχος φορέας. Ερωτηματολόγια σχετικά με την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ συμπλήρωσαν 16 στελέχη της ΕΥΔ. Από τα 16 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, σε 2 τα στελέχη χαρακτήρισαν την απόκριση του φορέα ως «άμεση», 11 την χαρακτήρισαν «καθυστέρηση μέσου βαθμού» και 3 την χαρακτήρισαν «χαμηλή απόκριση / καθόλου απόκριση». Παρόλο που ο φορέας συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο και παρόλο που έχει ιστορικότητα μεγάλων έργων, ο χαρακτηρισμός της επικινδυνότητάς του από το σύστημα είναι «Υψηλή», καθώς υπάρχει μεγάλη ομοφωνία σχετικά με την συμπεριφορά του στα στελέχη της ΕΥΔ.

Οι Δικαιούχοι των έργων του Τομέα Μεταφορών είναι είτε φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης είτε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Η κατάταξη με βάση το είδος του Δικαιούχου φαίνεται στο Σχήμα 3.4 που ακολουθεί:

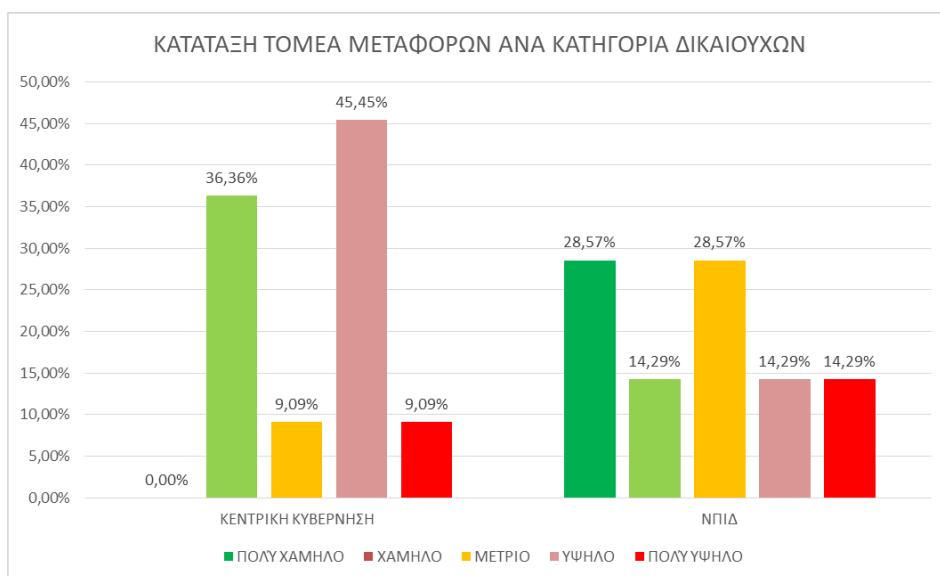


Σχήμα 3.4: Κατάταξη Δικαιούχων Τομέα Μεταφορών ανά κατηγορία Δικαιούχων

3.3.2 Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Οι Δικαιούχοι των έργων του Τομέα Περιβάλλοντος του προγράμματος είναι και πολλοί στον αριθμό (433) αλλά και παρουσιάζουν μεγαλύτερη διασπορά σχετικά με τη νομική μορφή και το είδος του Δικαιούχου.

Η κατάταξη των δικαιούχου του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ φαίνονται στο Σχήμα 3.5 που ακολουθεί:

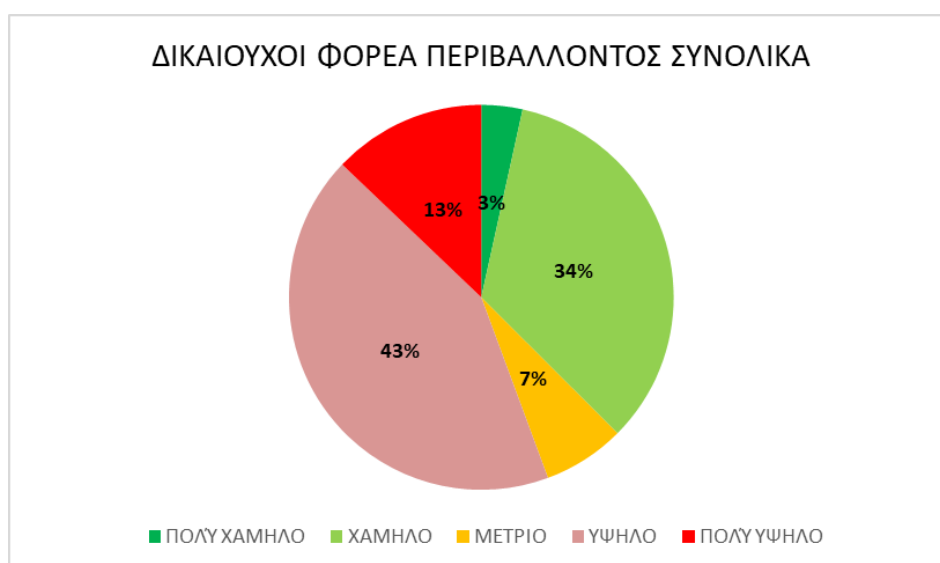


Σχήμα 3.5: Κατάταξη Δικαιούχων Τομέα Περιβάλλοντος συνολικά

Λόγω του πλήθους και τις ποικιλομορφίας των Δικαιούχων των έργων του Τομέα Περιβάλλοντος, αποφασίστηκε η ανάλυση να γίνει ανά είδος δικαιούχου. Στην συνέχεια φαίνονται οι κατατάξεις της επικινδυνότητας των Δικαιούχων με βάση τη νομική τους μορφή:

- **Δήμοι**

Οι Δήμοι αποτελούν μία από τις πολυπληθέστερες κατηγορίες Δικαιούχων των έργων του Τομέα Περιβάλλοντος. Στο Σχήμα 3.6 που ακολουθεί, φαίνεται η κατάταξη της επικινδυνότητας για τους Δήμους:

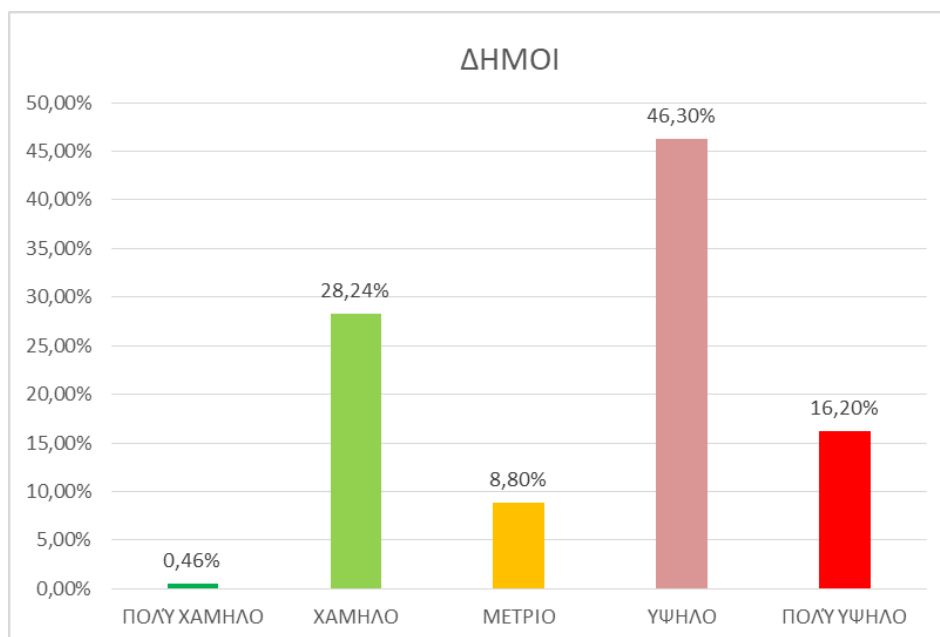

Σχήμα 3.6: Κατάταξη επικινδυνότητας για τους Δήμους.


Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» είναι για τους Δήμους 62,5%, ενώ το αντίστοιχο για τις κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι 28,9%. Φαίνεται λοιπόν, από την παρούσα ανάλυση ότι οι Δήμοι, ως κατηγορία φορέων, εμφανίζουν την τάση να έχουν σχετικά υψηλού βαθμού επικινδυνότητα συνολικά για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ. Κάτι τέτοιο, με βάση την ανάλυση των ερωτηματολογίων των στελεχών της ΕΥΔ και των δικαιούχων και την εμπειρία, οφείλεται:

- Στην μη εφικτή ενσωμάτωση των διαδικασιών του ΣΔΕ ΕΣΠΑ στις τακτικές αρμοδιότητες των Δήμων
- Στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
- Στην προτεραιοποίηση των έργων από τους Δήμους με βάση την πολιτική βούληση από τους Δημάρχους.

Ο πίνακας κατάταξης των Δήμων με βάση την επικινδυνότητά τους, φαίνεται στον Πίνακα Ι.4 του Παραρτήματος Ι.

- **ΔΕΥΑ – Δημοτικές Εταιρείες Ύδρευσης Αποχέτευσης**

Στο Σχήμα 3.7 που ακολουθεί, φαίνεται η κατάταξη με βάση την επικινδυνότητα για τις Δημοτικές Εταιρείες Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ):

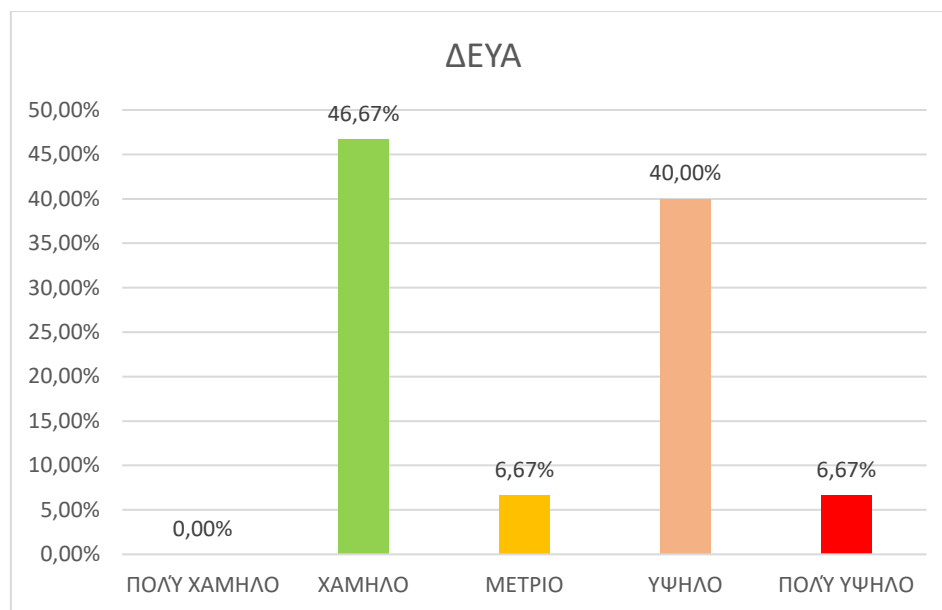

Σχήμα 3.6: Κατάταξη επικινδυνότητας για τις ΔΕΥΑ.


Οι Δημοτικές Εταιρείες Υδρεύσεις Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) παρουσιάζουν καλύτερη συνολική τάση σε σχέση με τους Δήμους. Το ποσοστό πολύ χαμηλής και χαμηλής επικινδυνότητας είναι ακριβώς ίσο με το ποσοστό των φορέων που παρουσιάζουν υψηλή και πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Βέβαια, πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι παρουσιάζεται ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (6,67 %) στην κατηγορία επικινδυνότητας «Πολύ Υψηλή» και θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις συγκεκριμένες ΔΕΥΑ.

Η επεξεργασία και αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα στελέχη της ΕΥΔ έδειξε ότι η υψηλή επικινδυνότητα στις ΔΕΥΑ οφείλεται στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στον Πίνακα Ι.5 του Παραρτήματος Ι , φαίνεται αναλυτικά η κατάταξη των ΔΕΥΑ.

- **Νοσοκομεία**

Στο Σχήμα 3.7 φαίνεται η κατάταξη των νοσοκομείων στις κλάσεις επικινδυνότητας:

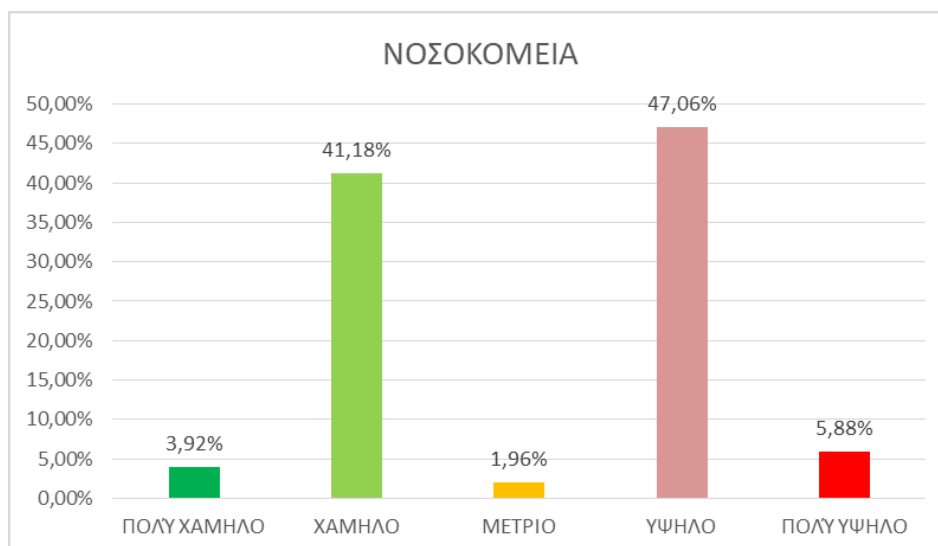

Σχήμα 3.7: Κατάταξη Νοσοκομείων με βάση την επικινδυνότητα


Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» είναι για τα Νοσοκομεία περίπου στο 53%, ενώ το αντίστοιχο για τις κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι 45%. Για τα Νοσοκομεία, η διαφορά των δύο ποσοστών είναι σημαντικά μικρότερη από ότι στους Δήμους. Παρόλα αυτά, από την παρούσα ανάλυση φαίνεται ότι και τα Νοσοκομεία, ως κατηγορία φορέων, παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας συνολικά για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ.

Η επεξεργασία και αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα στελέχη της ΕΥΔ έδειξαν ότι η έλλειψη εμπειρίας στα Νοσοκομεία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία και καθυστερήσεις.

Στον Πίνακα Ι.6 του Παραρτήματος Ι, φαίνεται αναλυτικά η κατάταξη των Νοσοκομείων.

- **Πανεπιστήμια και ΕΛΚΕ**

Στο Σχήμα 3.8 που ακολουθεί, φαίνεται η κατάταξη της επικινδυνότητας για τα Πανεπιστήμια και τους ΕΛΚΕ:

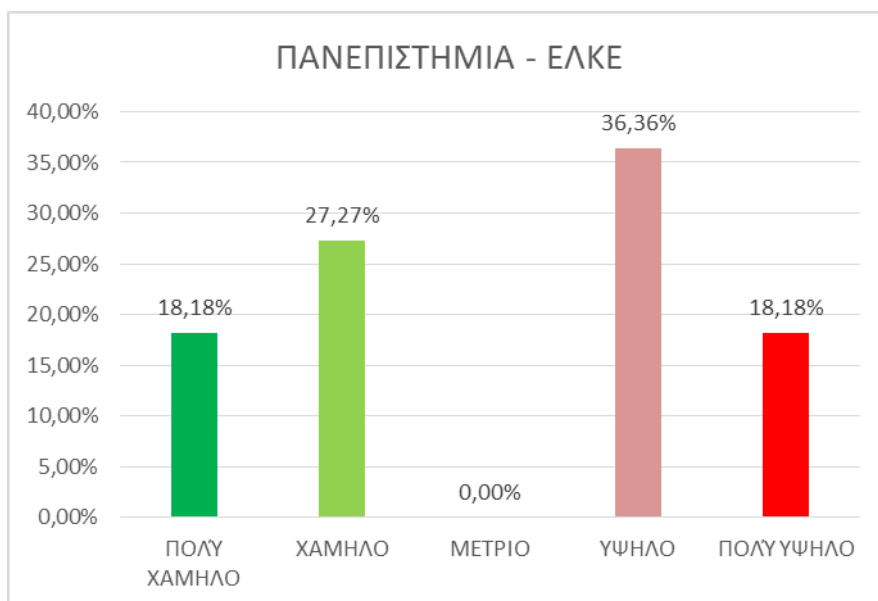

Σχήμα 3.8: Κατάταξη με βάση την επικινδυνότητα για Πανεπιστήμια και ΕΛΚΕ


Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» είναι για τα πανεπιστήμια και τους ΕΛΚΕ σε ποσοστό περίπου 54%, ενώ το αντίστοιχο για τις κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι περίπου 45%. Και εδώ παρουσιάζεται αρκετά μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας συνολικά για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ.

Για τα Πανεπιστήμια, τα στελέχη της ΕΥΔ δεν έχουν δώσει επαρκή τεκμηρίωση με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια τάση προς υψηλή επικινδυνότητα.

Στον Πίνακα Ι.7 του Παραρτήματος Ι φαίνεται η συνολική κατάταξη για τα Πανεπιστήμια.

- ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ**

Στο Σχήμα 3.9 φαίνεται η κατάταξη των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών με βάση την επικινδυνότητά τους;

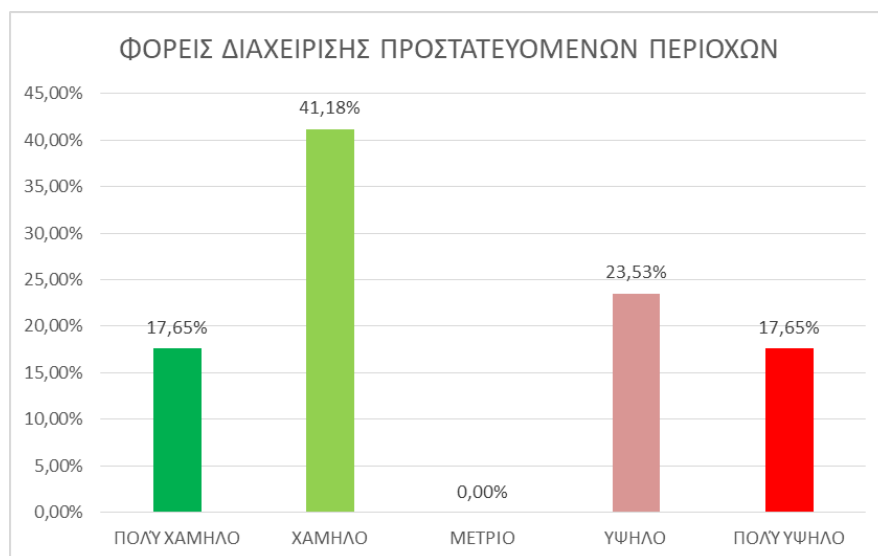

Σχήμα 3.9: Κατάταξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» είναι περίπου 42% για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών ενώ το αντίστοιχο για τις κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι περίπου 58%. Οπότε, οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ως υποκατηγορία σημαντική επικινδυνότητα.

Η επεξεργασία και αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα στελέχη της ΕΥΔ έδειξαν ότι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών παρουσιάζουν τάση επικινδυνότητας εξαιτίας της υποστελέχωσής τους κατά κύριο λόγο.

Στον Πίνακα Ι.8 του Παραρτήματος Ι φαίνεται η συνολική κατάταξη για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

- **Περιφέρειες**

Στο Σχήμα 3.10 που ακολουθεί φαίνεται η κατάταξη τις επικινδυνότητας για τις Περιφέρειες.

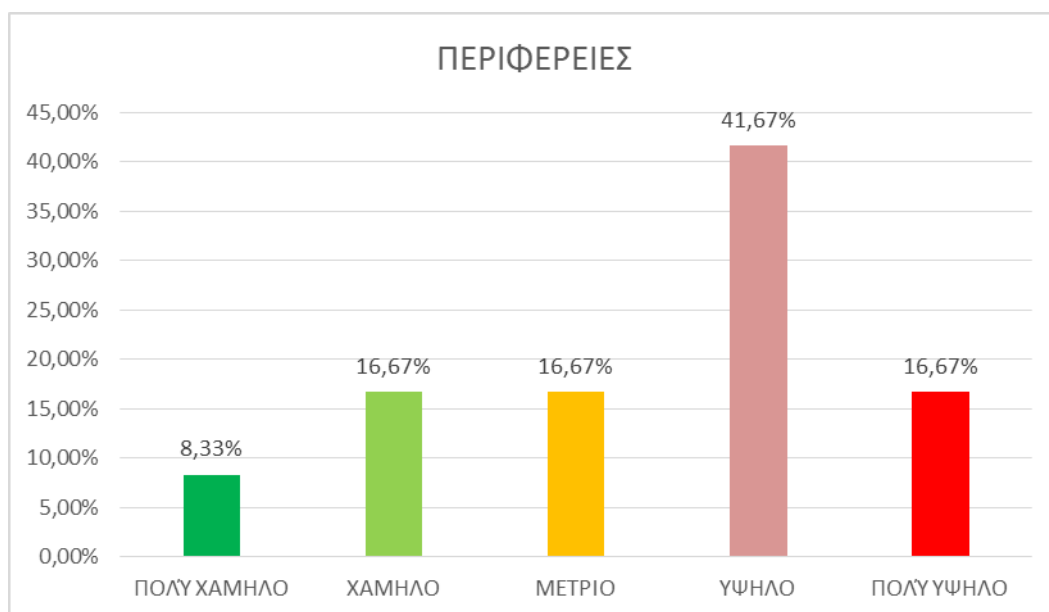**Σχήμα 3.10: Κατάταξη επικινδυνότητας για τις Περιφέρειες**

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» για τις Περιφέρειες είναι γύρω στο 60% το αντίστοιχο για τις κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι γύρω στο 25%.


Η τάση της επικινδυνότητας των φορέων είναι υψηλή. Η εικόνα αυτή βασίστηκε περισσότερο στην εμπειρία των στελεχών της ΕΥΔ, σε συνδυασμό με την πληροφορία που αποτυπώθηκε στα ερωτηματολόγια.

Στον Πίνακα Ι.9 του Παραρτήματος Ι φαίνεται η συνολική κατάταξη για τις Περιφέρειες.

.....

- **ΦΟΔΣΑ**

Στο Σχήμα 3.11 που ακολουθεί φαίνεται η κατάταξη των ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων):

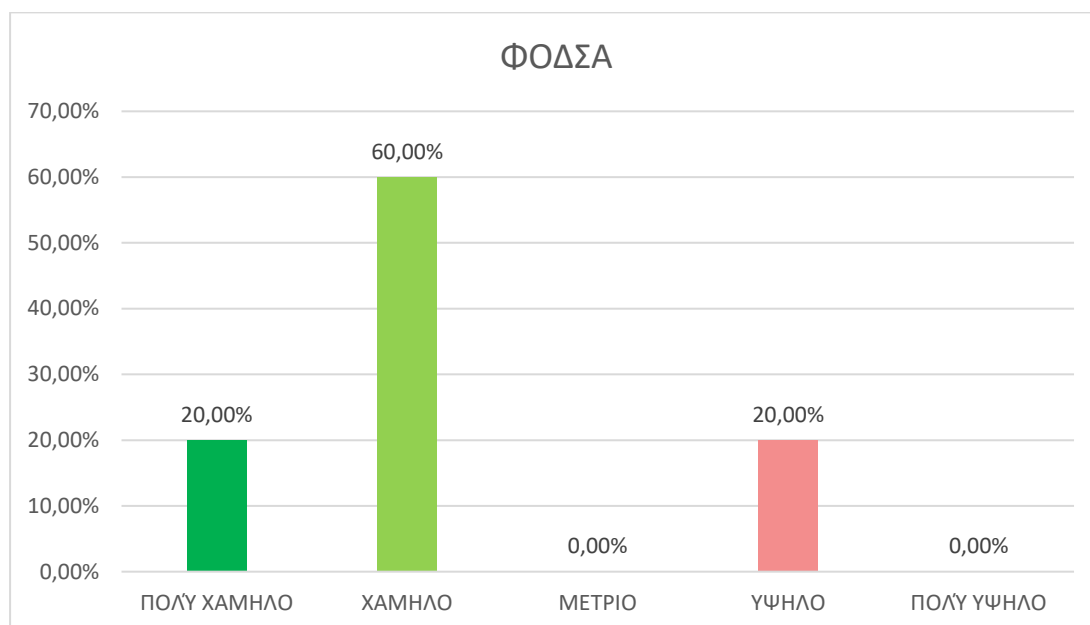

Σχήμα 3.11: Κατάταξη επικινδυνότητας για τους ΦΟΔΣΑ


Το σύστημα για την συγκεκριμένη υποκατηγορία φορέων ανέδειξε χαμηλού βαθμού επικινδυνότητας συνολικά. Το 80% των φορέων κυμαίνεται στις κλάσεις πολύ χαμηλής και χαμηλής επικινδυνότητας ενώ το 20% στην κλάση υψηλής επικινδυνότητας.

Το γεγονός αυτό στηρίζεται στο ότι οι φορείς στο σύνολό τους κατατάχθηκαν σε άμεσης απόκρισης από όλα τα στελέχη της ΕΥΔ με τα οποία συνεργάζονται.

Στον Πίνακα Ι.10 του Παραρτήματος Ι φαίνεται η συνολική κατάταξη για τους ΦΟΔΣΑ.

- **Δημόσιοι Φορείς Κεντρικής Διοίκησης**

Στο Σχήμα 3.12 φαίνεται η κατάταξη βάσει της επικινδυνότητας για τους Δημόσιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που υλοποιούν έργα του Τομέα Περιβάλλοντος.

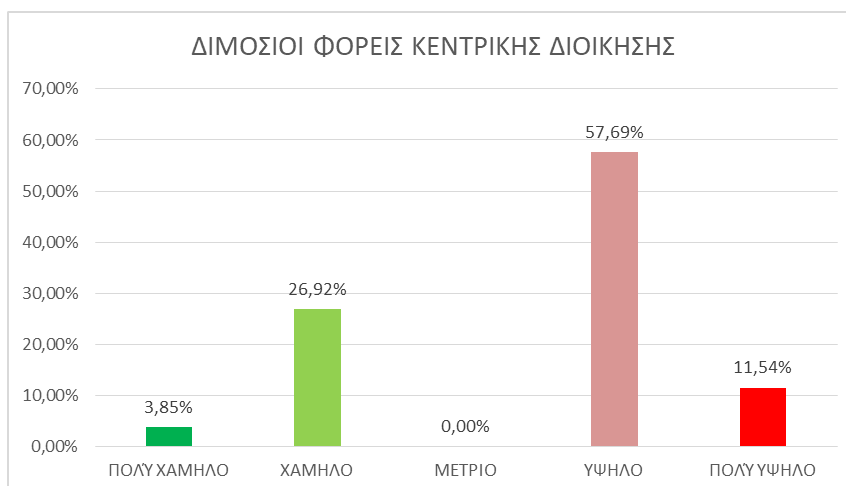

Σχήμα 3.12: Κατάταξη επικινδυνότητας για τους Δημόσιους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης του τομέα Περιβάλλοντος

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ότι συνολικά οι φορείς της Δημόσιας Κεντρικής Διοίκησης που υλοποιούν έργα του τομέα Περιβάλλοντος παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στο σύνολό τους. Συγκεκριμένα το ποσοστό στις κλάσεις «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» φτάνει αθροιστικά το 70% περίπου και είναι το υψηλότερο από όλες τις υποκατηγορίες του Τομέα Περιβάλλοντος.

Η επεξεργασία και αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα στελέχη της ΕΥΔ έδειξαν ότι οι Δημόσιοι φορείς της Κεντρικής διοίκησης παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα, γιατί:

- η αδιαφορία στην επίλυση θεμάτων, σε κάποιες περιπτώσεις
- η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών διευθύνσεων των φορέων
- μη εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Στον Πίνακα Ι.11 του Παραρτήματος Ι φαίνεται η συνολική κατάταξη για τους φορείς της Δημόσιας Κεντρικής Διοίκησης που υλοποιούν έργα του τομέα Περιβάλλοντος.

3.3.3 Συμπεράσματα

Για το σύνολο των δικαιούχων φορέων του προγράμματος, ασχέτως νομικής μορφής, μεγέθους ή αντικειμένου, η συνολική κατάταξη στις 5 (πέντε) κλάσεις κατηγοριοποίησης της επικινδυνότητας, από πολύ χαμηλής επικινδυνότητας φορέας έως πολύ υψηλής, φαίνεται στο Σχήμα 3.1 που ακολουθεί:




Σχήμα 3.1: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας δικαιούων

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το αθροιστικό ποσοστό των δικαιούων με κατάταξη της επικινδυνότητάς τους στις κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» είναι 38%, ενώ το αθροιστικό ποσοστό των κλάσεων «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» είναι 53%.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι από τους δικαιούους που εμφανίζουν πολύ χαμηλή επικινδυνότητα είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., της οποίας η νομική μορφή είναι ΝΠΙΔ, ο Δήμος Τρίπολης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ από τους φορείς που παρουσιάζουν πολύ υψηλή επικινδυνότητα είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), ο Δήμος Νέας Ζίχνης, ο Δήμος Κασσάνδρας κ.α.

Στο Σχήμα 3.2 που ακολουθεί φαίνεται διαγραμματικά η κατάταξη των δικαιούων ανά υποτομέα του Ε.Π., δηλαδή για τον υποτομέα των Μεταφορών και τον υποτομέα του Περιβάλλοντος:

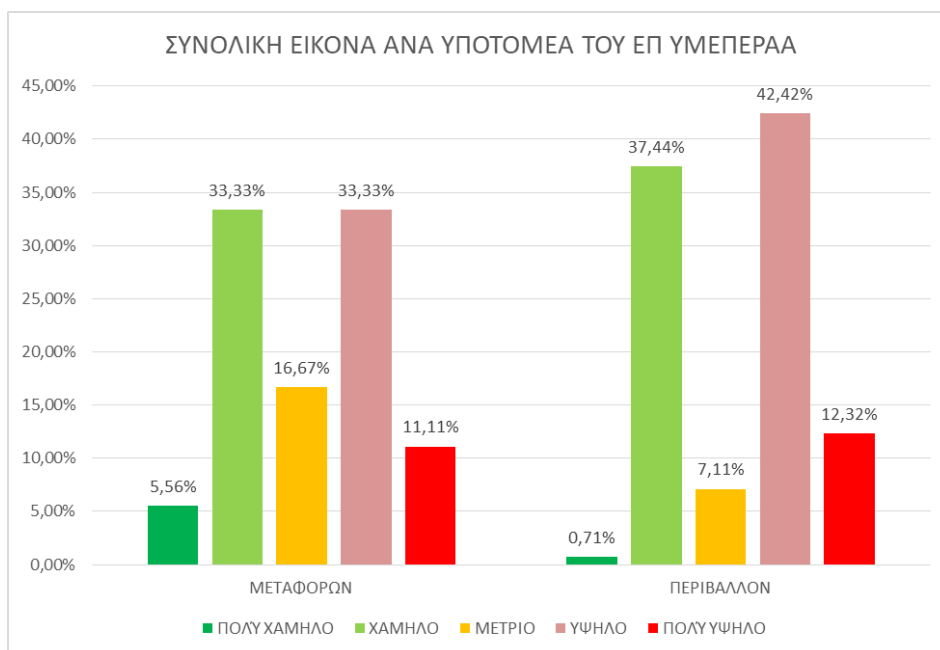

Σχήμα 3.2: Κατάταξη δικαιούχων ανά υποτομέα Μεταφορών και Περιβάλλοντος του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων των έργων για τον Τομέα Μεταφορών είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση τον αντίστοιχο αριθμό των δικαιούχων των έργων που ανήκουν στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι των έργων για τον Τομέα των μεταφορών είναι μόλις 18, ενώ οι δικαιούχοι των έργων για τον Τομέα του περιβάλλοντος είναι 433. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην φύση και στο αντικείμενο των έργων των δύο υποτομέων: ο Τομέας των Μεταφορών παρακολουθεί και διαχειρίζεται μεγάλα έργα υποδομών, ενώ ο Τομέας του Περιβάλλοντος έργα μικρότερης παρέμβασης, όπως αντιπλημμυρικά, έργα λυμάτων, ενεργειακών αναβαθμίσεων δημόσιων κτιρίων κλπ.

➤ **Συνολικά συμπεράσματα**

- Η πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων μας δείχνει ότι δεν επηρεάζει τόσο το είδος του φορέα την επικινδυνότητά του. Υπάρχει, δηλαδή αρκετή διασπορά των φορέων στις πέντε κλάσεις επικινδυνότητας.
- Στον τ. Μεταφορών στις κλάσεις «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» περιλαμβάνεται το 45% των φορέων του τομέα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον τ. Περιβάλλοντος ανέρχεται σε 55%. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η σύγκριση αυτή αφορά καθαρά στην κατάταξη των φορέων χωρίς να αντικατοπτρίζεται πλήρως η σημαντικότητα του αντικειμένου που υλοποιούν.
- Στον τ. Μεταφορών οι φορείς που διαχειρίζονται έργα μικρότερου Π/Υ εμφανίζουν μεγαλύτερη επισφάλεια.

- Αντίθετα στον τ. Περιβάλλοντος παρατηρείται μια πιο ομαλή κατανομή μεταξύ των διαφόρων μεγεθών.

4 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

4.1 Αποτίμηση κινδύνου των Ενταγμένων έργων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

4.1.1 Μεθοδολογία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Ενταγμένων έργων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Αφού αναγνωρίστηκαν οι παράγοντες κινδύνου των έργων και του προγράμματος στην προηγούμενη ενότητα, στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται ο τρόπος που προτείνεται να αναλυθούν οι παράγοντες κινδύνου με βάση τις τιμές που μπορούν να έχουν, δηλαδή να αποτιμηθεί το πεδίο ορισμού των τιμών τους. Η παρούσα ανάλυση και αποτίμηση των παραγόντων κινδύνου προκύπτει κατά κύριο λόγο με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και την εμπειρία του Συμβούλου στην διαχείριση έργων και προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας.

Τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η ανάλυση της αποτίμησης του συνολικού κινδύνου των έργων για το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι:

- Τα στοιχεία του ΟΠΣ
- Η τελευταία έκθεση της αναθεώρησης του Προγράμματος
- Τα στοιχεία του αρχείου των έργων του ΕΠ
- Την ανάλυση ρίσκου που είχε πραγματοποιηθεί για τα έργα Αστικών αποβλήτων από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Στο επιλεγμένο σύστημα, ακολουθείται διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των παραγόντων κινδύνου για τα ενταγμένα και τα προγραμματικά έργα, δημιουργώντας τις δύο ξεχωριστές ομάδες:

- Παράγοντες κινδύνου Ενταγμένων έργων
- Παράγοντες κινδύνου Προγραμματικών έργων

Η χρησιμότητα του διαχωρισμού τους έγκειται στη δημιουργία ξεχωριστού υποσυστήματος για τα Προγραμματικά έργα, αφού δεν δύναται να έχουμε την πλήρη εικόνα όσον αφορά τον αριθμό και το είδος των υποέργων για τα Προγραμματικά έργα, όπως και στοιχεία που αφορούν τους παράγοντες διαχείρισης που φαίνονται στον Πίνακα 4.1. Οι παράγοντες κινδύνου για τα προγραμματικά έργα παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα.

Όπως φαίνεται, επίσης στον πίνακα που ακολουθεί, ο συνολικός κίνδυνος που υπολογίστηκε για τους Δικαιούχους από το υποσύστημα αποτίμησης κινδύνου Δικαιούχων, υπεισέρχεται στο παρόν υποσύστημα υπολογισμού κινδύνου ενταγμένων έργων, στον παράγοντα κινδύνου «Παράγοντας κινδύνου Δικαιούχου». Ο παράγοντας κινδύνου «Μέγεθος έργου σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Δικαιούχου στο Πρόγραμμα», αποτελεί παράγοντα κινδύνου και του συστήματος των έργων καθώς αφορά στο έργο σε σχέση όμως με τον δικαιούχο και τα στοιχεία για τον υπολογισμό του παράγοντα εξάγονται από τις αναφορές ΟΠΣ.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ			ΑΝΑΛΥΣΗ		ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ	
			Αντικειμενική	Υποκειμενική	Διακριτές	Συνεχείς
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ	Εγγενείς	Φύση Έργου	X		X	
		Είδος Έργου	X		X	
		Είδος Υποέργων	X		X	
		Τεχνολογία	X		X	
		Αριθμός Υποέργων του Έργου	X			X
		Ιδιοκτησία Οικοπέδου Έργου	X		X	
	Παράγοντας Φορέα Υλοποίησης	Παράγοντας κινδύνου Δικαιούχου		X		X
		Μέγεθος έργου σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Δικαιούχου στο Πρόγραμμα	X			X
	Παράγοντες Διαχείρισης	Καθυστέρηση υποβολής δελτίων προόδου από τον Δικαιούχο	X			X
		Τροποποιήσεις αρχικού σχεδιασμού	X			X
		Αριθμός διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων, καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου	X			X
		Διαδικασίες δημοπράτησης	X		X	
		Καθυστερήσεις χρονοδιαγράμματος	X			X
		Αύξηση κόστους έργου	X			X
Παράγοντες Διασύνδεσης	Αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων		X		X	
	Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων		X		X	
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ		Προϋπολογισμός Έργου	X			X

Πίνακας 4.1: Παράγοντες κινδύνου έργων

Σύμφωνα με όλες τις προσεγγίσεις που εμπλέκουν ανάλυση παραγόντων κινδύνου (risk factor – RF) κάθε παράγοντας κινδύνου προκαλεί διαφορετική έκθεση σε κίνδυνο στα εξεταζόμενα έργα, ανάλογα με τις πιθανές τιμές / χαρακτηριστικά του κάθε παράγοντα κινδύνου (RF_i) που μπορεί να πάρει. Έτσι, στο πρώτο βήμα της προτεινόμενης προσέγγισης αξιολόγησης της επικινδυνότητας

των παραγόντων κινδύνου, καθορίζονται οι κανόνες που περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ των πιθανών τιμών / χαρακτηριστικών του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου RF_i για κάθε παράγοντα κινδύνου i και της προκαλούμενης έκθεσης σε κίνδυνο (Risk – R) R_i σε κάθε έργο.

Στην συνέχεια, στον Πίνακα 4.2 που ακολουθεί φαίνονται τα πεδία τιμών των παραγόντων κινδύνου έργων:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Φύση Έργου	Οδικό Σιδηροδρομικό Μετρό Αεροδρόμιο Λιμενικό Αντιπλημμυρικό Απορριμμάτων Λυμάτων Τηλεθέρμανση Υδρευση - αφαλάτωση	Πολύ Υψηλή
	Ασφάλεια μεταφορών Αστικά ΜΜΜ (πλην μετρο) Ενεργειακή αναβάθμιση Απορρίματα (πράσινα σημ./βιοαπόβλητα) Διαρροές Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες	Μέτρια
	Αστική αναζωογόνηση Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	Πολύ Χαμηλή
Είδος Έργου	Νέο	Πολύ Υψηλή
	Έργο Phasing	Πολύ Χαμηλή
Είδος Υποέργων	Τεχνικό έργο/ εργολαβία	Πολύ Υψηλή
	Μελέτη τεχνικών έργων Επιχορήγηση για εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα μέσω ΑΥΙΜ	Υψηλή
	Απαλλοτριωση - Αγορά εδαφικών εκτασεων Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελετής Προμηθειες	Μέτρια
	Αρχαιολογικές έρευνες/ εργασίες μέσω αυτεπιστασίας Επιχορήγηση για λειτουργία φορέα	Χαμηλή
	Εργασίες Ο.Κ.Ω.	Πολύ Χαμηλή
Τεχνολογία	Ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία	Πολύ Χαμηλή
	Νέα τεχνολογία	Πολύ Υψηλή
Αριθμός διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων, καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής	Εμπλοκή ενός μόνο φορέα	Πολύ Υψηλή
	Εμπλοκή δύο φορέων	Μέτρια
	Εμπλοκή τριών φορέων	Πολύ Χαμηλή
Διαδικασίες δημοπράτησης	Ανοιχτός Διαγωνισμός	Χαμηλή
	Συνοπτικός Διαγωνισμός	Μέτρια
	Με διαπραγμάτευση	Υψηλή
	Απ' ευθείας ανάθεση	Πολύ Υψηλή
Μέγεθος Έργου, σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Φ.Υ.	Π.Υ. έργου μεγαλύτερος από το 80% του μέσου Π.Υ. του Φορέα στο Πρόγραμμα	Πολύ Χαμηλή
	Π.Υ. έργου μεταξύ του 60% και του 80% του μέσου Π.Υ. του Φορέα στο Πρόγραμμα	Χαμηλή

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
	Π.Υ. έργου μεταξύ του 40% και του 60% του μέσου Π.Υ. του Φορέα στο Πρόγραμμα	Μέτρια
	Π.Υ. έργου μεταξύ του 20% και του 40% του μέσου Π.Υ. του Φορέα στο Πρόγραμμα	Υψηλή
	Π.Υ. έργου μικρότερος από το 20% του μέσου Π.Υ. του Φορέα στο Πρόγραμμα	Πολύ Υψηλή
Αριθμός Υποέργων του Έργου	Μέχρι 1 υποέργο	Πολύ Χαμηλή
	Από 2 έως 3 υποέργα	Χαμηλή
	Από 4 έως 6 υποέργα	Μέτρια
	Από 7 έως 20 υποέργα	Υψηλή
	Από 21 υποέργα και πάνω	Πολύ Υψηλή
Ιδιοκτησία Οικοπέδου Έργου	Δημόσια Δαπάνη Απαλλοτριώσεων πάνω από 5.000.000 €	Πολύ Υψηλή
	Δημόσια Δαπάνη Απαλλοτριώσεων από >3.000.000 έως 5.000.000 €	Υψηλή
	Δημόσια Δαπάνη Απαλλοτριώσεων από >2.000.000 έως 3.000.000 €	Μέτρια
	Δημόσια Δαπάνη Απαλλοτριώσεων από >1.000.000 έως 2.000.000 €	Χαμηλή
	Δημόσια Δαπάνη Απαλλοτριώσεων έως 1.000.000 €	Πολύ Χαμηλή
Κίνδυνος που προκύπτει από τον Φορέα Υλοποίησής	Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Φορέα Υλοποίησης ως Πολύ Υψηλή	Πολύ Υψηλή
	Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Φορέα Υλοποίησης ως Υψηλή	Υψηλή
	Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Φορέα Υλοποίησης ως Μέτρια	Μέτρια
	Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Φορέα Υλοποίησης ως Χαμηλή	Χαμηλή
	Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Φορέα Υλοποίησης ως Πολύ Χαμηλή	Πολύ Χαμηλή
Καθυστερήση υποβολής δελτίων προόδου από τον Φορέα Υλοποίησης	Καθυστερήση έως και 1 μήνα	Πολύ Χαμηλή
	Καθυστερήση από 1 έως 2 μήνες	Χαμηλή
	Καθυστερήση από 2 έως 3 μήνες	Μέτρια
	Καθυστερήση από 3 έως 6 μήνες	Υψηλή
	Καθυστερήση από 6 μήνες και πάνω	Πολύ Υψηλή
Τροποποιήσεις αρχικού σχεδιασμού	Μη ύπαρξη τροποποιήσεων	Πολύ Χαμηλή
	Ύπαρξη μίας τροποποίησης	Χαμηλή
	Ύπαρξη δύο τροποποιήσεων	Μέτρια
	Ύπαρξη τριών τροποποιήσεων	Υψηλή
	Ύπαρξη από τέσσερις τροποποιήσεις και πάνω	Πολύ Υψηλή
Καθυστερήσεις χρονοδιαγράμματος	Καθυστερήσεις από 0% - 5%	Πολύ Χαμηλή
	Καθυστερήσεις από 5% - 15%	Χαμηλή
	Καθυστερήσεις από 15% - 25%	Μέτρια
	Καθυστερήσεις από 25% - 50%	Υψηλή
	Καθυστερήσεις από 50% και πάνω	Πολύ Υψηλή
Αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων	Αναγνώριση 5 κινδύνων	Πολύ Χαμηλή
	Αναγνώριση 5-8 κινδύνων	Χαμηλή
	Αναγνώριση 9-12 κινδύνων	Μέτρια

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
	Αναγνώριση 12-20 κινδύνων	Υψηλή
	Αναγνώριση 20 ή παραπάνω κινδύνων	Πολύ Υψηλή
Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων (Έργα που δεν ολοκληρώνονται εντός της περιόδου, ή/και δεν περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες της ΠΠ2014-2020 ή/και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα κατά την εκτέλεσή τους)	Εκτίμηση ύπαρξης σημαντικών κινδύνων που καθιστούν αμφίβολη την υλοποίηση του έργου	Πολύ Υψηλή
	Εκτίμηση ύπαρξης κινδύνων που εκτιμάται ότι επηρεάζουν την ομαλή εκτέλεση του έργου	Μέτρια
	Μη εκτίμηση ύπαρξης σημαντικών κινδύνων	Πολύ Χαμηλή
Αύξηση κόστους Έργου	Αύξηση κόστους μέχρι 5%	Πολύ Χαμηλή
	Αύξηση κόστους 5% - 10%	Χαμηλή
	Αύξηση κόστους 10% - 20%	Μέτρια
	Αύξηση κόστους 20% - 40%	Υψηλή
	Αύξηση κόστους πάνω από 40%	Πολύ Υψηλή
Προϋπολογισμός Έργου	Π/Υ στο διάστημα (0, 1,000,000 €]	Πολύ Χαμηλή
	Π/Υ στο διάστημα (1,000,000 €, 5,000,000 €]	Χαμηλή
	Π/Υ στο διάστημα (5,000,000 €, 15,000,000 €]	Μέτρια
	Π/Υ στο διάστημα (15,000,000 €, 30,000,000 €]	Υψηλή
	Π/Υ στο διάστημα (30,000,000 €, ∞)	Πολύ Υψηλή

Πίνακας 4.2: Πεδία τιμών παραγόντων κινδύνου έργου

Στους παραπάνω πίνακες, τα πεδία ορισμού τιμών των παραγόντων κινδύνου είναι κατά κύριο λόγο εμπειρικά. Η επίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο που εισάγει ο κάθε παράγοντας κινδύνου (risk factor) παίρνει ουσιαστικά ένα λεκτικό χαρακτηρισμό. Με τον όρο «επίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο» αναφερόμαστε στην επίπτωση που επιφέρει η εμφάνιση του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου στην συνολικό κίνδυνο R ενός έργου ή ενός φορέα υλοποίησης. Στην πρώτη προσέγγιση, η επίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με λεκτικούς χαρακτηρισμούς και με κλιμάκωση:

- **Πολύ Υψηλή:** όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται σε έργο με χαρακτηριστικό ή τιμή που θα επιφέρει ως επίπτωση πολύ μεγάλη πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο του έργου.
- **Υψηλή:** όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται σε έργο με χαρακτηριστικό ή τιμή που θα επιφέρει ως επίπτωση μεγάλη πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο του έργου.
- **Μέτρια:** όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται σε έργο με χαρακτηριστικό ή τιμή που θα επιφέρει ως επίπτωση μέτρια πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο του έργου.
- **Χαμηλή:** όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται σε έργο με χαρακτηριστικό ή τιμή που θα επιφέρει ως επίπτωση χαμηλή πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο του έργου.
- **Πολύ Χαμηλή:** όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται σε έργο με χαρακτηριστικό ή τιμή που θα επιφέρει ως επίπτωση πολύ χαμηλή πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο του έργου.

Για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου του έργου, κάθε ένας από τους παράγοντες κινδύνου στις παραπάνω κατηγορίες βαθμολογείται σε μια αριθμητική κλίμακα από 10-50, με το 10 να εκφράζει τον μικρή επίπτωση εμφάνισης του παράγοντα.

Η λεκτική περιγραφή των κανόνων που περιγράφουν το σύστημα είναι της μορφής:

Εάν (η τιμή / χαρακτηριστικό του i παράγοντα κινδύνου $RF(i)$ έχει τιμή K), Τότε (η προκαλούμενη έκθεση σε κίνδυνο στο έργο $R(i)$ είναι ίση με X)

Για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου κάθε έργου ή του κινδύνου για την υλοποίηση του έργου που προκαλείται από τον φορέα υλοποίησης, πρέπει να οριστούν οι βαρύτητες (weights - w) του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου (RF_i), δηλαδή του πόσο «έντονος» είναι ο κίνδυνος που εισάγει ο κάθε παράγοντας κινδύνου σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έτσι, ο γενικός τύπος που περιγράφει τον συνολικό κίνδυνο R (έργου) για ένα έργο είναι:

$$R(\text{έργου}) = \sum_{i=1}^{17} w(i) \cdot RF(i)$$

Όπου: $RF(i)$ η τιμή του παράγοντα κινδύνου έργου i

$w(i)$ η τιμή της βαρύτητας του παράγοντα κινδύνου έργου i , ανάλογα με την φάση του κύκλου ζωής του έργου

Στο επιλεγμένο σύστημα οι βαρύτητες ανά παράγοντα κινδύνου ορίζονται στον Πίνακα 4.3 που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Εγγενείς Παράγοντες Κινδύνου	36,7%
Φύση Έργου	10,0%
Είδος Έργου	10,0%
Μέγεθος Έργου, σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Φ.Υ.	3,3%
Αριθμός Υποέργων του Έργου	3,3%
Είδος Υποέργων	3,3%
Ιδιοκτησία Οικοπέδου Έργου	3,3%
Τεχνολογία	3,3%
Παράγοντες Κινδύνου Φορέα Υλοποίησης	3,3%
Κίνδυνος που προκύπτει από τον Φορέα Υλοποίησης	3,3%
Παράγοντες Κινδύνου Διαχείρισης	30,0%
Καθυστερήση υποβολής δελτίων προόδου	3,3%
Τροποποιήσεις αρχικού σχεδιασμού	6,7%
Αριθμός διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων, καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής	3,3%
Διαδικασίες δημοπράτησης	3,3%
Καθυστερήσεις χρονοδιαγράμματος	6,7%
Αύξηση κόστους Έργου	6,7%
Παράγοντες Κινδύνου Διασύνδεσης	23,3%
Αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων	10,0%
Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων στην επιλογή και χρηματοδότηση της πράξης	13,3%

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
<i>Παράγοντες Κινδύνου Επίπτωσης</i>	6,7%
Προϋπολογισμός έργου	6,7%

Πίνακας 4.3: Βαρύτητες παραγόντων κινδύνου έργων

Στην διαδικασία ανάλυσης κινδύνων, οι βαρύτητες αξιολογούνται κυρίως με βάση την εμπειρία. Η εκτίμηση μάλιστα των βαρυτήτων προτείνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την φάση του κύκλου ζωής των έργων, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψιν οι διαφορετικές συνθήκες των έργων στις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους. Η διαφοροποίηση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι αναγνωρισθέντες κίνδυνοι επιδρούν με διαφορετικό τρόπο σε ένα έργο στις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής του. Για παράδειγμα, η έκθεση σε κίνδυνο που προκαλείται από τον παράγοντα κινδύνου «ιδιοκτησία γης κατασκευής έργου» είναι πρακτικά μηδενική για ένα έργο που βρίσκεται στο τέλος του, ενώ ο ίδιος παράγοντας κινδύνου είναι εξαιρετικά κρίσιμος όταν το υπό εξέταση έργο βρίσκεται στα πρώτα του στάδια.

Στις περιπτώσεις των προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας, όπως το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η κλασική ανάλυση των φάσεων του κύκλου ζωής δεν είναι εφικτή. Κι αυτό γιατί αφενός η ακριβής φάση του κύκλου ζωής ενός έργου δεν είναι ένα δεδομένο πάντα άμεσα διαθέσιμο στα προγράμματα μεγάλης κλίμακας, έτσι ώστε να προκύπτει γρήγορα, με αντικειμενικό τρόπο, και αφετέρου, στα προγράμματα μεγάλης κλίμακας ένα έργο αποτελείται συνήθως από πολλά υποέργα, τα οποία δεν εκτελούνται κατ' ανάγκην με τον ίδιο ρυθμό, άρα δεν βρίσκονται μόνιμα στις ίδιες φάσεις του κύκλου ζωής τους. Γι' αυτό τον λόγο υιοθετείται μια νέα προσέγγιση ανάλυσης των φάσεων του κύκλου ζωής, με βάση τον ρυθμό απορρόφησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, έτσι ώστε να μπορεί να προκύπτει άμεσα και αντικειμενικά η φάση του κύκλου ζωής κάθε έργου. Συγκεκριμένα, ο κύκλος ζωής ενός έργου διαχωρίζεται σε τρεις βασικές φάσεις με βάση τον ρυθμό δαπανών για το έργο, ως εξής:

- **Φάση 1: Φάση Ενεργοποίησης.** Σε αυτή την φάση, το έργο έχει μόλις ενταχθεί στο πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας για χρηματοδότηση, οπότε είτε βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού είτε της δημοπράτησης (επιλογής αναδόχου), είτε στα πρώτα στάδια της εκτέλεσής του. Αντικειμενικό κριτήριο για την κατάταξη ενός έργου σε αυτή τη φάση αποτελεί το ύψος των δαπανών του, το οποίο σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
- **Φάση 2: Φάση Εκτέλεσης.** Η έναρξη της φάσης αυτής σηματοδοτείται από την σημαντική αύξηση σε εργασίες, αλλά και σε δαπάνες. Αντικειμενικό κριτήριο για την κατάταξη ενός έργου σε αυτή τη φάση αποτελεί το ύψος των δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 10% και 90% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

- **Φάση 3: Τελική Φάση.** Η παρούσα φάση περιλαμβάνει κυρίως την παράδοση του έργου και τον τελικό έλεγχο. Στην φάση αυτή ολοκληρώνονται όλα τα παραδοτέα, πιστοποιούνται και παραδίδονται προς χρήση, ενώ παράλληλα μπαίνει σε εφαρμογή και το βασικό σχέδιο συντήρησης. Επίσης, αποτιμάται γενικότερα η συνολική πορεία υλοποίησης του έργου και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τα επόμενα έργα. Αντικειμενικό κριτήριο για την κατάταξη ενός έργου σε αυτή τη φάση αποτελεί το ύψος των δαπανών του, το οποίο σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει ξεπεράσει το 90% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου ή, εναλλακτικά, να έχει υποβληθεί από τον φορέα υλοποίησης δήλωση ολοκλήρωσης του έργου.

Ο καθορισμός των βαρυτήτων ολοκληρώνεται με επιτυχία σε δύο βήματα:

1. Αρχικά, οι βαρύτητες καθορίζονται στο ανώτατο επίπεδο της κατηγοριοποίησης των παραγόντων κινδύνου, ήτοι καθορίζεται η βαρύτητα για τους παράγοντες πιθανότητας και επίπτωσης. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι βαρύτητες στο αμέσως επόμενο επίπεδο κατηγοριοποίησης (εγγενείς παράγοντες κινδύνου, παράγοντες κινδύνου φορέων υλοποίησης, παράγοντες κινδύνου διαχείρισης και παράγοντες κινδύνων διαχείρισης).
2. Κατόπιν, οι βαρύτητες καθορίζονται για όλους τους παράγοντες κινδύνου εντός των κατηγοριών και υποκατηγοριών.

Η αποτίμηση των βαρυτήτων αποτελεί μία σταδιακή διαδικασία. Αρχικά καλούνται να καθορίσουν τις βαρύτητες γενικά και κατόπιν σε κάθε μία από τις κατηγορίες, τις υποκατηγορίες αυτών και, τέλος, στους παράγοντες κινδύνου. Χρησιμοποιώντας την σειριακή και ιεραρχική αυτή διαδικασία εξασφαλίζεται ότι θα εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα βήματα, χωρίς να δημιουργηθούν κενά στην ανάλυση. Η τιμή κάθε βαρύτητας $w(i)$ για κάθε έναν παράγοντα κινδύνου i χαρακτηρίζεται στην διαδικασία αυτή λεκτικά, με βάση το παρακάτω σύνολο λεκτικών τιμών:

- Πολύ Υψηλή Βαρύτητα ($w(i)_{\text{ΠΥ}}$)
- Υψηλή Βαρύτητα ($w(i)_{\text{Υ}}$)
- Μέτρια Βαρύτητα ($w(i)_{\text{Μ}}$)
- Χαμηλή Βαρύτητα ($w(i)_{\text{Χ}}$)
- Πολύ Χαμηλή Βαρύτητα ($w(i)_{\text{ΠΧ}}$)

Παρομοίως, ο τύπος που θα υπολογίζει τον κίνδυνο του δικαιούχου – φορέα υλοποίησης θα προκύπτει από τον τύπο:

$$R(\Phi.Y.) = \sum_{j=1}^{11} w'(j) \cdot RF'(j)$$

όπου: $RF'(j)$ η τιμή του παράγοντα κινδύνου j για τον φορέα υλοποίησης

$w'(j)$ η τιμή της βαρύτητας του παράγοντα κινδύνου j του φορέα υλοποίησης

Οι βαρύτητες των παραγόντων κινδύνου έργου φαίνεται στον Πίνακα 4.4 που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟΥ		
	Φάση Ενεργοποίησης	Φάση Εκτέλεσης	Τελική Φάση
Φύση Έργου	Χαμηλή Τιμή	Υψηλή Τιμή	Χαμηλή Τιμή
Είδος Έργου	Μέτρια Τιμή	Μέτρια Τιμή	Μέτρια Τιμή
Μέγεθος Έργου, σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Φ.Υ.	Μέτρια Τιμή	Μέτρια Τιμή	Χαμηλή Τιμή
Αριθμός Υποέργων του Έργου	Μέτρια Τιμή	Υψηλή Τιμή	Χαμηλή Τιμή
Είδος Υποέργων	Μέτρια Τιμή	Μέτρια Τιμή	Μέτρια Τιμή
Ιδιοκτησία Οικοπέδου Έργου	Υψηλή Τιμή	Μέτρια Τιμή	Χαμηλή Τιμή
Τεχνολογία	Μέτρια Τιμή	Χαμηλή Τιμή	Χαμηλή Τιμή
Κίνδυνος που προκύπτει από τον Φορέα Υλοποίησης	Μέτρια Τιμή	Υψηλή Τιμή	Μέτρια Τιμή
Καθυστέρηση υποβολής δελτίων προόδου	Χαμηλή Τιμή	Υψηλή Τιμή	Υψηλή Τιμή
Τροποποιήσεις αρχικού σχεδιασμού	Χαμηλή Τιμή	Μέτρια Τιμή	Μέτρια Τιμή
Αριθμός διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων, καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής	Μέτρια Τιμή	Μέτρια Τιμή	Μέτρια Τιμή
Διαδικασίες δημοπράτησης	Μέτρια Τιμή	Χαμηλή Τιμή	Χαμηλή Τιμή
Καθυστερήσεις χρονοδιαγράμματος	Υψηλή Τιμή	Υψηλή Τιμή	Χαμηλή Τιμή
Αύξηση κόστους Έργου	Μέτρια Τιμή	Υψηλή Τιμή	Υψηλή Τιμή
Αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων	Χαμηλή Τιμή	Υψηλή Τιμή	Υψηλή Τιμή
Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων	Υψηλή Τιμή	Υψηλή Τιμή	Χαμηλή Τιμή
Προϋπολογισμός έργου	Υψηλή Τιμή	Υψηλή Τιμή	Υψηλή Τιμή

Πίνακας 4.4: Λεκτικές τιμές βαρυτήτων παραγόντων κινδύνου έργων

Οι λεκτικές τιμές στον πίνακα βαρυτήτων για τον υπολογισμό του κινδύνου του εκάστοτε έργου θα παίρνουν αριθμητικές τιμές:

- Χαμηλή Τιμή: 1
- Μέτρια Τιμή: 3
- Υψηλή Τιμή: 5

4.1.2 Παράγοντες κινδύνου διασύνδεσης του συστήματος

Μία σημαντική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στην προτεινόμενη μεθοδολογία είναι η ύπαρξη παραγόντων διασύνδεσης, η οποία επιτρέπει ουσιαστικά την ολοκληρωμένη προσέγγιση και την επικοινωνία μεταξύ των δύο διακριτών φάσεων ανάλυσης, της ανάλυσης κινδύνων και της ανάλυσης παραγόντων κινδύνων.

Συγκεκριμένα, με τους εν λόγω παράγοντες καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση με έναν αντικειμενικό και δομημένο τρόπο των απόψεων των στελεχών διαχείρισης των έργων σχετικά με τους αναγνωρισθέντες κινδύνους. Οι απόψεις αυτές βέβαια είναι πολύ πιθανό να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από στέλεχος σε στέλεχος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον υποκειμενικό παράγοντα. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ανάλυση παραγόντων κινδύνων δεν βασίζεται αποκλειστικά στους παράγοντες διασύνδεσης, μιας και με αυτό τον τρόπο θα χανόταν σε μεγάλο βαθμό το κοινό μέτρο σύγκρισης και η δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων συμπερασμάτων. Παρ' όλα αυτά όμως, οι παράγοντες αυτοί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό δομικό συστατικό της μεθοδολογίας, καθώς επιτρέπουν την εξέταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των έργων.

Με βάση τα παραπάνω, στην προτεινόμενη προσέγγιση καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε οι εν λόγω παράγοντες διασύνδεσης να αποτυπώνουν μεν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων, να μην αλλοιώνουν όμως δε τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας, ήτοι την αντικειμενικότητά της, την ευκολία της, αλλά και την ταχύτητα εφαρμογής της.

Οι προτεινόμενοι παράγοντες διασύνδεσης, όπως αποτυπώνονται και στον Πίνακα 4.1, είναι δύο, ο «αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων» και η «εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων». Τόσο ο αριθμός των αναγνωρισθέντων κινδύνων σε ένα έργο, όσο και η εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων, υπολογίζονται συνδυαστικά μέσω της υποκειμενικής αξιολόγησης αλλά και στοιχείων που αποτυπώνονται από το εξαγόμενο του συστήματος της Ε.Υ.Δ. για την εξαγωγή δείγματος έργων για έλεγχο, από διαθέσιμες εκθέσεις προόδου της Ε.Υ.Δ, από προηγούμενες εκθέσεις εκτίμησης κινδύνου (Σχέδιο ΑΣΑ 2019), από τις προτεραιότητες που τίθενται κατά την ΠΠ2014-2020 μέσω του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και από στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω συναντήσεων με αρμόδια στελέχη της Ε.Υ.Δ.. Για τον παράγοντα κινδύνου «εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων» προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη και να κρίνονται ως προς την σημαντικότητά τους οι δύο πιο εξέχοντες κίνδυνοι. Ο κύριος λόγος για τον οποίο υιοθετείται η αξιολόγηση του εν λόγω παράγοντα κινδύνου να βασίζεται μόνο στους δύο πιο σημαντικούς κινδύνους του έργου / υποέργου είναι η βάσιμη υπόθεση ότι για τους δύο πιο σημαντικούς κινδύνους θα έχει γίνει η καλύτερη δυνατή ανάλυση, με αποτέλεσμα και οι σχετικές εκτιμήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες. Τέλος, για τα έργα του τομέα Περιβάλλοντος, κρίνεται σκόπιμο η αντιμετώπιση και η εύρεση των τιμών των παραγόντων κινδύνου διασύνδεσης ανά ομάδες / κατηγορίες έργων, καθώς και το πλήθος των έργων είναι εξαιρετικά μεγάλο ενώ το διάστημα υλοποίησης του προτεινόμενου συστήματος μικρό, όπως επίσης είναι λογική η υπόθεση ότι έργα με όμοιο φυσικό αντικείμενο (π.χ. έργα λυμάτων, έργα απορριμμάτων κλπ) να εμφανίζουν κοινούς κινδύνους και προβλήματα κατά την υλοποίησή τους.

4.1.3 Εξαγόμενα Στοιχεία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Ενταγμένων Πράξεων Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της κατάταξης των Ενταγμένων Πράξεων με βάση την μεθοδολογία που παρουσιάστηκε, αποτυπώνεται στον Πίνακα 4.5 που ακολουθεί. Στον πίνακα αποτυπώνεται ανά θεματική περιοχή ο αριθμός των έργων που εμπίπτουν σε κάθε κλίμακα της κατάταξης. Στον τομέα Μεταφορών έχουν χρησιμοποιηθεί οι κατηγορίες έργων:

- Σιδηροδρομικά
- Σιδηροδρομική ασφάλεια (συστήματα)
- Οδικά
- Οδική Ασφάλεια
- Λιμένες
- Ναυσιπλοΐα - Ασφάλεια
- Αεροδρόμια
- Αεροναυτιλία - Ασφάλεια
- Μετρό
- Αστικές Μεταφορές,

Ενώ αντίστοιχα στον τομέα Περιβάλλοντος, οι κατηγορίες:

- Ενεργειακή Αναβάθμιση
- Τηλεθέρμανση
- Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες
- Απορρίμματα
- Απορρίμματα (Βιο-απόβλητα, Πράσινα σημεία)
- Λύματα
- Ύδρευση – Αφαλάτωση
- Διαρροές
- Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (φύση)
- Αστική Αναζωογόνηση.

Οι επιμέρους πίνακες υπολογισμού των παραγόντων κινδύνου των έργων, παρατίθενται στο Παράρτημα II του παρόντος.

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ					
		ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ	ΥΨΗΛΟ	ΜΕΤΡΙΟ	ΧΑΜΗΛΟ	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ
1	Σιδηροδρομικό		4	1			5
	Σιδηροδρομική ασφάλεια		1	2		1	4
3	Οδικό	1	3	1		2	7
	Οδική Ασφάλεια			2			2
4	Οδικό		2				2
	Οδική Ασφάλεια		1				1
5	Οδικό		1				1
6	Λιμενικό		1			1	2
	Λιμενική ασφάλεια			3	1		4
7	Αεροδρόμιο		1				1

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ					
		ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ	ΥΨΗΛΟ	ΜΕΤΡΙΟ	ΧΑΜΗΛΟ	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ
	Αεροδρόμια Ασφάλεια		3	1	1		5
8	Μετρό		2				2
9	Μετρό		1				1
	Αστικά			2	1		3
10	Ενεργειακή Αναβάθμιση		9	79			88
	Τηλεθέρμανση		1	1			2
11	Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες			3			3
12	Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες		2	4	6	1	13
13	Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες		1	4	4	1	10
14	Απορρίμματα	2	39	19	1	3	64
	Απορρίμματα ΒΠ		14	13	8		35
	Λύματα	10	48	22		5	85
	Υδρευση - Αφαλάτωση		5	7		5	17
	Διαρροές		33	27	3	4	67
	Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες		5	6			11
	Φορέας		10	14	1		25
	Αστική Αναζωογόνηση		10	13	5	26	54
14B	Απορρίμματα		1			1	2
	Λύματα	1	15	18		18	52
ΣΥΝΟΛΑ		14	213	242	31	68	568

Πίνακας 4.5: Κατάταξη Προγραμματικών έργων (Συγκεντρωτικά ανά θεματική περιοχή)

4.2 Αποτίμηση συνολικού κινδύνου των Προγραμματικών Πράξεων Ε.Π.

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

4.2.1 Μεθοδολογία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Προγραμματικών Πράξεων Ε.Π.

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Στο επιλεγμένο σύστημα, ο τρόπος προσέγγισης των παραγόντων κινδύνου για τα Προγραμματικά έργα διαφοροποιείται σε σχέση με την αντίστοιχη προσέγγιση των Ενταγμένων έργων. Ο κυριότερος λόγος αυτής της διαφοροποίησης έγκειται στη δυσκολία καθορισμού εκείνων των παραμέτρων των έργων, που δεν είναι διαθέσιμα κατά την παρούσα χρονική στιγμή, όπως ο αναμενόμενος αριθμός και το είδος των υποέργων, καθώς και στοιχεία που αφορούν παράγοντες διαχείρισης. Στον Πίνακα 4.6 που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των κινδύνων στα Προγραμματικά έργα. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το σύνολο των παραγόντων του Πίνακα 4.1 αποτυπώνεται με τη διακριτή διαγραφή συνολικά επτά παραγόντων. Πρόκειται για τους παράγοντες κινδύνου «Είδος Υποέργων», «Αριθμός Υποέργων του Έργου», «Καθυστέρηση υποβολής δελτίων προόδου από τον Δικαιούχο», «Τροποποιήσεις αρχικού σχεδιασμού», «Αριθμός διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων, καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου», «Καθυστερήσεις χρονοδιαγράμματος» και «Αύξηση κόστους έργου». Σημειώνεται ότι για τους δύο

τελευταίους παράγοντες η διαθέσιμη πληροφορία έχει ληφθεί υπόψη στη συμπλήρωση του παράγοντα «Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων».

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ			ΑΝΑΛΥΣΗ		ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ	
			Αντικειμενική	Υποκειμενική	Διακριτές	Συνεχείς
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ	Εγγενείς	Φύση Έργου	X		X	
		Είδος Έργου	X		X	
		Τεχνολογία	X		X	
		Ιδιοκτησία Οικοπέδου Έργου	X		X	
	Παράγοντας Φορέα Υλοποίησης	Παράγοντας κινδύνου Δικαιούχου		X		X
		Μέγεθος έργου σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Δικαιούχου στο Πρόγραμμα	X			X
		Διαδικασίες δημοπράτησης	X		X	
	Παράγοντες Διασύνδεσης	Αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων		X		X
		Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων		X		X
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ		Προϋπολογισμός Έργου	X			X

Πίνακας 4.6: Παράγοντες κινδύνου Προγραμματικών έργων

Όσον αφορά στα πεδία τιμών των παραγόντων κινδύνου, οι επιλογές δεν μεταβάλλονται ακολουθώντας τα οριζόμενα στον Πίνακα 4.2. Αντίθετα, με την αφαίρεση των επτά παραγόντων οι βαρύτητες ανά παράγοντα κινδύνου μεταβάλλονται και η νέες τιμές τους αποτυπώνονται στον Πίνακα 4.7 που ακολουθεί.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Εγγενείς Παράγοντες Κινδύνου	45,0%
Φύση Έργου	15,0%
Είδος Έργου	15,0%
Μέγεθος Έργου, σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Φ.Υ.	5,0%
Ιδιοκτησία Οικοπέδου Έργου	5,0%
Τεχνολογία	5,0%
Παράγοντες Κινδύνου Φορέα Υλοποίησης	5,0%
Κίνδυνος που προκύπτει από τον Φορέα Υλοποίησης	5,0%
Παράγοντες Κινδύνου Διαχείρισης	5,0%
Διαδικασίες δημοπράτησης	5,0%
Παράγοντες Κινδύνου Διασύνδεσης	35,0%
Αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων	15,0%
Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων στην επιλογή και χρηματοδότηση της πράξης	20,0%
Παράγοντες Κινδύνου Επίπτωσης	10,0%
Προϋπολογισμός έργου	10,0%

Πίνακας 4.7: Βαρύτητες παραγόντων κινδύνου Προγραμματικών έργων

Όπως είναι αναμενόμενο, τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (Φύση, Είδος, Τεχνολογία και Π/Υ) καθορίζουν πλέον σε σημαντικότερο βαθμό την εκτίμηση. Εάν προστεθούν και οι παράγοντες διασύνδεσης, οι οποίοι αντανακλούν πληροφορίες σχετικά με τα τυχόν προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί κατά την προετοιμασία των έργων, τότε η συμβολή όλων των εν λόγω παραγόντων ανέρχεται σε 80%, έναντι του 53% που συμβάλλουν στην εκτίμηση της ομάδας των ενταγμένων έργων.

4.2.2 Εξαγόμενα Στοιχεία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Προγραμματικών Πράξεων Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της κατάταξης των Προγραμματικών Πράξεων με βάση την μεθοδολογία που παρουσιάστηκε, αποτυπώνεται στον Πίνακα 4.6 που ακολουθεί. Κατ' αντιστοιχία με την Παράγραφο 4.1.3, στον πίνακα αποτυπώνεται ανά θεματική περιοχή ο αριθμός των έργων που εμπίπτουν σε κάθε κλίμακα της κατάταξης. Οι επιμέρους πίνακες υπολογισμού των παραγόντων κινδύνου των έργων, παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ				
		ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ	ΥΨΗΛΟ	ΧΑΜΗΛΟ	ΜΕΤΡΙΟ	Grand Total
1	Σιδηροδρομικό	2				2
2	Σιδηροδρομικό		1			1
4	Οδική Ασφάλεια		2			2
6	Λιμενική ασφάλεια	1				1
7	Αεροδρόμια Ασφάλεια		5		1	6
	Αεροδρόμιο	2	4			6
9	Αστικά		6			6
10	Ενεργειακή Αναβάθμιση			22		22
11	Αντιπλημμυρικά			5		5
14	Απορρίμματα	23	15	7	2	47
	Απορρίμματα ΒΠ	2	25	8	10	45
	Λύματα	6	2	3	1	12
	Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες				1	1
	Υδρευση - Αφαλάτωση	3		1		4
	Φορέας			1		1
14B	Απορρίμματα		1			1
	Απορρίμματα ΒΠ	3	3	3		9
Grand Total		42	64	50	15	171

Πίνακας 4.6: Κατάταξη Προγραμματικών έργων (Συγκεντρωτικά ανά θεματική περιοχή)

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.


5.1 Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Ενταγμένων Πράξεων

Η διερεύνηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υποσυστήματος αποτίμησης κινδύνου για τα ενταγμένα έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανέδειξε τα εξής:

Τομέας Μεταφορών


➤ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Σιδηροδρομικών Μεταφορών

Σιδηροδρομικά έργα (υποδομές)

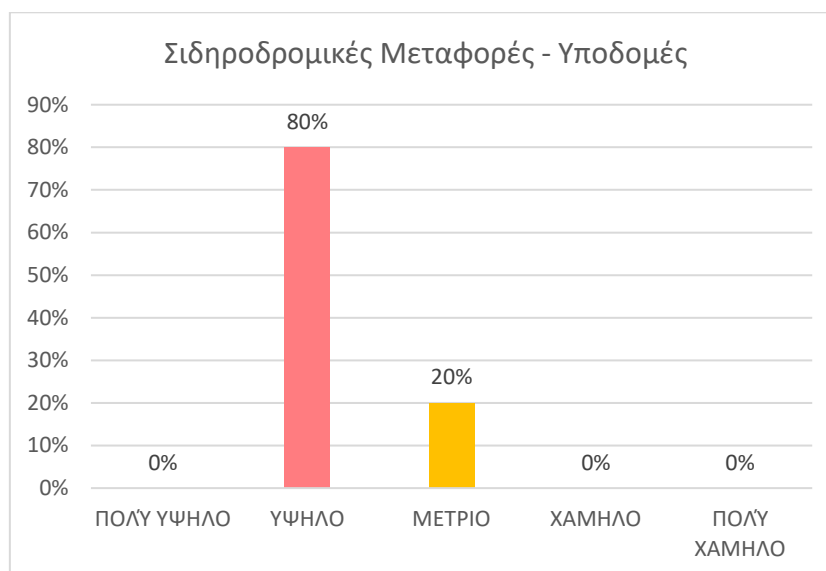


Σχήμα 5.4: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα έργα έχουν καταταχθεί σε δύο μόνο κλάσεις επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ» και την «ΜΕΤΡΙΑ». Ωστόσο, με εξαίρεση στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'», το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και η επικινδυνότητά του εκτιμάται σε Μέτριο επίπεδο, τα υπόλοιπα έργα στο σύνολό τους κατατάσσονται στην υψηλή επικινδυνότητα, αποτυπώνοντας ουσιαστικά μια τάση στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Για την αποφυγή της ιδιαίτερα αυξημένης επικινδυνότητας, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

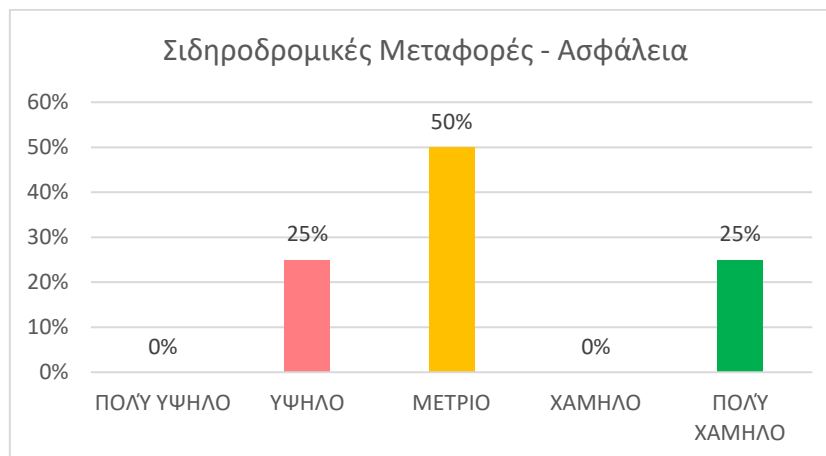
Σιδηροδρομικά έργα (Ασφάλεια)**Σχήμα 5.: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής**

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ» και την «ΜΕΤΡΙΑ». Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνεται στην κλάση «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ». Με βάση τη βαθμολογία των λοιπών έργων, συμπεριλαμβανομένου και του ενός έργου που κατατάχθηκε οριακά στην «ΥΨΗΛΗ» κλάση, αποτυπώνεται μια τάση μέτρια επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

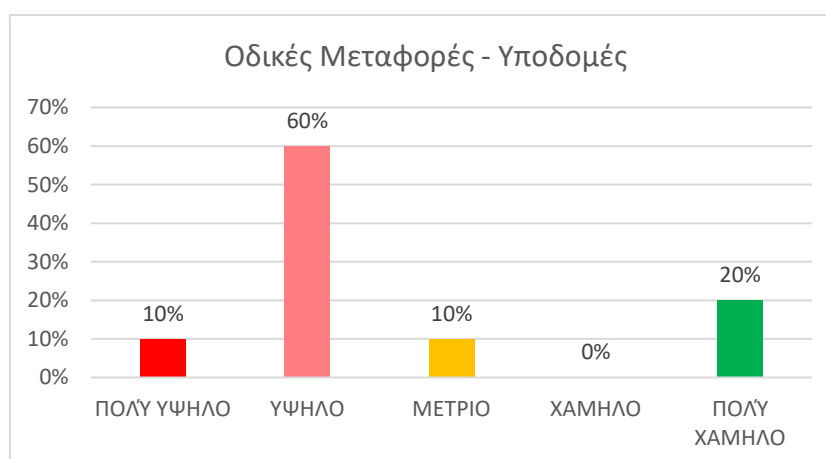➤ **Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Οδικών Μεταφορών**Οδικά έργα (υποδομές)**Σχήμα 5.6: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής**


Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» ανέρχεται σε 70%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Πολύ Χαμηλή» είναι 20% στην οποία έχουν περιληφθεί τα έργα με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο «Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'» και «Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β'». Ειδικά στην «Πολύ Υψηλή» κλάση κατατάχθηκαν τα έργα «Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος» και «Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου – Φάση Β'» κυρίως λόγω των εμπλοκών που έχουν παρουσιάσει κατά την υλοποίησή τους. Με εξαίρεση τα εν λόγω δύο έργα, η πλειοψηφία των λοιπών έργων (60%), ανεξάρτητα από την φάση του κύκλου υλοποίησης που βρίσκεται, κατατάσσεται στην «Υψηλή» κλάση, εμφανίζοντας μια εγγενή επικινδυνότητα που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο είδος, το μέγεθος καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στην διαχείρισή τους. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

Οδικά έργα (Ασφάλεια)

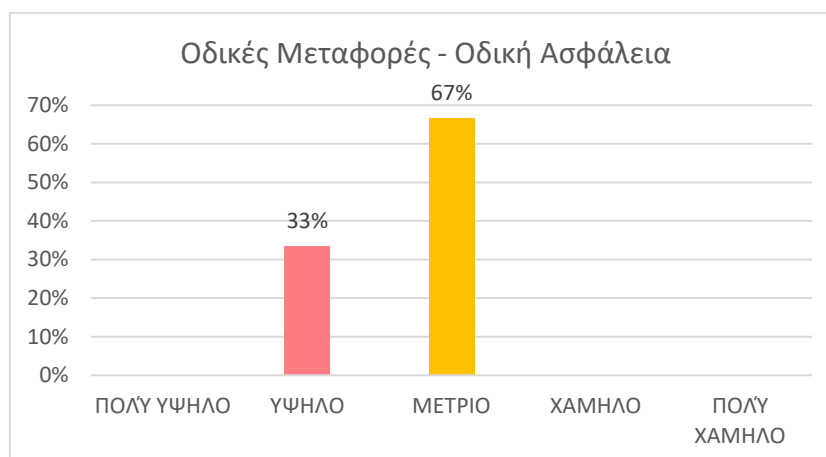


Σχήμα 5.7: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ» και την «ΜΕΤΡΙΑ». Με εξαίρεση το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΑΚ) / ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΧΛΑΔΑ» που κατατάχθηκε οριακά στην «ΥΨΗΛΗ» κλάση κυρίως λόγω αυξημένων βαθμολογιών στα κριτήρια διαχείρισης, αποτυπώνεται μια τάση μέτριας επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

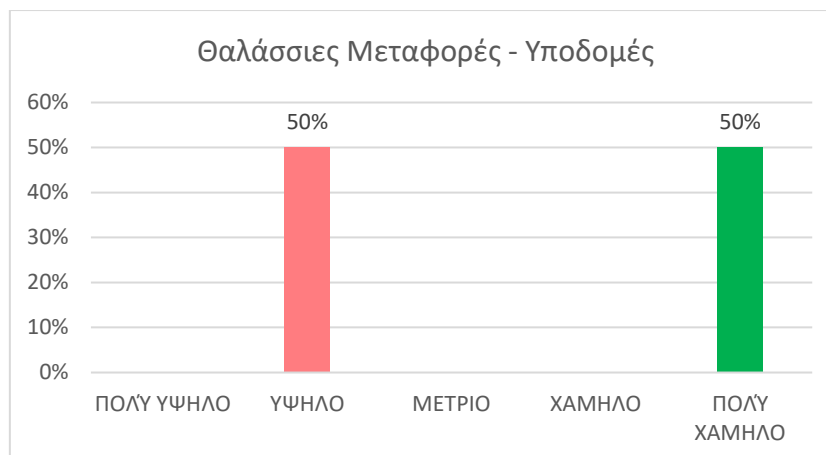➤ **Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Θαλάσσιων Μεταφορών**Λιμένες (υποδομές)**Σχήμα 5.8: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής**

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα έργα έχουν καταταχθεί σε δύο μόνο κλάσεις επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ» και την «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» στην οποία περιλήφθηκε το έργο «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α' Φάσης - Φάση Α2'» που έχει ολοκληρωθεί. Το δεύτερο έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίστας Γ1' Φάση» κατατάχθηκε στην «ΥΨΗΛΗ» κλάση κυρίως λόγω της αυξημένης βαθμολογίας στα κριτήρια διαχείρισης. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

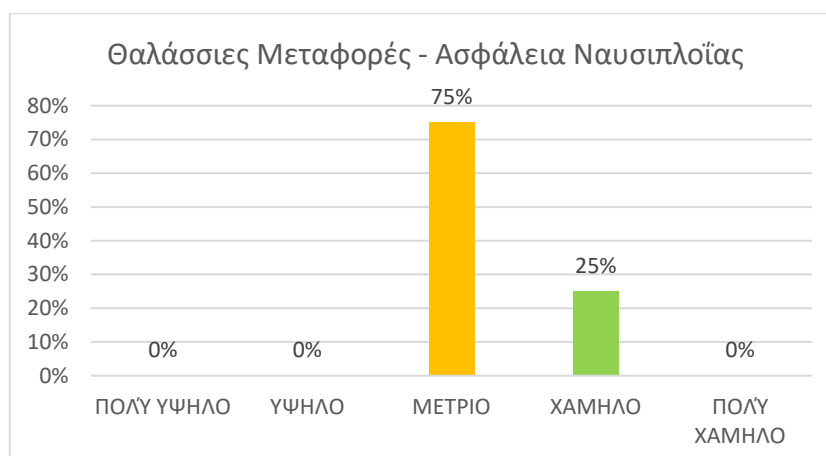
Ναυσιπλοΐα (Ασφάλεια)**Σχήμα 5.9: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής**

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ» και την «ΧΑΜΗΛΗ» στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια

ναυσιπλοΐας» που βρίσκεται σε τελική φάση υλοποίησης. Στα υπόλοιπα ενταγμένα έργα αποτυπώνεται μια τάση μέτριας επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

➤ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Αεροπορικών Μεταφορών


Αεροδρόμια (υποδομές)

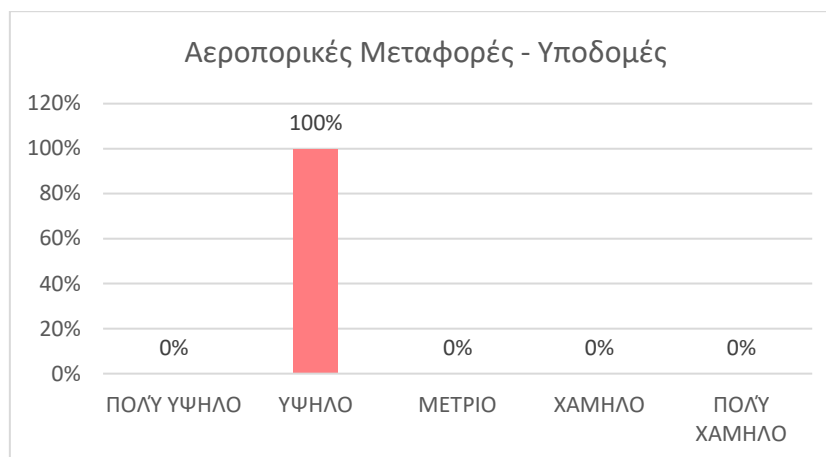

Σχήμα 5.10: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής

Στη συγκεκριμένη κατηγορία έχει ενταχθεί μόνο το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ», το οποίο περιλαμβάνεται στην «ΥΨΗΛΗ» κλάση επικινδυνότητας κυρίως λόγω της βαθμολογίας στα κριτήρια διαχείρισης. Για την αποφυγή πιθανών πρόσθετων καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των τυχόν προβλημάτων.

Αεροναυτιλία (Ασφάλεια)

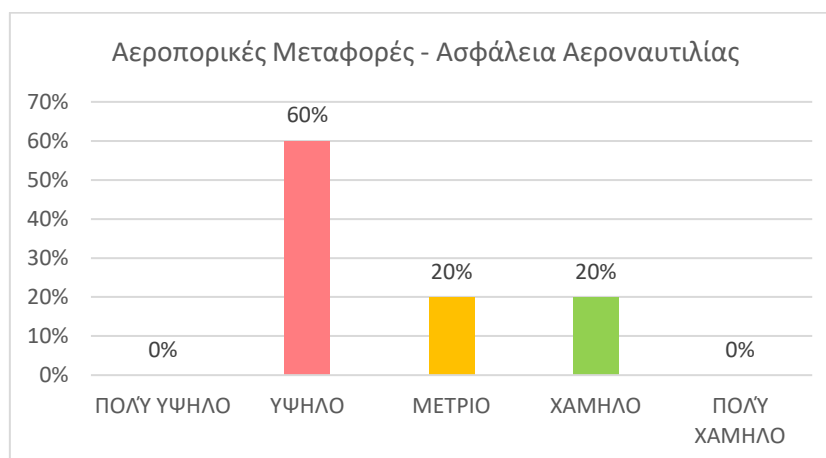


Σχήμα 5.11: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε τρεις κλάσεις επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ», την «ΜΕΤΡΙΑ» και την «ΧΑΜΗΛΗ». Τα περισσότερα έργα (60%) περιλαμβάνονται στην «Υψηλή» κλάση ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων στις διαδικασίες δημοπράτησης και γενικότερα κατά το στάδιο προετοιμασίας τους. Παρότι με βάση το μέγεθος και το είδος των έργων θα αναμενόταν μέτρια επικινδυνότητα, στη παρούσα φάση απαιτείται συστηματική παρακολούθηση και η άμεση λήψη μέτρων για την εκκίνηση των εργασιών.


➤ **Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Αστικών Μεταφορών**

Μετρό

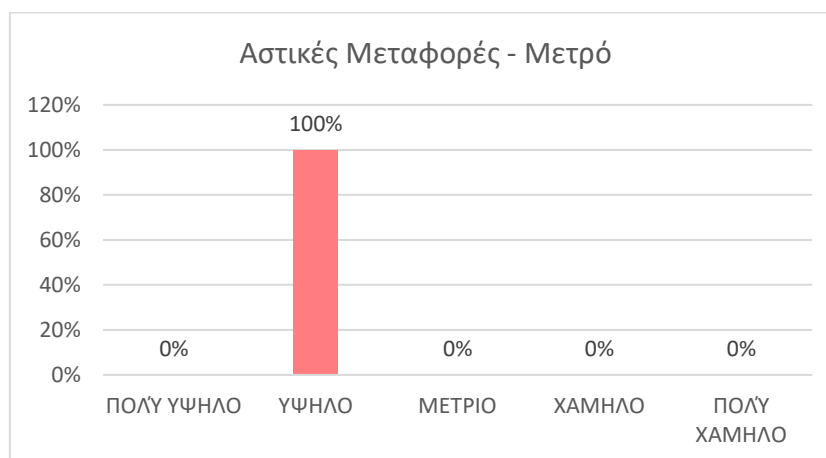


Σχήμα 5.12: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής

Στη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν ενταχθεί τα τρία έργα που αφορούν στην κατασκευή του Μετρό της Αθήνας (Επέκταση Χαϊδάρη - Πειραιάς) και της Θεσσαλονίκης (Βασική γραμμή και επέκταση έως Καλαμαριά). Πρόκειται για μεγάλου μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα, τα οποία παρότι έχουν εκκινήσει σε προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, εξακολουθούν να εμφανίζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά την υλοποίησή τους. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

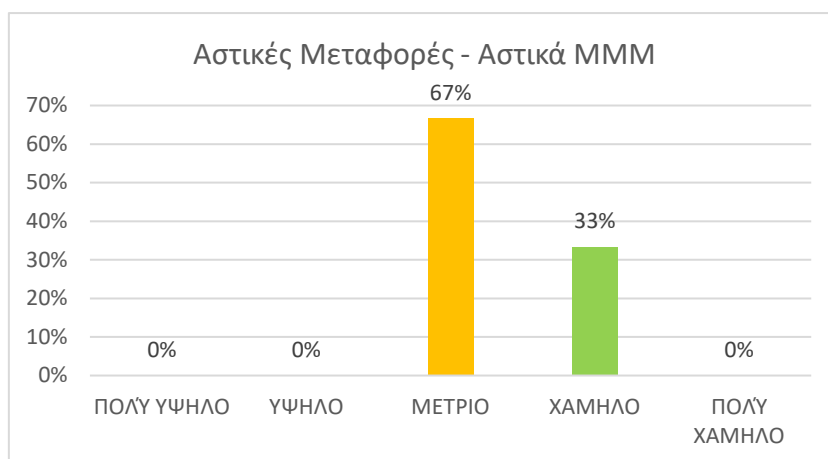Λοιπά έργα Αστικών ΜΜΜ**Σχήμα 5.13: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής**


Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ» και την «ΧΑΜΗΛΗ», αποτυπώνοντας μια τάση μέτριας προς χαμηλή επικινδυνότητα στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι η εκτίμηση βασίζεται μόνο στην υλοποίησης των μικρής έκτασης προμηθειών του συστήματος αστικών συγκοινωνιών.

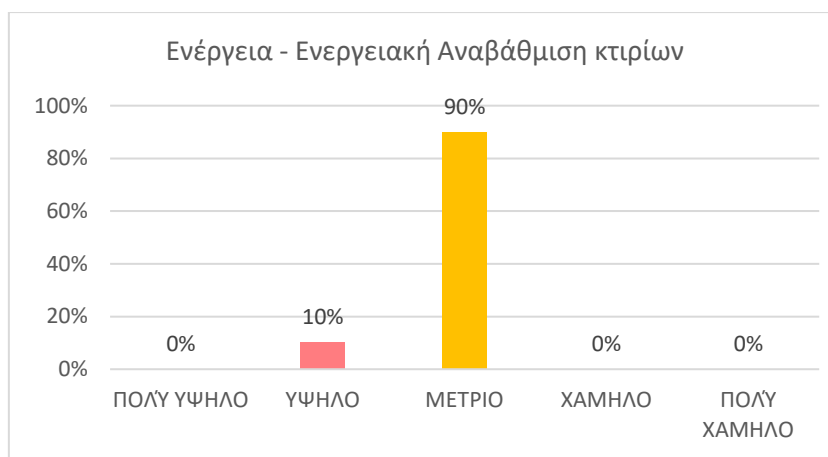Τομέας Περιβάλλοντος**➤ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Ενέργειας**Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων**Σχήμα 5.14: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής**

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα ενταγμένα έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ» και την «ΥΨΗΛΗ» Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στις οποίες έχουν


εντοπισθεί αυξημένες βαθμολογίες σε κριτήρια κινδύνων διαχείρισης, αποτυπώνεται μια τάση μέτριας επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των 88 ενταγμένων έργων τα 63 αφορούν σε δράσεις που σύμφωνα με την 4^η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στο πρόγραμμα της ΠΠ2014-2020.

Τηλεθέρμανση

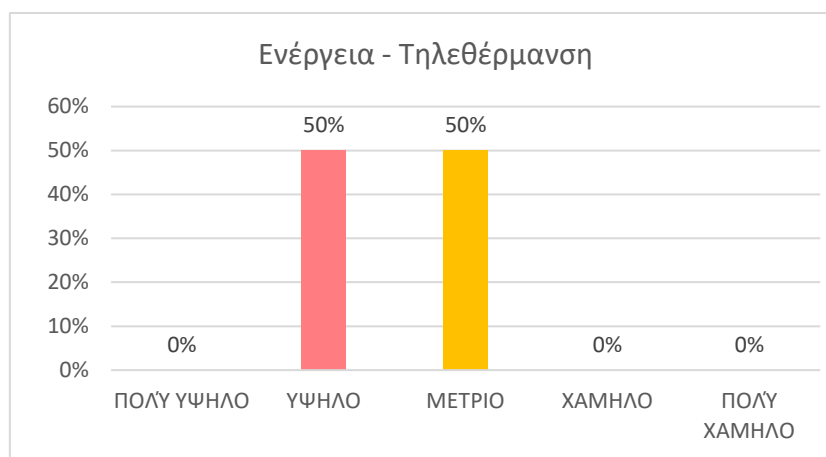


Σχήμα 5.15: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής


Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα ενταγμένα έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ» και την «ΥΨΗΛΗ». Πρόκειται για δύο έργα, την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» που βρίσκεται σε τελική φάση υλοποίησης, και την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV, V ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» που βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης. Το έργο στην Πτολεμαΐδα περιλήφθηκε στην Υψηλή κλάση κυρίως λόγω κριτηρίων επικινδυνότητας που σχετίζονται με το φορέα υλοποίησης. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση του έργου.

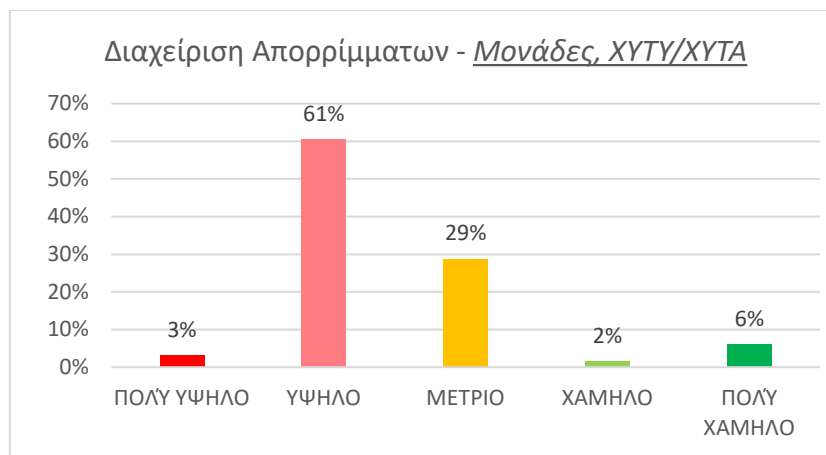➤ **Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων**Απορρίμματα – Μονάδες, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ**Σχήμα 5.16: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής**

Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» ανέρχεται σε 64%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Πολύ Χαμηλή» είναι 8% στην οποία έχουν περιληφθεί κυρίως τα έργα με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο. Ειδικά στην «Πολύ Υψηλή» κλάση κατατάχθηκαν τα έργα «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ» κυρίως λόγω των εμπλοκών που έχουν παρουσιάσει κατά την υλοποίησή τους. Με εξαίρεση τα εν λόγω δύο έργα, η πλειοψηφία των λοιπών έργων (61%), ανεξάρτητα από την φάση του κύκλου υλοποίησης που βρίσκεται, κατατάσσεται στην «Υψηλή» κλάση, εμφανίζοντας μια εγγενή επικινδυνότητα που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο είδος, το μέγεθος, καθυστερήσεις στην προετοιμασία τους, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στην διαχείρισή τους. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

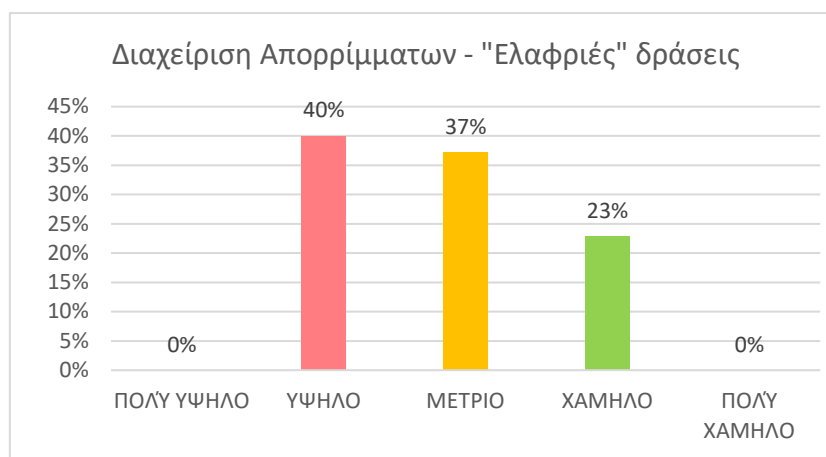Απορρίμματα – «Ελαφριές» δράσεις (Βιο-απόβλητα, Πράσινα σημεία, Ανακύκλωση)**Σχήμα 5.17: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής**


Στην περίπτωση των «ελαφριών» δράσεων της διαχείρισης απορριμμάτων, το αθροιστικό ποσοστό στην κλάση επικινδυνότητας «Υψηλή» ανέρχεται σε 40%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Χαμηλή» είναι 23%. Πρόκειται για μικρές δράσεις προμηθειών, ως επί τω πλείστο, στις οποίες η μετάβαση σε ανώτερη κλάση επικινδυνότητας από την «Μέτρια» οφείλεται σε κριτήρια σχετικά με το φορέα υλοποίησης. Σημειώνεται ότι στην «Υψηλή» κλάση επικινδυνότητας περιλαμβάνονται 13 δράσεις (σε σύνολο 14) οι οποίες σύμφωνα με την 4^η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στο πρόγραμμα της ΠΠ2014-2020.

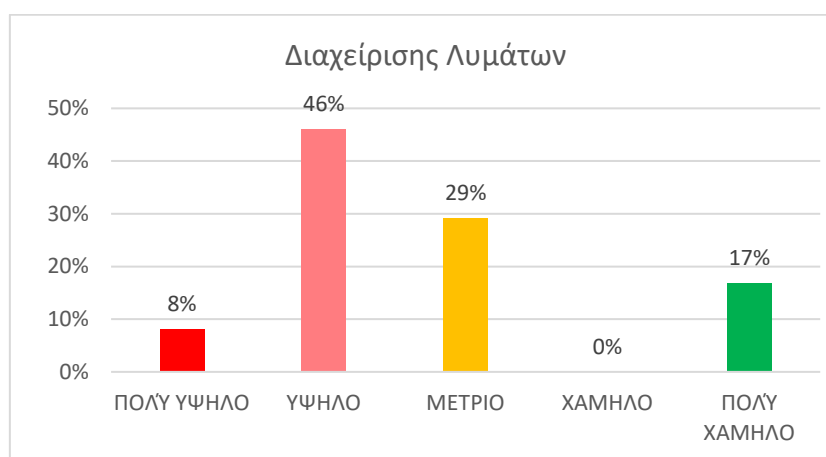➤ **Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Διαχείρισης Λυμάτων**Λύματα**Σχήμα 5.18: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής**

Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» ανέρχεται σε 54%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Πολύ Χαμηλή» είναι 17% στην οποία έχουν περιληφθεί κυρίως τα έργα με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο. Η πλειοψηφία των έργων, ανεξάρτητα από την φάση του κύκλου υλοποίησης που βρίσκεται, κατατάσσεται στις πιο υψηλές κλάσεις επικινδυνότητας, εμφανίζοντας μια εγγενή επικινδυνότητα που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο είδος, το μέγεθος, καθυστερήσεις στην προετοιμασία τους, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στην διαχείρισή τους. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.


➤ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Υδατικών πόρων

Υδρευση – Αφαλάτωση (υποδομές)

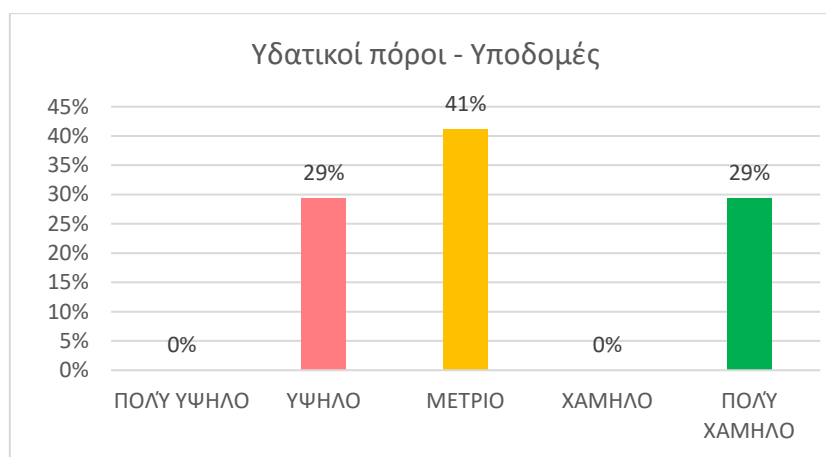


Σχήμα 5.19: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής

Το μεγαλύτερο μέρος των ενταγμένων έργων κατατάσσεται στην «Μέτρια» κλάση και ανέρχεται σε 41%, ενώ παράλληλα το ποσοστό για την κλάση επικινδυνότητας «Πολύ Χαμηλή» είναι 29% στην οποία έχουν περιληφθεί κυρίως τα έργα με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο. Στην «Υψηλή» κλάση κατατάχθηκαν πέντε έργα κυρίως λόγω των βαθμολογιών που έλαβαν σε παράγοντες κινδύνου διαχείρισης. Δεν εντοπίζεται σημαντική επικινδυνότητα στα ενταγμένα έργα της συγκεκριμένης θεματικής περιοχής. Ωστόσο, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

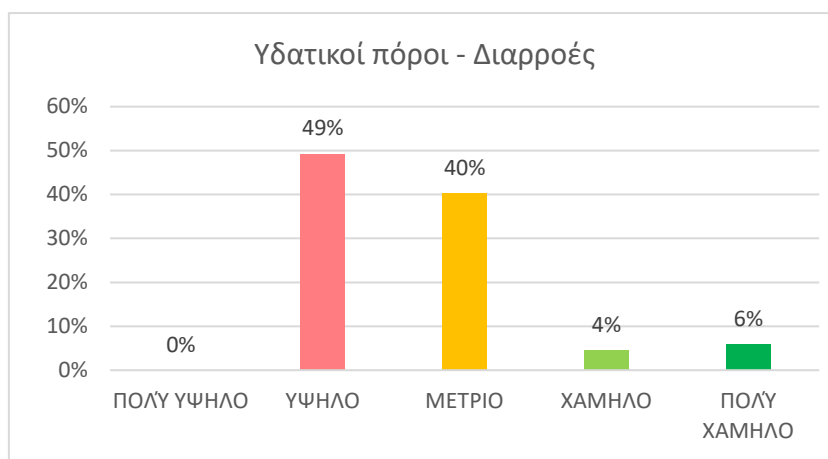Διαρροές**Σχήμα 5.20: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής**


Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε τέσσερις κλάσεις επικινδυνότητας την «Υψηλή», την «Μέτρια», την «Χαμηλή» και την «Πολύ Χαμηλή». Στην «Υψηλή» κλάση κατατάχθηκε το 49% των έργων λόγω των βαθμολογιών που έλαβαν κυρίως σε παράγοντες κινδύνου διαχείρισης και παράγοντες σχετικούς με τον φορέα υλοποίησης. Δεν εντοπίζεται σημαντική επικινδυνότητα στα ενταγμένα έργα της συγκεκριμένης θεματικής περιοχής. Ωστόσο, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

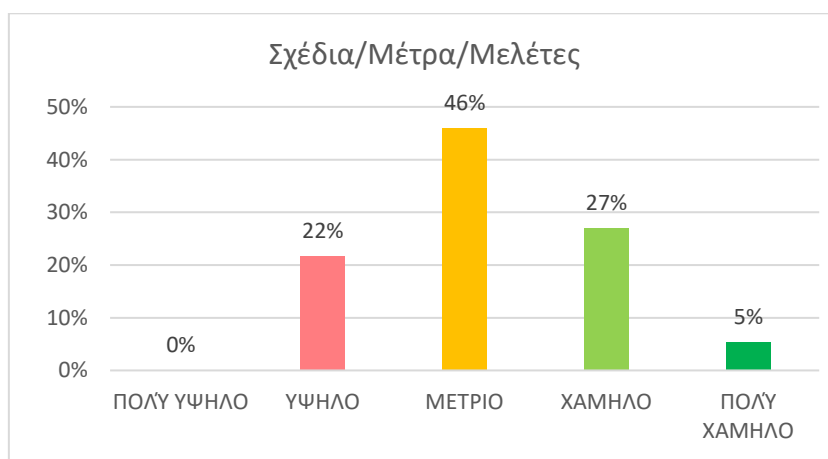➤ **Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Φύση – Αστική Αναζωογόνηση – Σχέδια / Μελέτες**Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες**Σχήμα 5.21: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής**

Το αθροιστικό ποσοστό στην «Υψηλή» κλάση ανέρχεται σε 22%, ενώ το αντίστοιχο για τις κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι 32%. Τα περισσότερα έργα περιλαμβάνονται στην «Μέτρια» κλάση. Το ποσοστό των έργων στην υψηλή κλάση οφείλεται

σε παράγοντες κινδύνου διαχείρισης, καθώς και σε παράγοντες που σχετίζονται με τον φορέα υλοποίησης τους. Παρότι με βάση το μέγεθος και το είδος των έργων θα αναμενόταν μέτρια προς χαμηλή επικινδυνότητα για το σύνολο των έργων, η αυξημένη επικινδυνότητα μέρους των ενταγμένων έργων στη παρούσα φάση καθιστά απαραίτητη την παρακολούθηση της εξέλιξής τους.


Φορείς παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών

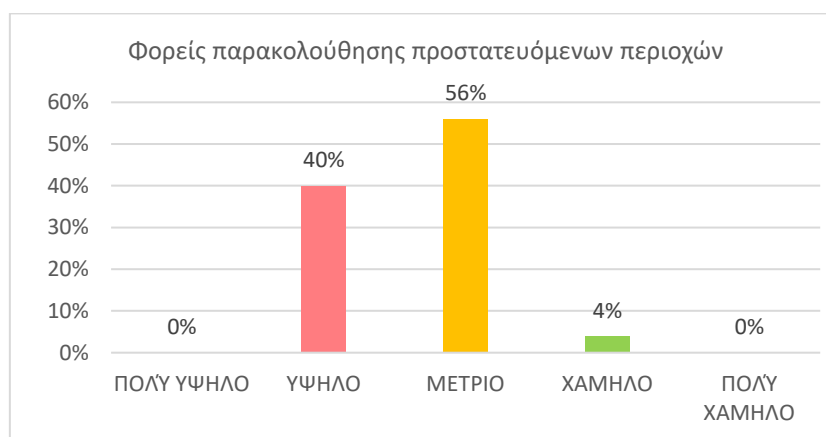

Σχήμα 5.22: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής

Το αθροιστικό ποσοστό στην «Υψηλή» κλάση ανέρχεται σε 40%, ενώ το αντίστοιχο για τις κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι μόλις 4%. Τα περισσότερα έργα περιλαμβάνονται στην «Μέτρια» κλάση. Το ποσοστό των έργων στην υψηλή κλάση οφείλεται σε παράγοντες κινδύνου διαχείρισης, καθώς και σε παράγοντες που σχετίζονται με τον φορέα υλοποίησης τους. Παρότι με βάση το μέγεθος και το είδος των έργων θα αναμενόταν μέτρια προς χαμηλή επικινδυνότητα για το σύνολο των έργων, η αυξημένη επικινδυνότητα μέρους των ενταγμένων έργων στη παρούσα φάση καθιστά απαραίτητη την παρακολούθηση της εξέλιξής τους.

Αστική Αναζωογόνηση.

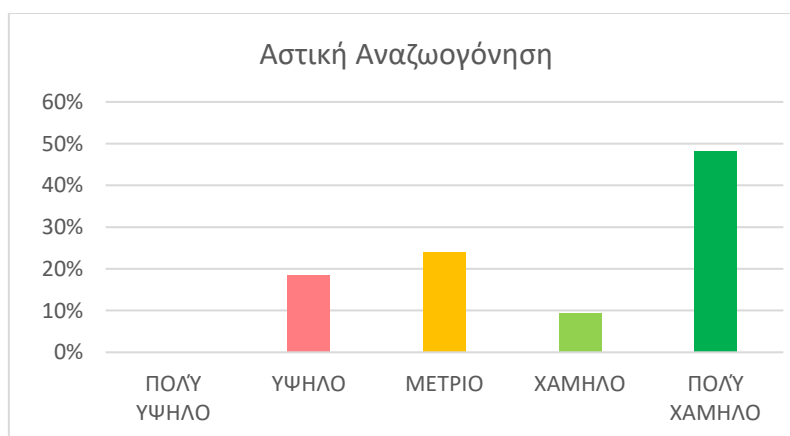

Σχήμα 5.23: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής


5.2 Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Προγραμματικών Πράξεων

Η διερεύνηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υποσυστήματος αποτίμησης κινδύνου για τα προγραμματικά έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανέδειξε τα εξής:

Τομέας Μεταφορών


➤ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Σιδηροδρομικών Μεταφορών

Σιδηροδρομικά έργα (υποδομές)

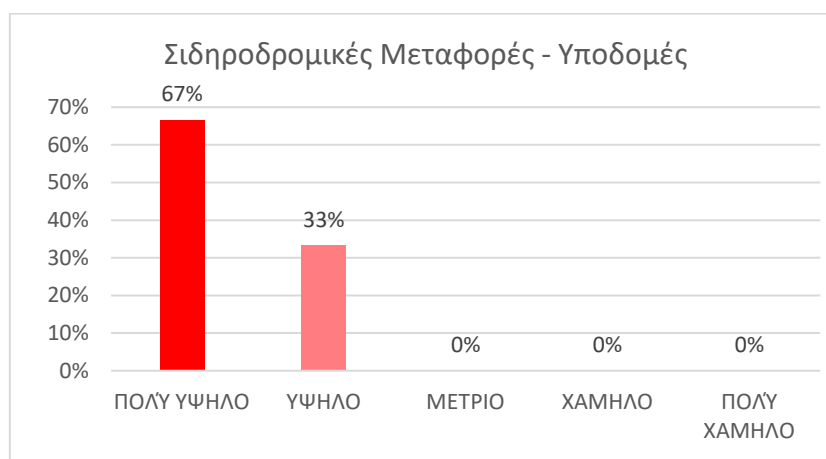


Σχήμα 5.27: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις επικινδυνότητας την «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» και την «ΥΨΗΛΗ». Πρόκειται για τρία νέα έργα που βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας τους. Με βάση τη βαθμολογία των έργων, αποτυπώνεται μια τάση Υψηλής προς Πολύ υψηλή επικινδυνότητα στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των τυχόν προβλημάτων.

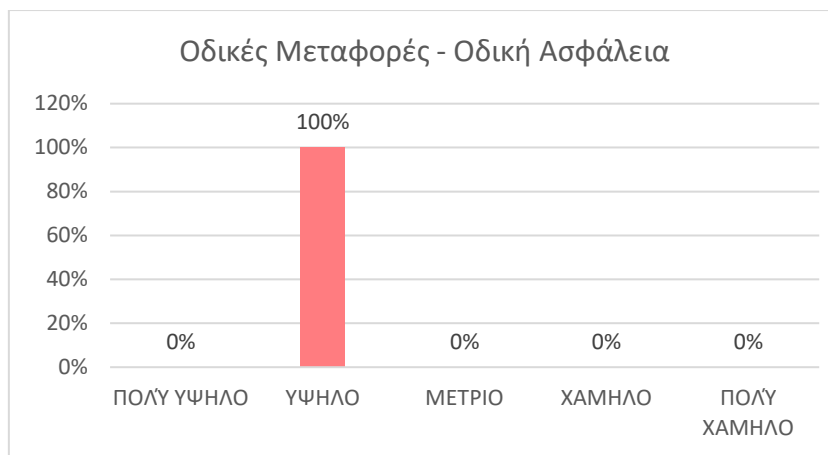➤ **Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Οδικών Μεταφορών**Οδικά έργα (Ασφάλεια)**Σχήμα 5.28: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής**

Στη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν περιληφθεί δύο έργα που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Κρήτης. Πρόκειται για μεσαίου μεγέθους παρεμβάσεις που εμφανίζουν καθυστερήσεις. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων και επίσπευση της διαδικασίας δημοπράτησης.

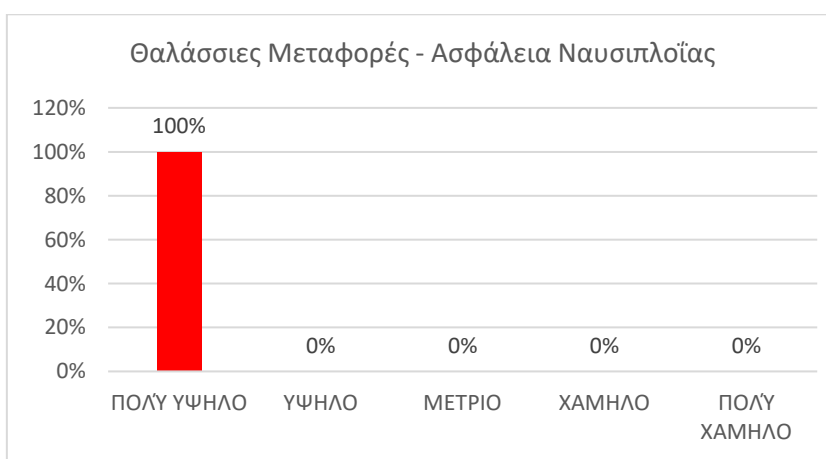
➤ **Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Θαλάσσιων Μεταφορών**Ναυσιπλοΐα (Ασφάλεια)**Σχήμα 5.29: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής**

Στη συγκεκριμένη κατηγορία έχει περιληφθεί μόνο το έργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (VTMIS)». Πρόκειται για μια αναγκαία παρέμβαση για την βελτίωση της

ασφάλειας ναυσιπλοΐας, που έχει εμφανίσει κατά το παρελθόν και συνεχίζει να εμφανίζει μεγάλες καθυστερήσεις στην προετοιμασία της. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων.


➤ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Αεροπορικών Μεταφορών

Αεροδρόμια (υποδομές)

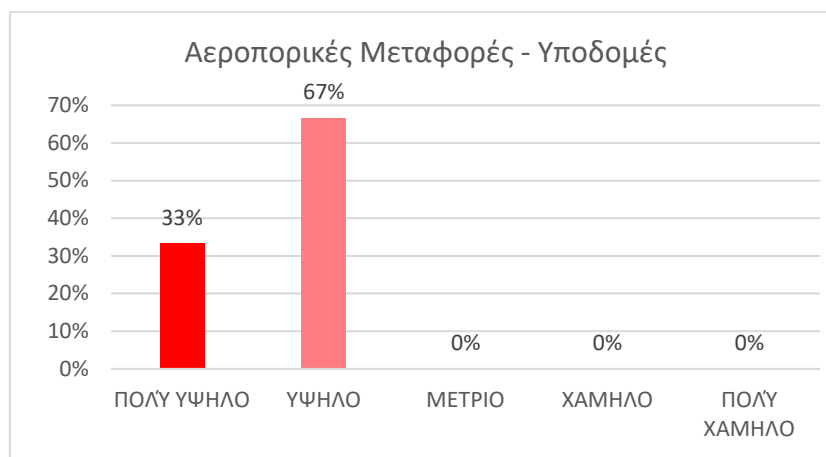


Σχήμα 5.30: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις επικινδυνότητας την «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» και την «ΥΨΗΛΗ». Πρόκειται για έξι νέα έργα που βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας. Με βάση τη βαθμολογία των έργων, αποτυπώνεται μια τάση Υψηλής προς Πολύ υψηλή επικινδυνότητα στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Μέρος της αυξημένης επικινδυνότητας οφείλεται στο πρώιμο στάδιο ωριμότητας των έργων που καθιστούν αμφίβολη την υλοποίησή τους στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των τυχόν προβλημάτων.

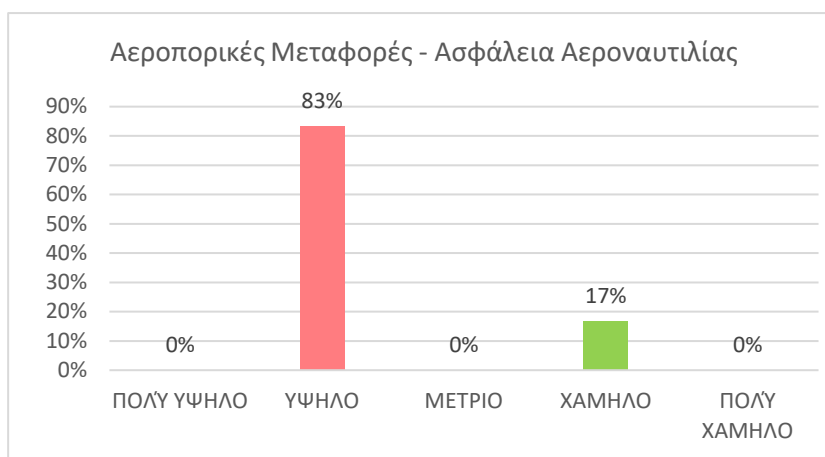Αεροναυτιλία (Ασφάλεια)**Σχήμα 5.31: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής**

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ» και την «ΧΑΜΗΛΗ». Τα περισσότερα έργα (83%) περιλαμβάνονται στην «Υψηλή» κλάση ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων στις διαδικασίες ωρίμανσης και γενικότερα κατά το στάδιο της προετοιμασίας τους. Παρότι με βάση το μέγεθος και το είδος των έργων θα αναμενόταν μέτρια επικινδυνότητα, στη παρούσα φάση απαιτείται συστηματική παρακολούθηση και η άμεση λήψη μέτρων για την επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης και δημοπράτησης.

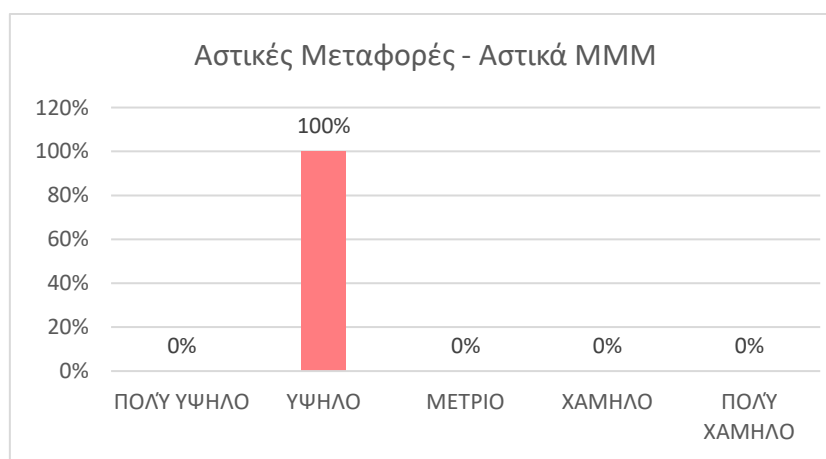➤ **Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Αστικών Μεταφορών**Λοιπά έργα Αστικών ΜΜΜ**Σχήμα 5.32: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής**


Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί στην «ΥΨΗΛΗ» κλάση επικινδυνότητας. Από τα έξι έργα ξεχωρίζουν δύο τα οποία αφορούν στην προμήθεια λεωφορείων για τα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή

και λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα που έχουν παρουσιάσει αντίστοιχες δράσεις κατά το παρελθόν, για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των τυχόν προβλημάτων.

Τομέας Περιβάλλοντος

➤ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Ενέργειας

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων

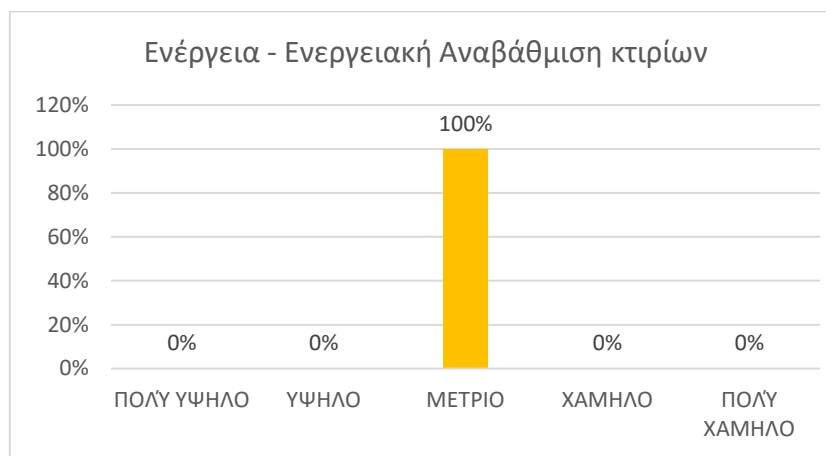


Σχήμα 5.33: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί σε μία κλάση επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ», στα οποία κατ' αντιστοιχία με τα ήδη ενταγμένα έργα αποτυπώνεται μια τάση μέτριας επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

➤ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας

Αντιπλημμυρικά (υποδομές)

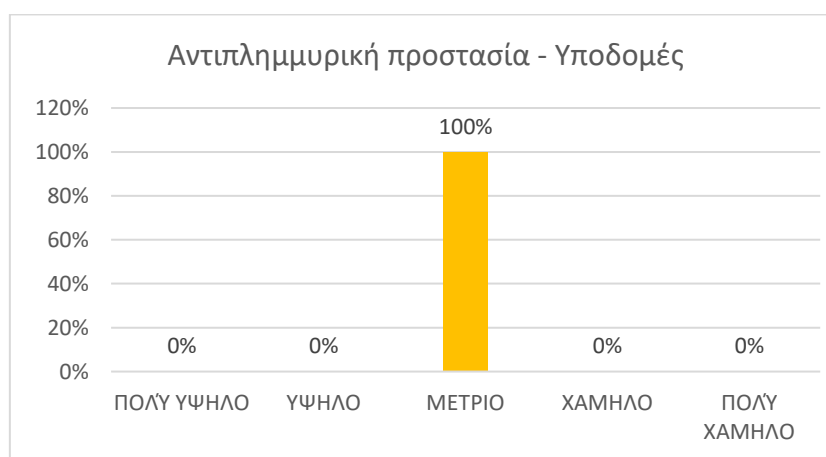


Σχήμα 5.34: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί σε μία κλάση επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ». Πρόκειται για 5 έργα τα οποία βρίσκονται είτε σε διαγωνιστική

διαδικασία, είτε στο στάδιο υπογραφής σύμβασης. Στην παρούσα χρονική στιγμή αποτυπώνεται μια τάση μέτριας επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

➤ **Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων**


Απορρίμματα – Μονάδες, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ

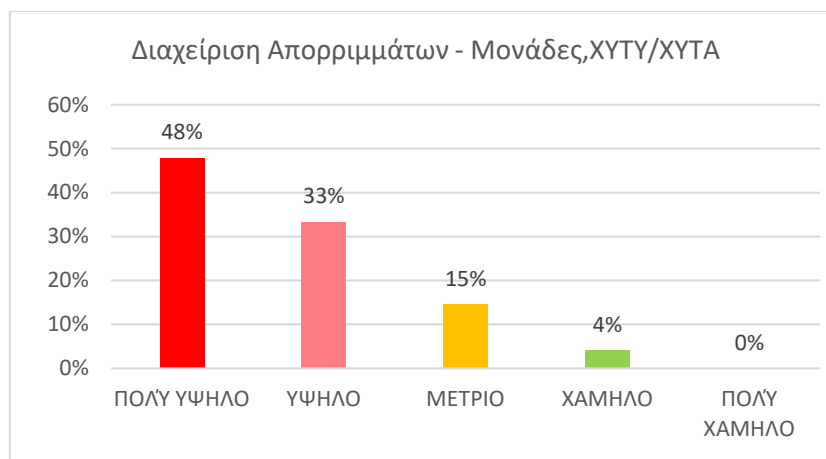

Σχήμα 5.35: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής

Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» ανέρχεται σε 67%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Χαμηλή» είναι 8%. Η πλειοψηφία των έργων, κατατάσσεται στις πιο υψηλές κλάσεις επικινδυνότητας, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην προετοιμασία τους, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στην διαχείρισή τους. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγεγραφήμενη επικινδυνότητα, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

Απορρίμματα (Βιο-απόβλητα, Πράσινα σημεία, Ανακύκλωση)

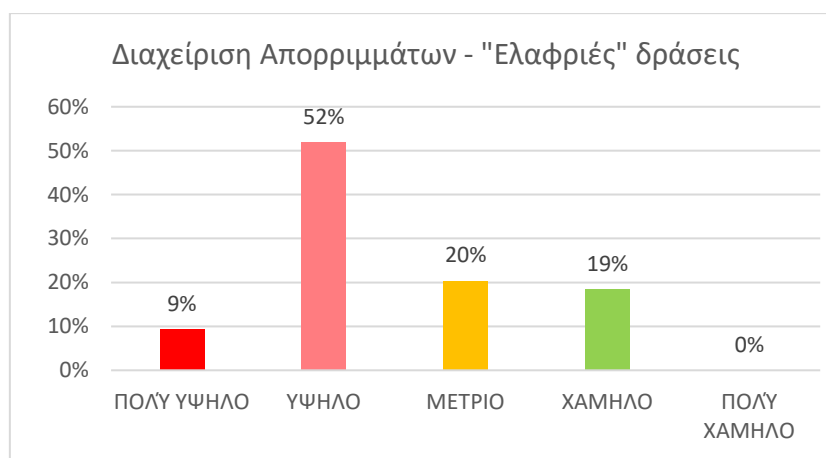


Σχήμα 5.36: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής

Στην περίπτωση των «ελαφριών» δράσεων της διαχείρισης απορριμμάτων, το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Πολύ Υψηλή» και «Υψηλή» ανέρχεται σε 61%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Χαμηλή» είναι 19%. Παρότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για μικρές δράσεις, η έλλειψη σαφώς οριοθετημένου προγραμματισμού, ειδικά στις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, καθιστούν αμφίβολη την υλοποίηση μέρους των παρεμβάσεων και κατ' επέκταση των σχετικών έργων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την 4^η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ οι δράσεις Πρασίνων σημείων δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στο πρόγραμμα της ΠΠ2014-2020. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των τυχόν προβλημάτων.


➤ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Διαχείρισης Λυμάτων

Λύματα

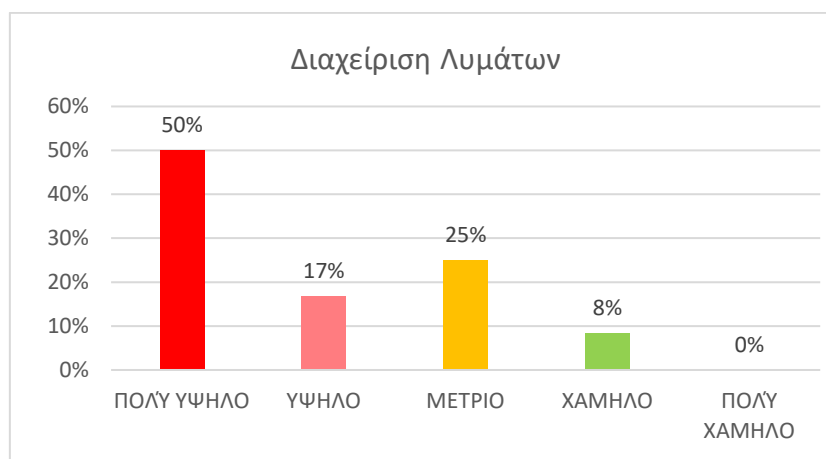


Σχήμα 5.37: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής

Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» ανέρχεται σε 67%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Χαμηλή» είναι 8%. Η πλειοψηφία των έργων, κατατάσσεται στις πιο υψηλές κλάσεις επικινδυνότητας, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην προετοιμασία τους, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στην διαχείρισή τους. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

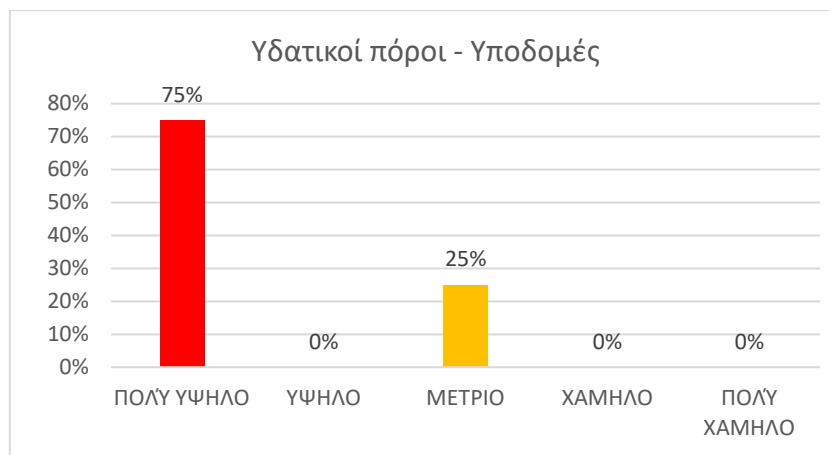
➤ **Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Υδατικών πόρων**Υδρευση – Αφαλάτωση (υποδομές)**Σχήμα 5.38: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής**

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις επικινδυνότητας την «Πολύ Υψηλή» και την «Μέτρια». Πρόκειται για τέσσερα νέα έργα που βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας. Με βάση τη βαθμολογία των έργων, αποτυπώνεται μια τάση Πολύ υψηλής επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Μέρος της αυξημένης επικινδυνότητας οφείλεται στο πρώιμο στάδιο ωριμότητα των έργων και την επιλογή να μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027, σύμφωνα με την 4^η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η θεματική περιοχή απαιτεί ιδιαίτερη παρακολούθηση τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων.

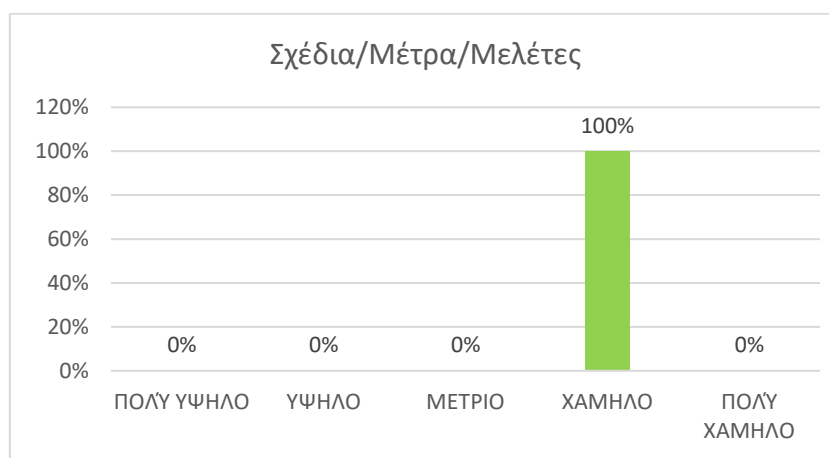➤ **Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Φύση – Αστική Αναζωογόνηση – Σχέδια / Μελέτες**Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες**Σχήμα 5.39: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής**

Το προγραμματικό έργο κατατάχθηκε στη «Χαμηλή» κλάση. Στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται κάποια σημαντική ανησυχία στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

Φορείς παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών

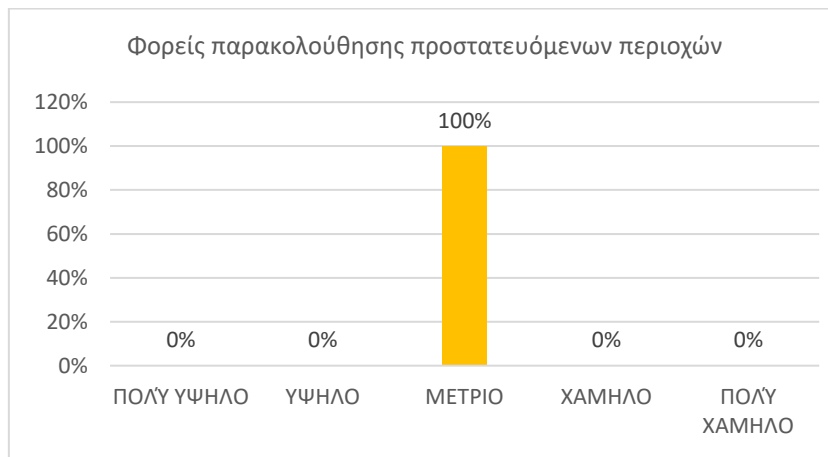


Σχήμα 5.40: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής

Οι προγραμματικές δράσεις κατατάχθηκαν στην «Μέτρια» κλάση. Στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται κάποια σημαντική ανησυχία στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

5.3 Συμπεράσματα

Για το σύνολο των ενταγμένων έργων του προγράμματος, η συνολική κατάταξη στις 5 (πέντε) κλίμακες κατηγοριοποίησης της επικινδυνότητας, από πολύ χαμηλής επικινδυνότητας έργο έως πολύ υψηλής, φαίνεται στο Σχήμα 5.1 που ακολουθεί:

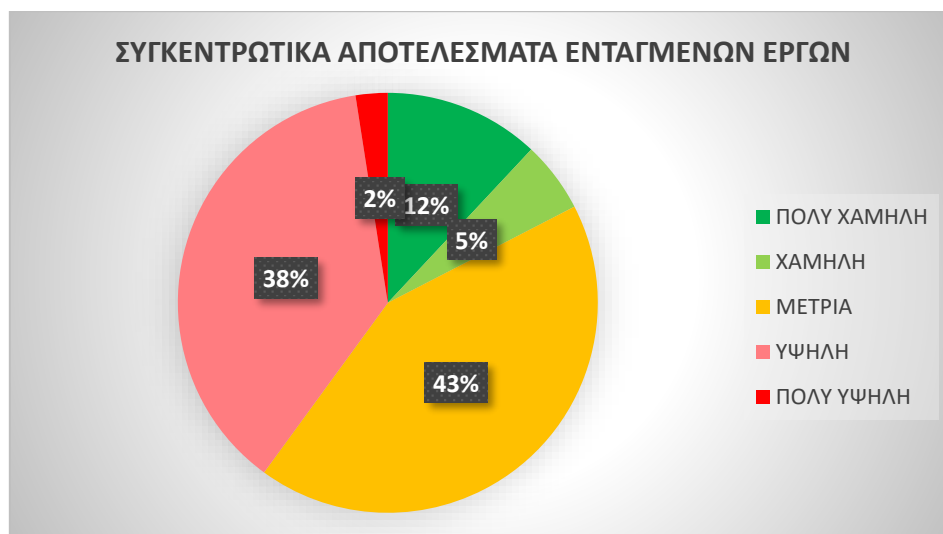


Σχήμα 5.1: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το αθροιστικό ποσοστό των έργων με κατάταξη της επικινδυνότητάς τους στις κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» είναι 17%, ενώ το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» είναι 40%.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι τα έργα που εμφανίζουν πολύ χαμηλή και χαμηλή επικινδυνότητα αφορούν είτε ολοκληρωμένα έργα, είτε μικρά έργα τα οποία κατά κύριο λόγο εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες, Διαρροές και Αστική Αναζωογόνηση. Η συγκέντρωση των έργων εντοπίζεται στις κλάσεις «ΜΕΤΡΙΑ» και «ΥΨΗΛΗ» με ποσοστό 81%, δεδομένου του μεγέθους και της φύσης των έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά τομέα:


- **Τομέας Μεταφορών**

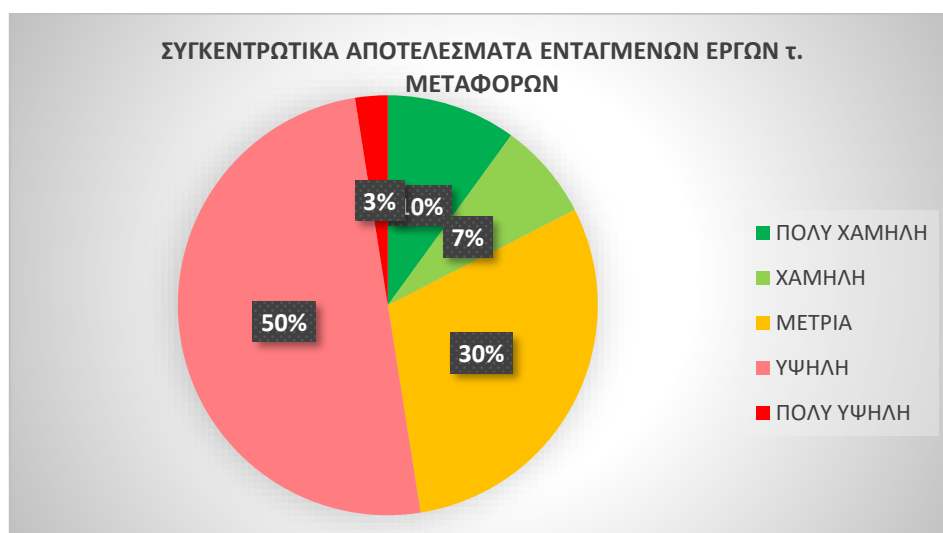

Σχήμα 5.2: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων τ. Μεταφορών

Στον τ. Μεταφορών οι κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» ανέρχονται στο 17%, ενώ οι κλάσεις «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» ανέρχονται στο 53%. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται από τις τιμές για το σύνολο του ΕΠ οφείλεται στην αυξημένη τιμή της κλάσης «ΥΨΗΛΗ». Ο τ. Μεταφορών περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο έργα υποδομών τα οποία αφενός λόγω μεγέθους και αφετέρου λόγω των ιδιαιτεροτήτων στην διαχείρισή τους εμφανίζουν αυξημένη επικινδυνότητα σε αρκετούς παράγοντες κινδύνου.


- Τομέας Περιβάλλοντος

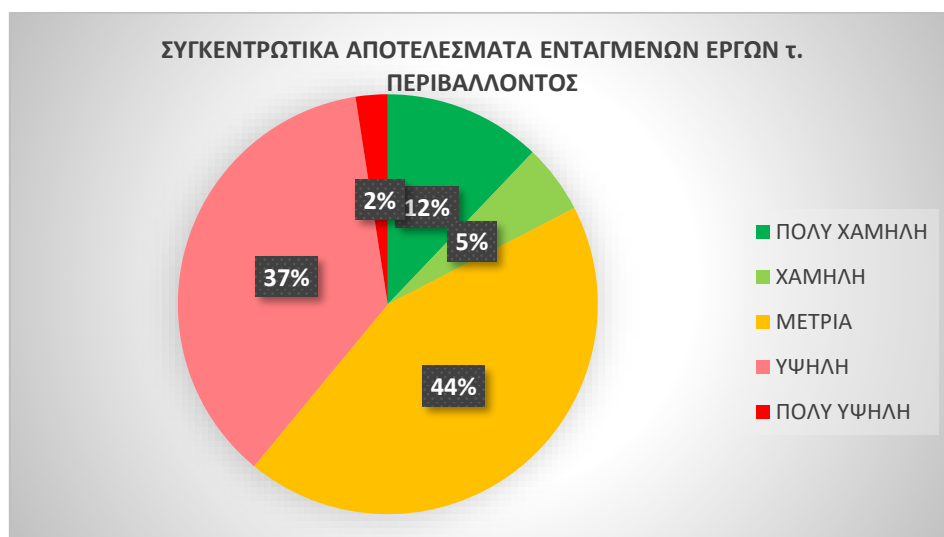

Σχήμα 5.3: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων τ. Περιβάλλοντος

Στον τ. Περιβάλλοντος οι κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» ανέρχονται επίσης στο 17%, ενώ οι κλάσεις «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ», αντίστροφα από τον τ. Μεταφορών ανέρχονται στο 39%. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται οφείλεται στην αυξημένη τιμή της κλάσης «ΜΕΤΡΙΑ», στην οποία περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο πλήθος των έργων ενεργειακής αναβάθμισης, διαρροών και αστικής αναζωογόνησης.

Για το σύνολο των προγραμματικών έργων του προγράμματος, η συνολική κατάταξη στις 5 (πέντε) κλίμακες κατηγοριοποίησης της επικινδυνότητας, από πολύ χαμηλής επικινδυνότητας έργο έως πολύ υψηλής, φαίνεται στο Σχήμα 5.24 που ακολουθεί:

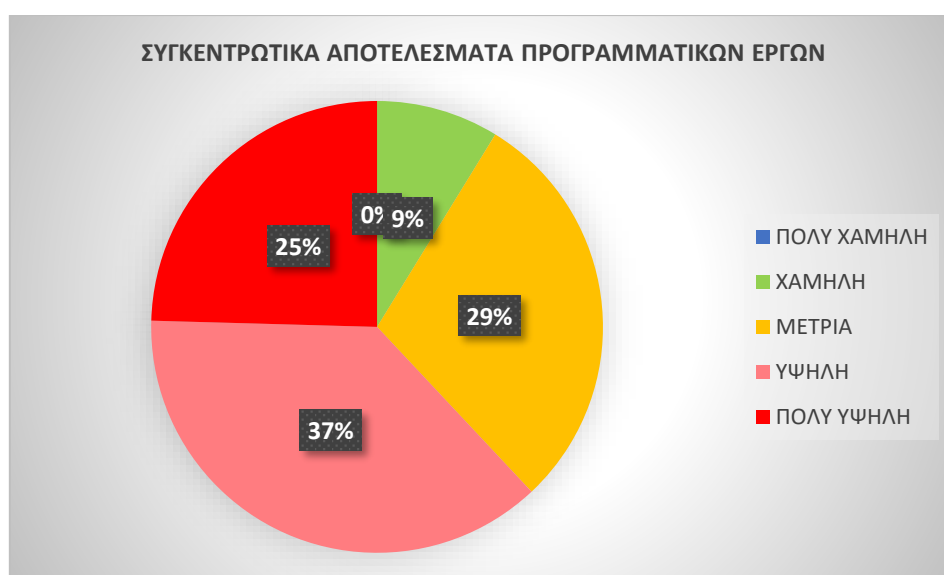


Σχήμα 5.24: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το αθροιστικό ποσοστό των έργων με κατάταξη της επικινδυνότητάς τους στις κλίμακες «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» είναι μόλις 9%, ενώ το αθροιστικό ποσοστό στις κλίμακες «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» είναι 62%.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι δεν κατατάσσονται έργα στην πολύ χαμηλή επικινδυνότητα, ενώ τα έργα που εμφανίζουν χαμηλή επικινδυνότητα αφορούν κυρίως σε μικρές παρεμβάσεις διαχείρισης Απορριμμάτων με τη δημιουργία πρασίνων σημείων. Η συγκέντρωση των έργων που εντοπίζεται στην κλίμακα «ΜΕΤΡΙΑ» αφορά κυρίως σε έργα τα οποία κατά κύριο λόγο εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές Ενεργειακές αναβαθμίσεις, Αντιπλημμυρικά και Απορρίμματα (όλες οι κατηγορίες). Τέλος στις κλίμακες «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» εμφανίζεται το 62% των έργων, που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες και πιο απαιτητικές δράσεις των δύο τομέων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά τομέα:


- **Τομέας Μεταφορών**

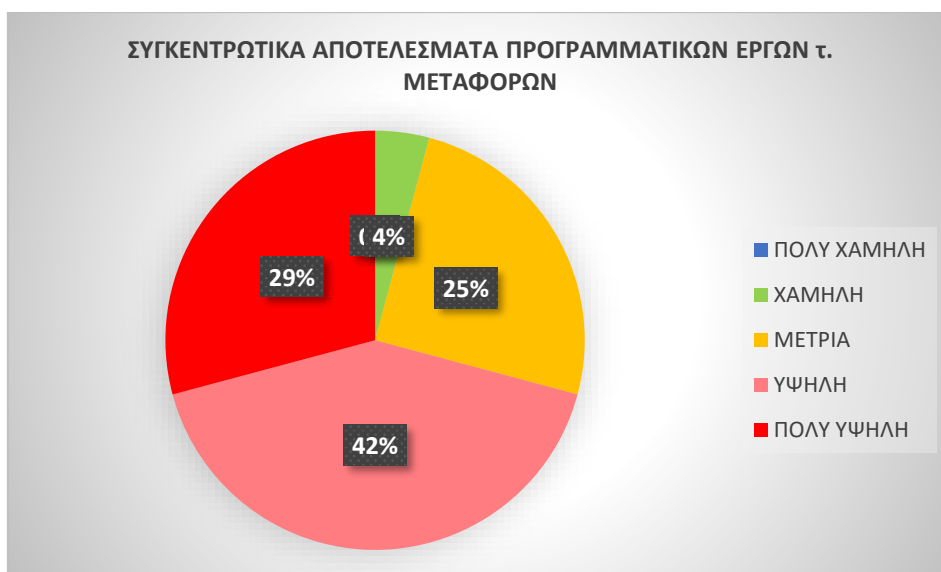

Σχήμα 5.25: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων τ. Μεταφορών

Στον τ. Μεταφορών οι κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» ανέρχονται στο 4%, περιλαμβάνοντας ένα έργο Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, ενώ οι κλάσεις «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» ανέρχονται στο 72%. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται από τις τιμές για το σύνολο του ΕΠ οφείλεται στην αυξημένη τιμή σε αυτές τις δύο κλάσεις. Ομοίως με τα ενταγμένα έργα, ο τ. Μεταφορών περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο έργα υποδομών τα οποία αφενός λόγω μεγέθους και αφετέρου λόγω των ιδιοτήτων στην προετοιμασία και τη διαχείρισή τους εμφανίζουν αυξημένη επικινδυνότητα σε αρκετούς παράγοντες κινδύνου.

- Τομέας Περιβάλλοντος

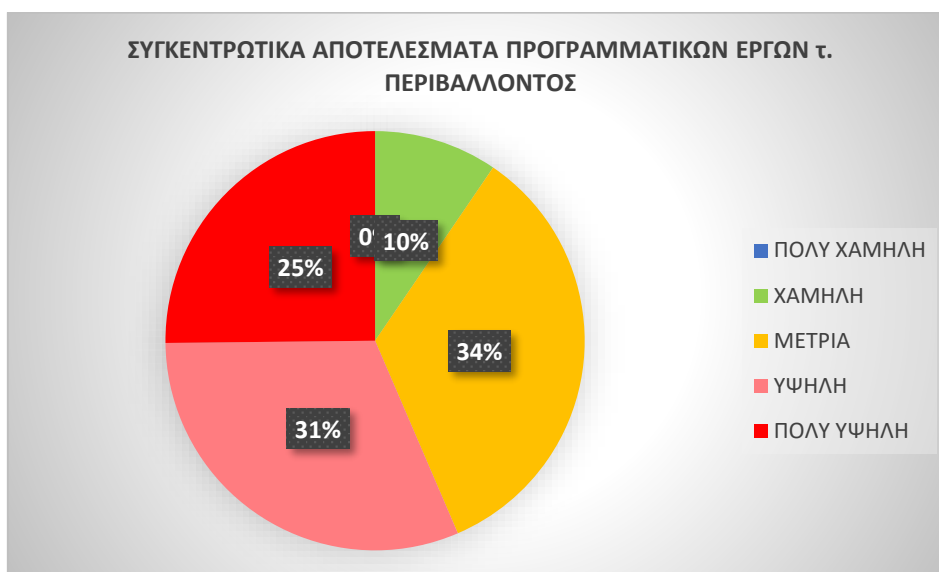

Σχήμα 5.26: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων τ. Περιβάλλοντος

Στον τ. Περιβάλλοντος οι κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» ανέρχονται επίσης στο 10%, περιλαμβάνοντας μικρές παρεμβάσεις διαχείρισης Απορριμμάτων με τη δημιουργία πρασίνων σημείων, ενώ οι κλάσεις «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ», αντίστοιχα με τον τ. Μεταφορών ανέρχονται στο 56%. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τομέων οφείλεται στην αυξημένη τιμή της κλάσης «ΜΕΤΡΙΑ», στην οποία περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο πλήθος των έργων Ενεργειακές αναβαθμίσεις, τα Αντιπλημμυρικά και μέρος των έργων Απορριμμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ σε ποσοστά ο τ. Περιβάλλοντος φαίνεται να έχει αναλογικά λιγότερα έργα στις δύο κατηγορίες, αν συγκριθούν τα απόλυτα αθροίσματα των έργων, στον τ. Μεταφορών καταγράφονται 23 έργα ενώ στον τ. Περιβάλλοντος 83.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ερωτηματολόγια & πίνακες υπολογισμού επικινδυνότητας Δικαιούχων

6.1 Ερωτηματολόγιο Στελεχών ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	
Όνομασία Φορέα:	
Είδος Φορέα:	
Συστατική Πράξη Φορέα:	
Οργανισμός / Κανονισμός Φορέα:	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ		
Όνοματεπώνυμο Στελέχους:		
Υπηρεσία του Φορέα στην οποία ανήκει:		
Στοιχεία επικοινωνίας:	Τηλέφωνο:	

Ανταπόκριση του Δικαιούχου στην επικοινωνία με την Δ.Α. - Ανταπόκριση στις απαιτήσεις της Δ.Α.	Απόκριση του Δικαιούχου στα ζητούμενα στοιχεία / διευκρινίσεις από την Δ.Α. - Τυχούσα καθυστέρηση με υπαιτιότητα του Δικαιούχου	
	Άμεση απόκριση	☐
	Καθυστέρηση μέσου βαθμού	☐
	Χαμηλή απόκριση / καθόλου απόκριση	☐
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: <i>[Συμπλήρωση εφόσον ο διαχειριστής επιθυμεί να επισημάνει κάτι]</i>		

Πίνακας Ι.1: Ερωτηματολόγιο για τα στελέχη της ΕΥΔ

6.2 Ερωτηματολόγιο Δικαιούχων των έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Στοιχεία Φορέα Υλοποίησης:						
Όνομασία Φορέα:						
Είδος Φορέα:						
Συστατική Πράξη Φορέα:						
Οργανισμός / Κανονισμός Φορέα:						
Στοιχεία Στελεχών Φορέα Υλοποίησης						
Όνοματεπώνυμο Στελεχών:						
Υπηρεσία του Φορέα στην οποία ανήκει:						
Στοιχεία επικοινωνίας:		Τηλέφωνο:	E-mail address:			
A.	Οργανωτική Δομή Φορέα	Υπηρεσίες	Αριθμός Στελεχών ανά Υπηρεσία	Αριθμός Στελεχών ΠΕ, ΤΕ	Αριθμός Στελεχών ΔΕ	Αριθμός Στελεχών με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα
		Διοικητική Υπηρεσία				
		Τεχνική Υπηρεσία				
		Οικονομική Υπηρεσία				
B.	Αποφαινόμενα Όργανα	Κατηγορίες Πράξεων	Αρμόδια Αρχή / Όργανο / Υπηρεσία		Θεσμικό πλαίσιο Ορισμού του Οργάνου	
		Τεχνικά Έργα				
		Μελέτες				
		Προμήθειες				
		Υπηρεσίες				
		Πράξεις που υλοποιούνται με Ίδια Μέσα				
Γ.	Διαδικασίες Διαχείρισης και Παρακολούθησης Πράξεων	Υπαρξη Εγχειριδίου για την υλοποίηση και την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για την παρούσα Προγραμματική Περίοδο		Υπαρξη Εγχειριδίου για την υλοποίηση και την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για την περίοδο 2007 - 2013, επικαιροποιημένο		Μη ύπαρξη Εγχειριδίου Διαχείρισης
		☐		☐		
		Απόφαση αρμοδίου Οργάνου που το θέτει σε ισχύ:		Απόφαση αρμοδίου Οργάνου που το θέτει σε ισχύ:		☐
		[Αναγραφή της απόφασης]		[Αναγραφή της απόφασης]		
Δ.	Πιστοποίηση επάρκειας φορέα από τρίτους φορείς	Υπαρξη Πιστοποιητικού σε ισχύ:		Μη ύπαρξη πιστοποιητικού σε ισχύ:		
		☐		☐		
		Φορέας Πιστοποίησης:		Ενέργειες για την απόκτηση πιστοποιητικού:		
		[Αναφορά Φορέα Πιστοποίησης]				
		Πιστοποιητικό χωρίς συστάσεις		Πιστοποιητικό με συστάσεις		
		☐		☐		[Συνοπτική αναφορά ενεργειών, εφόσον βρίσκονται σε εξέλιξη]
E.	Εμπειρία Φορέα στην Υλοποίηση Πράξεων / Έργων [Το παρόν πεδίο θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική καταγραφή των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπου θα αναφέρεται ο Π/Υ για κάθε Πράξη καθώς και το Ε.Π. στο οποίο εντάσσονται, ιδιαιτέρως για τις Πράξεις των Περιόδων 2014 - 2020 και 2007 - 2013]	Υλοποίηση Πράξεων / Έργων που συγχρηματοδοτούνται στην παρούσα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020		Υλοποίηση Πράξεων / Έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν στην Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013		Υλοποίηση Πράξεων / Έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν σε προγενέστερες Προγραμματικές Περιόδους
		Αρ. Έργων Κατασκευών:		Αρ. Έργων Κατασκευών:		Αρ. Έργων Κατασκευών:
		Συνολικός Π/Υ Έργων Κατασκευών:		Συνολικός Π/Υ Έργων Κατασκευών:		Συνολικός Π/Υ Έργων Κατασκευών:
		Αρ. Πράξεων Υπηρεσιών:		Αρ. Πράξεων Υπηρεσιών:		Αρ. Πράξεων Υπηρεσιών:
		Συνολικός Π/Υ Πράξεων Υπηρεσιών:		Συνολικός Π/Υ Πράξεων Υπηρεσιών:		Συνολικός Π/Υ Πράξεων Υπηρεσιών:
		Αρ. Πράξεων Προμηθειών:		Αρ. Πράξεων Προμηθειών:		Αρ. Πράξεων Προμηθειών:
		Συνολικός Π/Υ Πράξεων Προμηθειών:		Συνολικός Π/Υ Πράξεων Προμηθειών:		Συνολικός Π/Υ Πράξεων Προμηθειών:
		Αρ. Πράξεων που υλοποιούνται με Ίδια Μέσα:		Αρ. Πράξεων που υλοποιούνται με Ίδια Μέσα:		Αρ. Πράξεων που υλοποιούνται με Ίδια Μέσα:
		Συνολικός Π/Υ Πράξεων με Ίδια Μέσα:		Συνολικός Π/Υ Πράξεων με Ίδια Μέσα:		Συνολικός Π/Υ Πράξεων με Ίδια Μέσα:
ΣΤ.	Επάρκεια φορέα σε εξοπλισμό και πόρους	Επάρκεια εξοπλισμού, κατά την κρίση του Φορέα		Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών και συστημάτων (όπως το ΟΠΣ) από τα στελέχη του Φορέα		
		Πλήρως Επαρκής	☐	Καλή	☐	
		Αρκετά Επαρκής	☐	Μέτρια	☐	
		Καθόλου επαρκής	☐	Κακή	☐	
Z.	Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας φορέα και διασφάλιση ποιότητας εργασιών	Υπαρξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας εργασιών				
		ΝΑΙ ☐				
		ΟΧΙ ☐				
H.	Έλεγχος Πράξεων / Έργων	Υπαρξη Διαδικασιών Ελέγχου για Πράξεις / Έργα που υλοποιεί ο Φορέας	Αρμόδια Αρχή / Όργανο / Υπηρεσία ελέγχων	Θεσμικό πλαίσιο Ορισμού του Οργάνου		
		ΝΑΙ ☐				
		ΟΧΙ ☐				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν έχει διοικητική ή επιχειρησιακή επάρκεια να αναφερθεί στο πάνω ο φορέας που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, κατά περίπτωση.
Το παρόν, θα πρέπει να σταλεί προς συμπλήρωση στον φορέα που έχει αναλάβει την αρμοδιότητα

[illegible]

Πίνακας Ι.2:Ερωτηματολόγιο και πίνακες έργων δικαιούχων

6.3 Πίνακας Κατάταξης Δικαιούχων Τομέα Μεταφορών με βάση την επικινδυνότητά τους

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ/ ΑΦΜ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ.	ΤΟΜΕΑΣ	ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
10307	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΝΠΙΔ	12,07	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
1040010	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΝΠΙΔ	13,43	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
1011700	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	14,03	ΧΑΜΗΛΟ
1011377	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	20,27	ΧΑΜΗΛΟ
10409	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΝΠΙΔ	20,40	ΧΑΜΗΛΟ
1011382	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	21,00	ΧΑΜΗΛΟ
1011385	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ14ΓΓΥ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	21,00	ΧΑΜΗΛΟ
1011383	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	22,4	ΜΕΤΡΙΟ
10322	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΝΠΙΔ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
1020236	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΟΑΚ ΑΕ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΝΠΙΔ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
10318	ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΝΠΙΔ	35,23	ΥΨΗΛΟ
1012501	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	38,3	ΥΨΗΛΟ
1011378	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	41,27	ΥΨΗΛΟ
1011386	ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΥΔΕΚΣΕΣΠ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	41,27	ΥΨΗΛΟ
1011602	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	41,27	ΥΨΗΛΟ
1011802	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	41,27	ΥΨΗΛΟ
1011801	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	45,13	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
1040011	ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΝΠΙΔ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ

Πίνακας Ι.3: Πίνακας συνολικής κατάταξης Δικαιούχων Τομέα Μεταφορών

6.4 Πίνακες Κατάταξης Δικαιούχων Τομέα Περιβάλλοντος με βάση την επικινδυνότητά τους

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
40103276	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	11,87	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
40110102	ΔΗΜΟΣ ΚΩ	14,40	ΧΑΜΗΛΟ
40119177	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ	14,40	ΧΑΜΗΛΟ
40101207	ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40101208	ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40104097	ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40104100	ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105006	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105007	ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105021	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105036	ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105037	ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105057	ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105081	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105087	ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105251	ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105255	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105260	ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105266	ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40105270	ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40106264	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40107094	ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40107095	ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40108079	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40110100	ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40111097	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40112193	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40112194	ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40112198	ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40113094	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40116079	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40117226	ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40119171	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40119179	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40119180	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40120343	ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40121091	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40121092	ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40122165	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40124121	ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40125088	ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40125089	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
40128143	ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40129140	ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40129141	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40130195	ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40131192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40131193	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40131194	ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40131196	ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40135103	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40136315	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40137046	ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40141001	ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40142049	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40144171	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40144177	ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40146211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40146216	ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40149092	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40119182	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	20,53	ΧΑΜΗΛΟ
40121090	ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	21,97	ΧΑΜΗΛΟ
40105005	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	22,80	ΜΕΤΡΙΟ
40101206	ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40101209	ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40104098	ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40105253	ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40107092	ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40116078	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40117221	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40119176	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40122168	ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40128142	ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40132100	ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40133126	ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40135104	ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40136310	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40139071	ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40140079	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40148104	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40149089	ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
40107097	ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ	33,27	ΥΨΗΛΟ
40119181	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ	33,27	ΥΨΗΛΟ
40131198	ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	33,27	ΥΨΗΛΟ
40143059	ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ	33,27	ΥΨΗΛΟ
40144174	ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	33,27	ΥΨΗΛΟ
40151070	ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ	33,27	ΥΨΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
40105008	ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	37,23	ΥΨΗΛΟ
40138101	ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	37,70	ΥΨΗΛΟ
40109080	ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ	37,97	ΥΨΗΛΟ
40105254	ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	38,53	ΥΨΗΛΟ
40130192	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	38,60	ΥΨΗΛΟ
40144173	ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	38,90	ΥΨΗΛΟ
40102057	ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40102060	ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40103003	ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40103277	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105010	ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΑΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105012	ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105017	ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105019	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105020	ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105026	ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105043	ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105077	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105085	ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105247	ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105250	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105252	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105257	ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105259	ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105261	ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105262	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105267	ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105272	ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40106265	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40106266	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40106267	ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40107093	ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40107096	ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40109082	ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40110015	ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40110020	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40111099	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40112195	ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40115240	ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40115242	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40115243	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40117222	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40117223	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40117225	ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40118112	ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
40118113	ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40119178	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40119183	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40120345	ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40121003	ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40122167	ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40122169	ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40123080	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40124123	ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40126093	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40128139	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40128140	ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40128141	ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40129008	ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40129013	ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40129015	ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40129142	ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40129143	ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40130193	ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40130194	ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40133124	ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40133125	ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40135019	ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40135107	ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40136311	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40136312	ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40136313	ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40136314	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40138100	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40138102	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40139070	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40142046	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40142048	ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40143058	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40144172	ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40144175	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40145170	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40145171	ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40145172	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40145173	ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40146212	ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40146213	ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40146214	ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40146215	ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40149090	ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	41,27	ΥΨΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
40149093	ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40150189	ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40150191	ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40105042	ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40108080	ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	44,87	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40141148	ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ	45,07	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40122170	ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ	48,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40101205	ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40102058	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40102059	ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40104099	ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40105003	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40105013	ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40105018	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40105030	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40105091	ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40105244	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40105248	ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40105256	ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40105269	ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40110101	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40112196	ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40112197	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40114054	ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40115241	ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40116077	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40119172	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40119173	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40119175	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40128008	ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40129012	ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40129018	ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40129144	ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40131195	ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40134053	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40135108	ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40140080	ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40144176	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
40149091	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ

Πίνακας Ι.4: Κατάταξη των Δήμων βάσει επικινδυνότητας

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
4040103	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	14,07	ΧΑΜΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
4040101	ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	14,53	ΧΑΜΗΛΟ
4041302	ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΥΑΗ	14,67	ΧΑΜΗΛΟ
4041063	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	14,90	ΧΑΜΗΛΟ
4040143	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ	16,77	ΧΑΜΗΛΟ
4040202	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040205	ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040207	ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040302	ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040304	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕΥΑΦ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040401	ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΙΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040402	ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040403	ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040433	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040501	ΔΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040503	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040506	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040803	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4041006	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4041203	ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4041225	ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4041304	ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4041403	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4041413	ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΕΥΑΜ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40402067	ΔΕΥΑ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ (ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ)	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040293	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ	20,87	ΧΑΜΗΛΟ
4040504	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	21,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040804	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	21,50	ΧΑΜΗΛΟ
4041202	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	22,07	ΜΕΤΡΙΟ
4041305	ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ	22,53	ΜΕΤΡΙΟ
4040706	ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
4041002	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	25,27	ΜΕΤΡΙΟ
4040802	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΔΕΥΑ	33,27	ΥΨΗΛΟ
4041102	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ	33,27	ΥΨΗΛΟ
4041101	ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	37,47	ΥΨΗΛΟ
4040102	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ	40,77	ΥΨΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
4040206	ΔΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4040507	ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4040701	ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4040702	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4040787	ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4040801	ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΙΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4041004	ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4041078	ΔΕΥΑ Δ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4041083	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4041201	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4041224	ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4041301	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4041408	ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4042108	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4042109	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40402058	ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40406048	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
40408999	ΔΕΥΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ	41,27	ΥΨΗΛΟ
404020768	ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΕΥΑΕ	41,27	ΥΨΗΛΟ
404020774	ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	41,27	ΥΨΗΛΟ
4041001	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
4041005	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
4041062	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
404020796	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)	49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ

Πίνακας Ι.4: Κατάταξη των ΔΕΥΑ βάσει επικινδυνότητας

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1083613	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΝΠΔΔ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	13,37	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
6314009	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ"		13,40	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
1083623	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ		14,37	ΧΑΜΗΛΟ
1083563	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		15,97	ΧΑΜΗΛΟ
1083501	ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083504	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083507	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1083518	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083543	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083550	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083555	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083578	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣΚΑΤΑΠΠΑΥΛΟΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083582	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083586	ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083588	ΤΖΑΝΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083602	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083611	ΠΕΡΙΦΓΕΝΝΟΣΟΚΟΜΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083612	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083625	ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083633	ΝΓΝΑ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083648	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083671	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
6314026	ΨΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083682	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ		25,27	ΜΕΤΡΙΟ
1083551	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ		38,00	ΥΨΗΛΟ
1083537	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ		38,20	ΥΨΗΛΟ
1083571	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ		38,30	ΥΨΗΛΟ
1083531	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		38,47	ΥΨΗΛΟ
1083632	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		39,03	ΥΨΗΛΟ
1083655	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ ΣΩΤΗΡΙΑ		39,17	ΥΨΗΛΟ
1083517	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083535	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083548	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ 'ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ'		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083552	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083557	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083560	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083565	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083573	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083576	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083593	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083596	ΝΟΜΑΡΧΓΕΝΝΟΣΟΚΟΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΕΙΟ		41,27	ΥΨΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1083604	ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083605	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083627	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083630	ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083649	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083658	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083679	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083594	ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ		46,37	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
1083610	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ		46,77	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
1083511	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ

Πίνακας Ι.5: Κατάταξη των ΔΕΥΑ βάσει επικινδυνότητας

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1083613	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΝΠΔΔ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	13,37	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
6314009	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ"		13,40	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
1083623	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ		14,37	ΧΑΜΗΛΟ
1083563	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		15,97	ΧΑΜΗΛΟ
1083501	ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083504	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083507	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083518	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083543	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083550	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083555	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083578	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣΚΑΤΑΠΠΑΥΛΟΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083582	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083586	ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083588	ΤΖΑΝΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083602	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083611	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1083612	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083625	ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083633	ΝΓΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083648	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083671	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
6314026	ΨΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1083682	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ		25,27	ΜΕΤΡΙΟ
1083551	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ		38,00	ΥΨΗΛΟ
1083537	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ		38,20	ΥΨΗΛΟ
1083571	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ		38,30	ΥΨΗΛΟ
1083531	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		38,47	ΥΨΗΛΟ
1083632	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		39,03	ΥΨΗΛΟ
1083655	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ ΣΩΤΗΡΙΑ		39,17	ΥΨΗΛΟ
1083517	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083535	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083548	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ 'ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ'		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083552	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083557	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083560	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083565	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083573	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083576	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083593	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083596	ΝΟΜΑΡΧΓΕΝΝΟΣΟΚΟΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΕΙΟ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083604	ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083605	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083627	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083630	ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083649	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083658	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083679	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1083594	ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ		46,37	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
1083610	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ		46,77	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1083511	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ

Πίνακας Ι.6: Κατάταξη των Νοσοκομείων βάσει επικινδυνότητας

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
10115096	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΚΕΘΕ	ΝΠΔΔ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ / ΕΛΚΕ	12,87	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
1020177	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ		13,87	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
501110	ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ		14,90	ΧΑΜΗΛΟ
501101	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
501106	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
501108	ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
501109	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
501125	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
501183	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ		41,27	ΥΨΗΛΟ
501102	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
4050901	ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ

Πίνακας Ι.7: Κατάταξη των Πανεπιστημίων – ΕΛΚΕ βάσει επικινδυνότητας

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
4041066	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	ΝΠΙΔ - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΕΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	13,13	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
40406039	ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ		13,27	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
40409023	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΥΜΗΤΤΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ		13,27	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
40402079	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ		13,67	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
4040364	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ		13,97	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
4040881	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ		13,97	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
40406054	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ		14,23	ΧΑΜΗΛΟ
4040779	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ		14,37	ΧΑΜΗΛΟ
40409054	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ		15,03	ΧΑΜΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
4040494	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040655	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040781	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4040883	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4050234	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40402083	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40402090	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40402097	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40409027	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40409057	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΑΧΕΡΟΝΤΑΚΕΡΚΥΡΑΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
404020755	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
4050236	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		37,27	ΥΨΗΛΟ
4050235	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ		37,57	ΥΨΗΛΟ
1020161	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΕΘΠΖ		41,27	ΥΨΗΛΟ
4040777	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ		41,27	ΥΨΗΛΟ
4041275	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ		41,27	ΥΨΗΛΟ
4041404	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
40405003	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
40405020	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ		41,27	ΥΨΗΛΟ
4041289	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
4041290	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
4041291	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
4041292	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΟΡΑΠΑΙΚΟΥΒΕΡΜΙΟΥ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
4041294	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
4041295	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ

Πίνακας Ι.8: Κατάταξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών βάσει επικινδυνότητας

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2010004	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	13,17	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
2010011	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
18025051	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤ. ΙΟΝΙΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
2010005	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ		25,27	ΜΕΤΡΙΟ
2010007	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		25,27	ΜΕΤΡΙΟ
2010003	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
2010012	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ		41,27	ΥΨΗΛΟ
40402107	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
40405017	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
40408992	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
2010009	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
2010010	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ

Πίνακας Ι.9: Κατάταξη των Περιφερειών βάσει επικινδυνότητας

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
404020811	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΦΟΔΣΑ	12,73	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
405010	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ
40405016	ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ		17,27	ΧΑΜΗΛΟ

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
4041335	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕ ΟΤΑ ΔΕΔΙΣΑ		21,53	ΧΑΜΗΛΟ
4050615	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ

Πίνακας Ι.10: Κατάταξη των ΦΟΔΣΑ βάσει επικινδυνότητας

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1012902	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	17,27	ΧΑΜΗΛΟ
1011323	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		33,27	ΥΨΗΛΟ
1011370	ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ		33,27	ΥΨΗΛΟ
10129001	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ		33,27	ΥΨΗΛΟ
1011317	ΥΠΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1011372	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ18		41,27	ΥΨΗΛΟ
1011603	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1012900	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1012904	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
2040121	ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ		41,27	ΥΨΗΛΟ
10129140	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
101150100	ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		41,27	ΥΨΗΛΟ
1011316	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ		46,03	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
1012915	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		49,27	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ

Πίνακας Ι.11: Κατάταξη των φορέων της Δημόσιας Κεντρικής Διοίκησης που υλοποιούν έργα του τομέα Περιβάλλοντος.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πίνακες τελικής κατάταξης Ενταγμένων και Προγραμματικών έργων & Πίνακες Υπολογισμού Παραγόντων

7.1 Πίνακας Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας Ενταγμένων έργων

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Σιδηροδρομικό	1	5003002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'	Τελική Φάση	7i	024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού)	500	ΜΕΤΡΙΟ
Σιδηροδρομικό	1	5001539	Ηλεκτροκίνηση της νέας δυτλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη	Φάση Ενεργοποίησης	7i		681	ΥΨΗΛΟ
Σιδηροδρομικό	1	5003288	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ETCS LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)	Φάση Εκτέλεσης	7i		769	ΥΨΗΛΟ
Σιδηροδρομικό	1	5029467	Ηλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση - Τηλεδιόικηση, Τηλεπικοινωνίες και ETCS L1 στην υφιστάμενη Μονή Σιδηροδρομική Γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου - ΒΙΠΕ - ΣΣ Βόλου.	Φάση Ενεργοποίησης	7iii	025-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ συνολικό)	671	ΥΨΗΛΟ
Σιδηροδρομικό	1	5041829	Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS – Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη) και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης.	Φάση Ενεργοποίησης	7i	024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού)	655	ΥΨΗΛΟ
Σιδηροδρομική ασφάλεια	1	5002311	Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας	Φάση Ενεργοποίησης	7iii	024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού)	408	ΜΕΤΡΙΟ
Σιδηροδρομική ασφάλεια	1	5033652	Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση	Φάση Εκτέλεσης	7iii	025-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ συνολικό)	521	ΜΕΤΡΙΟ
Σιδηροδρομική ασφάλεια	1	5000267	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ολοκληρώθηκε	7iii	024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού)	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Σιδηροδρομική ασφάλεια	1	5002970	Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού, στην Χ.Θ. 9+184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής, στο τμήμα από Σ.Σ. Πλατέος έως Τ.Χ.1 Θεσσαλονίκης	Φάση Εκτέλεσης	7iii		538	ΥΨΗΛΟ
Οδικό	3	5050983	Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο περιοχής Καλοχωρίου	Φάση Ενεργοποίησης	7i	034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφέρει ακοί ή τοπικοί)	516	ΜΕΤΡΙΟ
Οδικό	3	5005217	Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος	Φάση Εκτέλεσης	7i	029-Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και συνολικό οδικό δίκτυο —(νέα κατασκευή)	981	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Οδικό	3	5001297	Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενσιού στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'	Ολοκληρώθηκε	7i	034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφέρει ακοί ή τοπικοί)	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Οδικό	3	5002779	Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β΄	Ολοκληρώθηκε	7i	029-Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και συνολικό οδικό δίκτυο —(νέα κατασκευή)	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Οδικό	3	5003048	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β΄	Φάση Εκτέλεσης	7i	034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφέρει ακοί ή τοπικοί)	692	ΥΨΗΛΟ
Οδικό	3	5030471	Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου – Φάση Β΄	Φάση Εκτέλεσης	7i	029-Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και συνολικό οδικό δίκτυο —(νέα κατασκευή)	748	ΥΨΗΛΟ
Οδικό	3	5033391	Κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)	Φάση Εκτέλεσης	7i		659	ΥΨΗΛΟ
Οδικό	4	5000278	ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	Τελική Φάση	7a	033-Ανακατασκευασμένη ή βελτιωμένη οδός ΔΕΔ-Μ	559	ΥΨΗΛΟ
Οδικό	4	5000393	Σύνδεση κόμβου Μουρινών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων	Φάση Εκτέλεσης	7a		685	ΥΨΗΛΟ
Οδικό	5	5001063	Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου	Φάση Εκτέλεσης	7b	034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφέρει ακοί ή τοπικοί)	696	ΥΨΗΛΟ
Οδική Ασφάλεια	3	5002771	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.	Τελική Φάση	7i	034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφέρει ακοί ή τοπικοί)	441	ΜΕΤΡΙΟ
Οδική Ασφάλεια	3	5037520	Επεμβάσεις βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στον οδικό άξονα "Πύργος- Καλό Νερό"	Φάση Ενεργοποίησης	7i		463	ΜΕΤΡΙΟ
Οδική Ασφάλεια	4	5034955	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΑΚ) / ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΧΛΑΔΑ	Φάση Εκτέλεσης	7a	033-Ανακατασκευασμένη ή βελτιωμένη οδός ΔΕΔ-Μ	582	ΥΨΗΛΟ
Λιμενικό	6	5001515	Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2΄	Ολοκληρώθηκε	7i	039-Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λιμενικό	6	5049540	Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ Φάση	Φάση Εκτέλεσης	7i		636	ΥΨΗΛΟ
Λιμενική ασφάλεια	6	5001472	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	7i	039-Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)	417	ΜΕΤΡΙΟ
Λιμενική ασφάλεια	6	5002506	Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)	Τελική Φάση	7i		421	ΜΕΤΡΙΟ
Λιμενική ασφάλεια	6	5032882	Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.	Φάση Ενεργοποίησης	7i		470	ΜΕΤΡΙΟ
Λιμενική ασφάλεια	6	5029283	Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας	Τελική Φάση	7i		380	ΧΑΜΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Αεροδρόμιο	7	5028290	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	7ii	037-Αερολιμένες (ΔΕΔ-Μ)	719	ΥΨΗΛΟ
Ασφάλεια Αεροναυτιλίας	7	5028263	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Πλοήγησης (10 DVOR, 13 DME, 6 ILS) σε Αεροδρόμια και θέσεις οριοθέτησης Αεροδιαδρόμων.	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		430	ΜΕΤΡΙΟ
Ασφάλεια Αεροναυτιλίας	7	5001079	Προμήθεια, Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		575	ΥΨΗΛΟ
Ασφάλεια Αεροναυτιλίας	7	5044992	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων, Η/Μ εξοπλισμού και Ιστών, περιφράξη εγκαταστάσεων και αναβάθμιση περιφερειακού δρόμου στη θέση "Υψάριο Θάσου"	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		543	ΥΨΗΛΟ
Ασφάλεια Αεροναυτιλίας	7	5045875	Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		583	ΥΨΗΛΟ
Ασφάλεια Αεροναυτιλίας	7	5029348	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού (MLAT) & προηγμένου συστήματος επιτήρησης, ελέγχου & καθοδήγησης (Α-SMGCS), με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας (SMR) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		397	ΧΑΜΗΛΟ
Μετρό	8	5002742	Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β΄	Φάση Εκτέλεσης	4e	043-Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)	716	ΥΨΗΛΟ
Μετρό	8	5003758	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄	Φάση Εκτέλεσης	4e		629	ΥΨΗΛΟ
Μετρό	9	5002859	Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β΄	Φάση Εκτέλεσης	4v		627	ΥΨΗΛΟ
Αστικά	9	5000660	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	4v	043-Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)	403	ΜΕΤΡΙΟ
Αστικά	9	5063431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ (πρώην ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΩΝ)	Φάση Ενεργοποίησης	4v		469	ΜΕΤΡΙΟ
Αστικά	9	5054674	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ	Φάση Ενεργοποίησης	4v		377	ΧΑΜΗΛΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5018328	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου	Φάση Ενεργοποίησης	4c	012-Άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής, της γεω-θερμικής και της θαλάσσιας) και ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής για αποθήκευση, για μετατροπή της ενέργειας σε αέριο και για παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμη πηγή)	490	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5021774	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		477	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5024911	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		503	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5026214	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ"	Φάση Ενεργοποίησης	4c		470	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5028318	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		483	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5028327	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		497	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5028732	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		494	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029208	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		483	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029258	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Δήμου Παύλου Μελά με εφαρμογή δράσεων ΕΞΕ και αξιοποίηση ΑΠΕ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		477	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029269	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ "Β. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ"	Φάση Ενεργοποίησης	4c		497	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029279	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων	Φάση Ενεργοποίησης	4c		470	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029291	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		513	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029292	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		483	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029309	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		487	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029316	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΑΚ) "ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		463	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029333	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		487	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029340	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		523	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029388	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)	Φάση Ενεργοποίησης	4c		433	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029424	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		530	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029448	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		503	ΜΕΤΡΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029451	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		510	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029465	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ»	Φάση Ενεργοποίησης	4c		507	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029466	Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγίνιου	Φάση Ενεργοποίησης	4c		477	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029468	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		517	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029470	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης"	Φάση Ενεργοποίησης	4c		523	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029477	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		497	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029479	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων "Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος"	Φάση Ενεργοποίησης	4c		494	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029512	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		421	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029516	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΑΚΙ)	Φάση Ενεργοποίησης	4c		490	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029518	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		483	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029528	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		508	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029536	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου ΑΕΘΛΙΟΝ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		477	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029537	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ.	Φάση Ενεργοποίησης	4c		510	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029547	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		494	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029554	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας	Φάση Ενεργοποίησης	4c		497	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029556	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		503	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029564	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		473	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029805	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		477	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029825	Ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Δ.Κ Αιγίου	Φάση Ενεργοποίησης	4c		494	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029828	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		514	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029855	Ενεργειακή Αναβάθμιση ΔΑΚ Γέφυρας	Φάση Ενεργοποίησης	4c		483	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029946	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών	Φάση Ενεργοποίησης	4c		500	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5030017	Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας	Φάση Ενεργοποίησης	4c		483	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5030055	ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		523	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5030056	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΑΠΕ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)	Φάση Ενεργοποίησης	4c		497	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5030061	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας "Μάρκος Φωνιαδάκης"	Φάση Ενεργοποίησης	4c		497	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5030069	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας	Φάση Ενεργοποίησης	4c		510	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5030139	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης	Φάση Ενεργοποίησης	4c		517	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5030143	Ένεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου	Φάση Ενεργοποίησης	4c		520	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5030145	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		497	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5030147	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		510	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5030246	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ ΣΟΦΑΔΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		500	ΜΕΤΡΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5031247	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		430	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5031668	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α΄ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		457	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5032683	Ενεργειακή Αναβάθμιση - Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'	Φάση Ενεργοποίησης	4c		492	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5032899	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		430	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5033819	Ενεργειακή Αναβάθμιση - Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου - ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		464	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5034539	Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί	Φάση Ενεργοποίησης	4c		434	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5035347	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο	Φάση Ενεργοποίησης	4c		462	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5037601	Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική»	Φάση Ενεργοποίησης	4c		453	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5037944	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Γ.Ν.Α. Λαϊκό	Φάση Ενεργοποίησης	4c		453	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5037947	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά "Τζάνειο"	Φάση Ενεργοποίησης	4c		507	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5038621	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ «ΚΑΤ»	Φάση Ενεργοποίησης	4c		440	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5038719	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»	Φάση Ενεργοποίησης	4c		446	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5040227	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»	Φάση Ενεργοποίησης	4c		447	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5041380	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία	Φάση Ενεργοποίησης	4c		441	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5042080	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου	Φάση Ενεργοποίησης	4c		426	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5042210	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		440	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5044871	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		445	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5044948	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»	Φάση Ενεργοποίησης	4c		441	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5045172	Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών	Φάση Ενεργοποίησης	4c		521	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5045541	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΕΡΙΓΝΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		517	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5045579	Ενεργειακή Αναβάθμιση των πανεπιστημιακών κτιρίων Π. Τσαλδάρη και προμήθεια δυο (2) αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων.	Φάση Ενεργοποίησης	4c		514	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5045827	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		465	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5047089	Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.	Φάση Ενεργοποίησης	4c		500	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5051028	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών Η Αγία Σοφία	Φάση Ενεργοποίησης	4c		440	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5056309	Α.Π.Θ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		510	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5062140	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		448	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5062142	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		479	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5001870	Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά- Β΄ Φάση	Φάση Εκτέλεσης	4c		553	ΥΨΗΛΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5009562	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	Φάση Εκτέλεσης	4c		649	ΥΨΗΛΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5027217	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων	Φάση Εκτέλεσης	4c		604	ΥΨΗΛΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029268	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων	Φάση Ενεργοποίησης	4c		531	ΥΨΗΛΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029329	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	4c		540	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029352	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		537	ΥΨΗΛΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5029524	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας	Φάση Ενεργοποίησης	4c		537	ΥΨΗΛΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5045466	Ενεργειακή αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 στον Πειραιά	Φάση Ενεργοποίησης	4c		536	ΥΨΗΛΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5045955	Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά	Φάση Ενεργοποίησης	4c		535	ΥΨΗΛΟ
Τηλεθέρμανση	10	5003923	ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Τελική Φάση	4g		510	ΜΕΤΡΙΟ
Τηλεθέρμανση	10	5037963	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV, V ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	4g	016-Συνδυασμένη παραγωγή ρεύματος και θερμότητας και τηλεθέρμανση	733	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001285	Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στη Ξερόλακκα Πατρών	Φάση Ενεργοποίησης	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	434	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5001853	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας	Τελική Φάση	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)	477	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5001923	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	503	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5002123	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		428	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5002290	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)	441	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5002300	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	485	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5002322	Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας	Φάση Ενεργοποίησης	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)	470	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5003944	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ) - Φάση Β'	Τελική Φάση	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	494	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5003948	Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού - Φάση Β'	Τελική Φάση	6i		490	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5003967	Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας - Φάση Β'	Τελική Φάση	6i		463	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5009843	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		486	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5009865	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		498	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5010594	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης	Φάση Ενεργοποίησης	6i		477	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5011456	ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		513	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5014383	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΧΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		444	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5030337	Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Κιλκίς	Φάση Ενεργοποίησης	6i		475	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5032510	ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 3ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β')	Φάση Ενεργοποίησης	6i		477	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5033127	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		410	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5037440	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑΣ)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		508	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5001432	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ	Φάση Εκτέλεσης	6i	089-Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης	812	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5010474	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	787	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001697	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Ολοκληρώθηκε	6i		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001889	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	Ολοκληρώθηκε	6i		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Απορρίμματα	14	5001895	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης	Ολοκληρώθηκε	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα	14B	5010484	Κατασκευή ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου - Φάση Β'	Ολοκληρώθηκε	6a	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001123	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - Β' Φάση	Φάση Εκτέλεσης	6i		718	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001144	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6i		699	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001154	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ	Φάση Εκτέλεσης	6i		687	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001220	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)	583	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001221	Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου	Φάση Ενεργοποίησης	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	570	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001235	Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων	Φάση Εκτέλεσης	6i		672	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001255	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6i		699	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001353	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6i		675	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001356	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)	607	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001358	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		557	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001473	ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ	Φάση Εκτέλεσης	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	652	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001681	Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6i		719	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001708	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω	Φάση Εκτέλεσης	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)	706	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001770	Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου	Φάση Εκτέλεσης	6i		641	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001777	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)	Φάση Εκτέλεσης	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	712	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001837	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6i		669	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001908	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		628	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001959	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης	Φάση Ενεργοποίησης	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)	590	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002059	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	570	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002119	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησίων	Φάση Ενεργοποίησης	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)	600	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002254	"Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κινητά πράσινα σημεία Δήμου Περιστερίου"	Φάση Ενεργοποίησης	6i		629	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002450	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	654	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002579	ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)	624	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002746	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		610	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5003338	Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης - Φάση Β'	Φάση Εκτέλεσης	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	701	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5003839	Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου (Α ΦΑΣΗ)	Φάση Εκτέλεσης	6i		712	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5004007	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β'	Φάση Εκτέλεσης	6i		673	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Απορρίμματα	14	5004118	Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας - Φάση Β'	Φάση Εκτέλεσης	6i		653	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5007242	Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών	Φάση Ενεργοποίησης	6i		547	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5009844	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		603	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5009847	Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας	Φάση Εκτέλεσης	6i		688	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5009884	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ	Φάση Εκτέλεσης	6i		740	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5010501	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	Φάση Εκτέλεσης	6i		712	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5010589	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		663	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5035327	Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		703	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5037435	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6i		646	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5045323	Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς	Φάση Ενεργοποίησης	6i	089-Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης	637	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5052057	Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.	Φάση Ενεργοποίησης	6i		603	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5052059	Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού.	Φάση Ενεργοποίησης	6i		603	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14B	5041382	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας	Φάση Ενεργοποίησης	6a	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	642	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5010905	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		399	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5003637	Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας	Φάση Ενεργοποίησης	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)	514	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5007706	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		530	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5007735	Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Κέρκυρας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		496	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5030765	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		408	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5030806	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Φλώρινας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		401	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5030897	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		401	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5030935	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		408	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5030970	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμος Καστοριάς	Φάση Ενεργοποίησης	6i		403	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5031852	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων νήσου Λέσβου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		460	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5040764	Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Σάμου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		403	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5048178	Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμο Αλίμου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		403	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5049422	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		430	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5051036	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης	Φάση Ενεργοποίησης	6i		417	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5004038	Δράσεις για την διαλογή στη Πηγή και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		570	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5007243	Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Παξών	Φάση Ενεργοποίησης	6i		568	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5007734	Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Κέρκυρας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		569	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5007736	Κατασκευή και εξοπλισμός Πράσινων Σημείων Κέρκυρας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		609	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5033059	Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Χίου	Φάση Εκτέλεσης	6i		547	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5037423	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης	Φάση Ενεργοποίησης	6i		568	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5037507	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης	Φάση Ενεργοποίησης	6i		557	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5037835	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		561	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5037844	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Θερμαϊκού	Φάση Ενεργοποίησης	6i		550	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5037845	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Χαλκηδόνας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		543	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5041968	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		554	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5041983	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Νέας Ζίχνης	Φάση Ενεργοποίησης	6i		583	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5042641	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		579	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5042914	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού	Φάση Ενεργοποίησης	6i		590	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5030709	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		381	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5030949	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΑΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		397	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5030967	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		377	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5030973	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		397	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5030977	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		377	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5033072	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ.	Φάση Ενεργοποίησης	6i		383	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5038687	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		363	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5047436	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		357	ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14	5000456	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	Τελική Φάση	6ii	022-Επεξεργασία υγρών λυμάτων	509	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5002210	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Τελική Φάση	6ii		507	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5003244	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)	Τελική Φάση	6ii		481	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5003345	Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κάτω Νευροκοπίου	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		480	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5003920	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β')	Τελική Φάση	6ii		515	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5004008	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β ΦΑΣΗ	Τελική Φάση	6ii		507	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5004021	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)	Τελική Φάση	6ii		478	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5004102	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Τελική Φάση	6ii		480	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5004104	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα	Τελική Φάση	6ii		523	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5004137	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		433	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5004195	Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		514	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5007265	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		483	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5007705	ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		473	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5007730	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		526	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5007773	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		515	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5009076	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ	Τελική Φάση	6ii		505	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5010157	ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		467	ΜΕΤΡΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Λύματα	14	5011041	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		463	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5016111	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		522	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5038606	Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνη Δήμου Μυλοποτάμου	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		473	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5040396	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		484	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5041858	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		455	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5001010	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ	Τελική Φάση	6b		468	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5002036	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Τελική Φάση	6b		463	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5002336	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Τελική Φάση	6b		489	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5002566	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	Τελική Φάση	6b		496	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5002639	Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης (Β' Φάση)	Τελική Φάση	6b		488	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5002659	ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Τελική Φάση	6b		478	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5002661	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Τελική Φάση	6b		480	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5002668	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Τελική Φάση	6b		469	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5003291	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)	Τελική Φάση	6b		441	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5003473	«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)	Τελική Φάση	6b		449	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5003521	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων (του τ. Δήμου Κομποτίου) και των οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας - Β' ΦΑΣΗ	Τελική Φάση	6b		495	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5003537	«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»	Τελική Φάση	6b		447	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5003617	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ- Β ΦΑΣΗ	Τελική Φάση	6b		474	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5003714	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	Τελική Φάση	6b		478	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5005589	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)	Τελική Φάση	6b		498	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5007244	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Β.Κ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	Τελική Φάση	6b		486	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5007594	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ -ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)	Τελική Φάση	6b		481	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14B	5009739	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Τελική Φάση	6b		429	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5003443	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Φάση Εκτέλεσης	6ii		783	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5003703	Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας Β Φάση	Φάση Εκτέλεσης	6ii		827	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5003820	Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντιρροstaσιών καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασανών του Δήμου Βόλβης - Β' Φάση	Φάση Εκτέλεσης	6ii		788	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5003926	Αποχετευτικό ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας - Β' Φάση	Φάση Εκτέλεσης	6ii		784	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004058	Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας	Φάση Εκτέλεσης	6ii		885	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004073	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώννα Δήμου Σίφνου	Φάση Εκτέλεσης	6ii		785	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5007720	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Φάση Εκτέλεσης	6ii		843	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5009753	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		832	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5009762	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		792	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5009825	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		812	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5003800	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ Β ΦΑΣΗ	Φάση Εκτέλεσης	6b		784	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5002537	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14	5002959	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝΟΥ (Β ΦΑΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Λύματα	14	5003830	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14	5004022	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14	5006302	Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5000940	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ-Β΄ ΦΑΣΗ(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5000986	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5001047	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΙΑΣΜΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5002185	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5002580	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΝΕΣΤΟΥ _ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ , ΕΡΑΤΕΙΝΟ, ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5002634	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Β ΦΑΣΗ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5002916	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5003029	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003029	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5003413	ΈΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5003520	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ α) Δ.Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, β) Δ.Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Β ΦΑΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5003630	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5003809	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5006004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ, ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -Β' ΦΑΣΗ	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5007289	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5007639	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5007717	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Β' ΦΑΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5007992	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14B	5008024	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ,ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14	5000083	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.	Φάση Εκτέλεσης	6ii		746	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5002291	Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου	Φάση Εκτέλεσης	6ii		724	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5002560	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Φάση Εκτέλεσης	6ii		679	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5003263	Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου - Θεσπιών και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)	Φάση Εκτέλεσης	6ii		718	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5003360	ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		730	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5003401	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		747	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5003524	Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Κ. Βασιλικού, Αγ. Νικολάου & Ν. Λαμπάκου Δήμου Χαλκιδέων (Β' Φάση)	Φάση Εκτέλεσης	6ii		723	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5003825	Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω	Φάση Εκτέλεσης	6ii		715	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5003853	Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα - Β' Φάση	Φάση Εκτέλεσης	6ii		769	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5003925	Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας - Β' Φάση.	Φάση Εκτέλεσης	6ii		742	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004002	Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη	Φάση Εκτέλεσης	6ii		726	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Λύματα	14	5004029	Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας - Β' Φάση	Φάση Εκτέλεσης	6ii		749	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004037	Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		671	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004044	Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας	Φάση Εκτέλεσης	6ii		687	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004048	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Β' ΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ)	Φάση Εκτέλεσης	6ii		677	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004085	Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων	Φάση Εκτέλεσης	6ii		709	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004091	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Χωριστής	Φάση Εκτέλεσης	6ii		700	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004093	Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου	Φάση Εκτέλεσης	6ii		743	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004096	Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας	Φάση Εκτέλεσης	6ii		674	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004098	Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας	Φάση Εκτέλεσης	6ii		732	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004136	Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά	Φάση Εκτέλεσης	6ii		710	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004184	Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης	Φάση Εκτέλεσης	6ii		682	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004186	Κατασκευή έργων αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Κύρρου	Φάση Εκτέλεσης	6ii		748	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5004201	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου Εμμανουήλ Παππά (Α Φάση)	Φάση Εκτέλεσης	6ii		722	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5006101	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά	Φάση Εκτέλεσης	6ii		656	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5007692	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		625	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5007704	Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά	Φάση Εκτέλεσης	6ii		691	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5007756	Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχής Μώλου Δ. Σκύρου	Φάση Εκτέλεσης	6ii		653	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5007769	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		683	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5007830	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού	Φάση Εκτέλεσης	6ii		680	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5007974	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, ΒΑΤΕΡΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		720	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5008123	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ	Τελική Φάση	6ii		579	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5008909	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ	Τελική Φάση	6ii		578	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5008942	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β ΦΑΣΗ 2014-2020)	Φάση Εκτέλεσης	6ii		721	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5009784	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		760	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5009816	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		594	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5010174	ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		677	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5010808	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		728	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5010830	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		765	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5037978	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ-ΛΑΤΣΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		678	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5038731	Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		776	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5039507	Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση - Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		727	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5041661	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		621	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5045016	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		648	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Λύματα	14	5045462	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		706	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5045879	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		655	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5047363	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		615	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5048164	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ (Β' ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		617	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5001253	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Φάση Εκτέλεσης	6b		720	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5001477	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Φάση Εκτέλεσης	6b		731	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5001486	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ-Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Φάση Εκτέλεσης	6b		690	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5001904	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Φάση Εκτέλεσης	6b		755	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5001954	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ).	Φάση Εκτέλεσης	6b		731	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5003381	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Τελική Φάση	6b		533	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5003540	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	6b		757	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5003577	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003577	Φάση Εκτέλεσης	6b		743	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5003662	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6b		739	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5003813	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Φάση Εκτέλεσης	6b		745	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5003960	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ - Β' ΦΑΣΗ	Τελική Φάση	6b		543	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5007670	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Φάση Εκτέλεσης	6b		750	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5007718	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)	Φάση Εκτέλεσης	6b		774	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5007724	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού - Λιμεναρίων Θάσου - Δίκτυα Αποχέτευσης (Β' Φάση)	Τελική Φάση	6b		552	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14B	5008966	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β ΦΑΣΗ	Φάση Ενεργοποίησης	6b		594	ΥΨΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5000975	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ	Τελική Φάση	6ii	020-Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθή κευσης και διανομής)	501	ΜΕΤΡΙΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5001225	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Τελική Φάση	6ii		481	ΜΕΤΡΙΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5001348	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Τελική Φάση	6ii		455	ΜΕΤΡΙΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5001425	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		451	ΜΕΤΡΙΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5046467	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΑΝΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		430	ΜΕΤΡΙΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5046474	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΛΑΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		443	ΜΕΤΡΙΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5046733	ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		417	ΜΕΤΡΙΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5001034	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5001222	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5001341	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 300 Κ.Μ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5002547	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ- Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5007751	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΒΑΛΤΟΥ	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5001446	ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Φάση Εκτέλεσης	6ii		655	ΥΨΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5003713	ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ - Στάδιο Κατασκευή	Φάση Εκτέλεσης	6ii		779	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5003792	ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ- ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Τελική Φάση	6ii	021-Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	652	ΥΨΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5004011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	Τελική Φάση	6ii		580	ΥΨΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5007754	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΗΛΙΔΑΣ)- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Φάση Εκτέλεσης	6ii		763	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		442	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001130	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		444	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001193	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		427	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001342	"Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλέλεγχος/τηλεχειρισμός) στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Καρδίτσας και των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάμπου και Μητρόπολης"	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		445	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001352	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		425	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001409	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		407	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001433	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		439	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		439	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001496	Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Υδρευσης Δήμου Σίφνου	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		439	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001508	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΑΡΤΑΣ	Τελική Φάση	6ii		489	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Τελική Φάση	6ii		485	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001557	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		421	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001570	"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ)"	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		437	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001574	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		427	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001593	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης τηλε-ελέγχου, τηλε-χειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		409	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001664	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		445	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001673	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		427	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001680	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		407	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001687	Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		427	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001703	Σύστημα Τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		407	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001711	Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας»	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		427	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		407	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001751	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		433	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001756	Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		420	ΜΕΤΡΙΟ
Διαρροές	14	5001778	Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη	Φάση Ενεργοποίησης	6ii	480	ΜΕΤΡΙΟ	
Διαρροές	14	5001787	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii	420	ΜΕΤΡΙΟ	
Διαρροές	14	5001797	Προμήθεια και Εγκατάσταση ενιαίου συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού, μείωσης διαρροών και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Σύρου	Φάση Ενεργοποίησης	6ii	420	ΜΕΤΡΙΟ	
Διαρροές	14	5001077	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: α)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ – ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ- Α. ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ	Ολοκληρώθηκε	6ii	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ	
Διαρροές	14	5001464	Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις Δημοτικές Ενώτητες Ιαλυσού και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου	Ολοκληρώθηκε	6ii	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ	

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Διαρροές	14	5001548	Εκσυγχρονισμός - αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού - Ευξεινούπολης	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Διαρροές	14	5001771	Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λεβαδέων	Ολοκληρώθηκε	6ii		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Διαρροές	14	5001080	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		606	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001166	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		579	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001172	Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης με στόχο την ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος του Δήμου Ζηρού	Φάση Εκτέλεσης	6ii		622	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001247	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά Ακαδημία Αλικαρνασός	Φάση Εκτέλεσης	6ii		638	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001271	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		578	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001274	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		593	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001275	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		587	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001319	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		576	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001322	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		635	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001434	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		601	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001448	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		601	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001537	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		588	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001558	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας.	Φάση Εκτέλεσης	6ii		604	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001567	Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου και Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών Ύδρευσης ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ Παραλίας	Φάση Εκτέλεσης	6ii		617	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001572	Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας	Φάση Εκτέλεσης	6ii		613	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001590	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		607	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		597	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001609	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		565	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001632	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		599	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001656	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΞΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ.	Φάση Εκτέλεσης	6ii		613	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001669	Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών – Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης	Φάση Εκτέλεσης	6ii		622	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001670	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		775	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001686	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		567	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001689	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΦΑΣΗ Α	Φάση Εκτέλεσης	6ii		607	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001698	Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		573	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001709	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		600	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001714	Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο της Τροιζήνας έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου	Φάση Εκτέλεσης	6ii		613	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001718	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		640	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001741	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		653	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Διαρροές	14	5001743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		603	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001746	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		627	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001757	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		607	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001786	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		603	ΥΨΗΛΟ
Διαρροές	14	5001661	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		395	ΧΑΜΗΛΟ
Διαρροές	14	5001694	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		400	ΧΑΜΗΛΟ
Διαρροές	14	5001816	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		400	ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	11	5001066	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	Τελική Φάση	5i	087-Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	473	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	11	5044981	Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής	Φάση Ενεργοποίησης	5i		420	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	11	5051042	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας	Φάση Ενεργοποίησης	5i		423	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5022773	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό	Φάση Εκτέλεσης	6e	083-Μέτρα για την ποιότητα του αέρα	490	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5023641	Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες	Φάση Εκτέλεσης	6e		510	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5030923	Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων	Φάση Εκτέλεσης	6e		433	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5045303	Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	Φάση Ενεργοποίησης	6e		413	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	13	5001223	Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Φάση Εκτέλεσης	6d	085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή	491	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	13	5022773	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό	Φάση Εκτέλεσης	6e	083-Μέτρα για την ποιότητα του αέρα	480	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	13	5023641	Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες	Φάση Εκτέλεσης	6e		507	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	13	5030923	Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων	Φάση Εκτέλεσης	6e		433	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5001084	Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την περίοδο 2016 – 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.	Φάση Εκτέλεσης	6ii	021-Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	472	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5001095	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		464	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5001575	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		472	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5010856	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος	Φάση Εκτέλεσης	6ii		503	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5010880	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υπο-περιοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης	Φάση Εκτέλεσης	6ii		521	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5050807	2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		413	ΜΕΤΡΙΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5001143	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	13	5001152	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των τμημάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας,σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	Ολοκληρώθηκε	6b		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5001198	Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε όλη τη χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Φάση Εκτέλεσης	6d	085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή	534	ΥΨΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5030478	Επιχορήγηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρωην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ	Φάση Εκτέλεσης	6b	021-Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	594	ΥΨΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	13	5030478	Επιχορήγηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρωην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ	Φάση Εκτέλεσης	6b		574	ΥΨΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5001204	Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"	Φάση Εκτέλεσης	6ii		573	ΥΨΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5001270	ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6ii		569	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5001336	Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)	Φάση Εκτέλεσης	6ii		583	ΥΨΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5001460	Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)»	Φάση Εκτέλεσης	6ii		628	ΥΨΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5001676	«Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας»	Φάση Εκτέλεσης	6ii		560	ΥΨΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5001233	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6d	085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή	354	ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5022117	Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	Φάση Ενεργοποίησης	6d		340	ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5030268	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6d		333	ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5032948	Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)	Φάση Ενεργοποίησης	6e	083-Μέτρα για την ποιότητα του αέρα	377	ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5034814	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία	Φάση Ενεργοποίησης	6e		397	ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	12	5038588	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες	Φάση Ενεργοποίησης	6e		390	ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	13	5022117	Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	Φάση Ενεργοποίησης	6d	085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή	367	ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	13	5032948	Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)	Φάση Ενεργοποίησης	6e	083-Μέτρα για την ποιότητα του αέρα	377	ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	13	5034814	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία	Φάση Ενεργοποίησης	6e		397	ΧΑΜΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	13	5038588	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες	Φάση Ενεργοποίησης	6e		390	ΧΑΜΗΛΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5032671	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6iii	085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή	520	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5032910	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Ενεργοποίησης	6iii		403	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5032966	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		517	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033022	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		520	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033024	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6iii		516	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6iii		523	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033216	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		517	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033224	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑ-ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6iii		412	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033228	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		517	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033259	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6iii		518	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033396	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		512	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033615	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		523	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5041535	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		523	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5047786	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Φάση Ενεργοποίησης	6iii		433	ΜΕΤΡΙΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5032589	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6iii		540	ΥΨΗΛΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5032679	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		535	ΥΨΗΛΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5032753	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		552	ΥΨΗΛΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033035	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		531	ΥΨΗΛΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033173	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		548	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033233	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6iii		537	ΥΨΗΛΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033240	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		533	ΥΨΗΛΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033258	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		536	ΥΨΗΛΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033267	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού για δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		532	ΥΨΗΛΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033657	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων	Φάση Εκτέλεσης	6iii		537	ΥΨΗΛΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	5033697	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φάση Ενεργοποίησης	6iii		396	ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001267	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6iv	023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	436	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001315	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6iv	092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων	451	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001487	Πεζοπορική διαδρομή των μαστόρων της πέτρας Θυμιανών και ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Κουκουναύγιες	Φάση Εκτέλεσης	6iv	090-Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	510	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001629	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6iv		414	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001740	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Φάση Εκτέλεσης	6iv	023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	503	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001884	Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα	Φάση Εκτέλεσης	6iv	092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων	510	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001983	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν	Φάση Ενεργοποίησης	6iv	023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	417	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002026	CretAgroTech: Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου	Φάση Ενεργοποίησης	6iv	090-Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	419	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002076	Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα	Τελική Φάση	6iv	092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων	443	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002095	Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος	Φάση Ενεργοποίησης	6iv		417	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002108	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Αβεστοχωρίου	Φάση Ενεργοποίησης	6iv		409	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002117	Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο	Φάση Ενεργοποίησης	6iv	090-Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	403	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002124	Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ"	Φάση Ενεργοποίησης	6iv	023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	430	ΜΕΤΡΙΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001170	Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίτολη	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001178	Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνοικίας Αγίου Γεωργίου στην Λάρισα	Ολοκληρώθηκε	6iv	092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001210	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)	Ολοκληρώθηκε	6iv	091-Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001229	ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ	Ολοκληρώθηκε	6iv	023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001239	Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσακείου Πατρών	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001296	Αναβάθμιση διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου Συγγρού Μεθώνης	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001360	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001364	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001367	Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος "Μον Repos"	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001387	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001419	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001420	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001458	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ	Ολοκληρώθηκε	6iv	092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001470	ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Ολοκληρώθηκε	6iv	023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001524	ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001551	Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Ολγας.	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001559	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ	Ολοκληρώθηκε	6iv	091-Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001560	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001562	Παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δήμου Μήλου για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής	Ολοκληρώθηκε	6iv	023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001641	Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών	Ολοκληρώθηκε	6iv	092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001678	Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001854	ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	Ολοκληρώθηκε	6iv	023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002113	ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002125	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ	Ολοκληρώθηκε	6iv		0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002144	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Ολοκληρώθηκε	6iv	092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002155	Κατασκευή ξενώνα στο Δ.Δ.Σέρβου	Ολοκληρώθηκε	6iv	023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	0	ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001122	Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα	Φάση Εκτέλεσης	6iv		610	ΥΨΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001175	Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας	Φάση Εκτέλεσης	6iv	090-Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	584	ΥΨΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001254	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ"	Φάση Εκτέλεσης	6iv		546	ΥΨΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001373	Περιαστικό Πάρκο Επιστημών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών	Φάση Εκτέλεσης	6iv		610	ΥΨΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001611	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑ Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6iv		573	ΥΨΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001634	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α.Π.Θ. (ΤΣ)	Φάση Εκτέλεσης	6iv		554	ΥΨΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001839	Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)	Φάση Εκτέλεσης	6iv		543	ΥΨΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001867	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ	Φάση Εκτέλεσης	6iv	092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων	598	ΥΨΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001942	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ	Φάση Εκτέλεσης	6iv		539	ΥΨΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002048	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	Φάση Εκτέλεσης	6iv		597	ΥΨΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001153	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου «Γιάννης Ρίτσος»	Φάση Ενεργοποίησης	6iv	023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	393	ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001881	ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ	Φάση Ενεργοποίησης	6iv	090-Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	390	ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5001977	Παρεμβάσεις αποκατάστασης για την αξιοποίηση του Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μεγαρέων	Φάση Ενεργοποίησης	6iv	092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων	393	ΧΑΜΗΛΟ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING) 1 ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΟΓΡΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 148 ΑΤΟΜΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6iv		392	ΧΑΜΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΈΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Αστική Αναζωογόνηση	14	5002022	Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Αρχοντικό Κυρνάσιου” στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών»	Φάση Ενεργοποίησης	6iv	023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)	377	ΧΑΜΗΛΟ

7.2 Πίνακας Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας Προγραμματικών έργων

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΕΡΓΩΝ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Σιδηροδρομικό	1	1.1	GSM-R & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ, ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΙΔΟΜΕΝΗ)	Φάση Ενεργοποίησης	7i	024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού)	790	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Σιδηροδρομικό	1	1.2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΚΑ) - ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - ΡΙΟ (ΕΠΙΔΟΜΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	Φάση Ενεργοποίησης	7a		895	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Σιδηροδρομικό	2	2.1	ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΟ	Φάση Ενεργοποίησης	7a		770	ΥΨΗΛΟ
Οδική Ασφάλεια	4	4.1	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΡΕΣ (ΧΘ 36+000 - 47+300) ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)	Φάση Ενεργοποίησης	7a	034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφέρει ακοί ή τοπικοί)	763	ΥΨΗΛΟ
Οδική Ασφάλεια	4	4.2	ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΙ (ΦΟΔΕΛΕ - ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ)	Φάση Ενεργοποίησης	7a		741	ΥΨΗΛΟ
Λιμενική ασφάλεια	6	6.1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (VTMIS)	Φάση Ενεργοποίησης	7i	039-Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)	858	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμιο	7	7.10	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	7ii	037-Αερολιμένες (ΔΕΔ-Μ)	800	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμιο	7	7.11	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΗΛΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		822	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμιο	7	7.3	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ Α/Φ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ Α/Δ ΛΗΜΝΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		720	ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμιο	7	7.8	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		739	ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμιο	7	7.9	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		739	ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμιο	7	7.12	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	7ii		683	ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμια Ασφάλεια	7	7.2	ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΡΑΝΤΑΡ	Φάση Ενεργοποίησης	7ii	037-Αερολιμένες (ΔΕΔ-Μ)	765	ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμια Ασφάλεια	7	7.4	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ CNS/ATM, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FLIGHT INSPECTION SYSTEM)	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		659	ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμια Ασφάλεια	7	7.5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (MLAT/WAM) ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α/Δ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		736	ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμια Ασφάλεια	7	7.6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ (VCS)	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		768	ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμια Ασφάλεια	7	7.7	ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α/Δ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ RADAR	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		770	ΥΨΗΛΟ
Αεροδρόμια Ασφάλεια	7	7.1	DATIS – ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΟΥΣ	Φάση Ενεργοποίησης	7ii		421	ΧΑΜΗΛΟ
Αστικά	9	9.1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4v	043-Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)	736	ΥΨΗΛΟ
Αστικά	9	9.2	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ο.Σ.Τ.Ι)	Φάση Ενεργοποίησης	4v		762	ΥΨΗΛΟ
Αστικά	9	9.3	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Ο.Σ.Π.Ε)	Φάση Ενεργοποίησης	4v		735	ΥΨΗΛΟ
Αστικά	9	9.5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4v		744	ΥΨΗΛΟ
Αστικά	9	9.6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ 8ης ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4v		696	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΕΡΓΩΝ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Αστικά	9	9.7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	Φάση Ενεργοποίησης	4v		718	ΥΨΗΛΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5035491	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c	012-Άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής, της γεω-θερμικής και της θαλάσσιας) και ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής για αποθήκευση, για μετατροπή της ενέργειας σε αέριο και για παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμη πηγή)	649	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5038137	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤ4 ΚΤ5α ΚΤ5β ΚΤ5δ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		528	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5038718	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κτίρια Β' Γ' του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		532	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5038745	Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων	Φάση Ενεργοποίησης	4c		531	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5041453	Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		530	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5041778	Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Κατερίνης	Φάση Ενεργοποίησης	4c		534	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5041830	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής	Φάση Ενεργοποίησης	4c		534	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5041850	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		530	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5044769	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικών	Φάση Ενεργοποίησης	4c		528	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5044902	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο Πατησίων	Φάση Ενεργοποίησης	4c		531	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5045516	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων Εξοικονόμησης ενέργειας	Φάση Ενεργοποίησης	4c		537	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5047095	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας	Φάση Ενεργοποίησης	4c		527	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5048176	Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης	Φάση Ενεργοποίησης	4c		527	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5049216	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΜΤΥ ΤΜΑΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	4c	013-Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο στηρικτικά μέτρα	528	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5049418	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΓΝΗ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		527	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5049917	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας	Φάση Ενεργοποίησης	4c		534	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5050479	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΚοργιαλένιοΜπενάκειο ΕΕΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		524	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5051065	Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίτολης	Φάση Ενεργοποίησης	4c		531	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5052382	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας	Φάση Ενεργοποίησης	4c		537	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5052425	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	Φάση Ενεργοποίησης	4c		531	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5052612	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου	Φάση Ενεργοποίησης	4c		522	ΜΕΤΡΙΟ
Ενεργειακή Αναβάθμιση	10	5052625	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη Αγλαΐας Κυριακού	Φάση Ενεργοποίησης	4c		527	ΜΕΤΡΙΟ
Αντιτλημμυρικά	11	5032692	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ	Φάση Ενεργοποίησης	5ii	087-Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	630	ΜΕΤΡΙΟ
Αντιτλημμυρικά	11	5032695	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 18536 ΕΩΣ ΧΘ 9300 ΣΙΦΩΝ ΜΟΡΝΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	5ii		543	ΜΕΤΡΙΟ
Αντιτλημμυρικά	11	5035554	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0000 ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π ΚΗΦΙΣΟ ΕΩΣ ΧΘ 12000	Φάση Ενεργοποίησης	5ii		606	ΜΕΤΡΙΟ
Αντιτλημμυρικά	11	5046065	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0824 ΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Π ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΕΩΣ ΧΘ 8161 ΣΥΜΒΟΛΗ Ρ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ	Φάση Ενεργοποίησης	5ii		584	ΜΕΤΡΙΟ
Αντιτλημμυρικά	11	5049565	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΦΑΣΗ Β	Φάση Ενεργοποίησης	5ii		545	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5002245	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6i	018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)	626	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5002616	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΥΤΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		579	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5010434	Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων	Φάση Ενεργοποίησης	6i		541	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5036158	ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		542	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5049443	Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτίας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		594	ΜΕΤΡΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΕΡΓΩΝ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Απορρίμματα	14	14.30	Δράσεις μεταφοράς και διαχείρισης βιοαποβλήτων	Φάση Ενεργοποίησης	6i		571	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	14.38	Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (4 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		590	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα	14	5001862	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		796	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5001925	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		822	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002057	Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σκύρου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		794	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002363	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		782	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5021581	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		849	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5050818	Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Ηρακλείου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		867	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.1	ΣΜΑ ΣΕ ΚΡΗΤΗ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Δήμος Αποκωρώνου, Μαλεβίζι, 12 ΣΜΑ ΣΔΙΤ Πελοποννήσου). 6 δράσεις	Φάση Ενεργοποίησης	6i		853	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.6	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων περιοχής Δυτικής Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας - Δυτικός Τομέας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		857	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.7	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Χαλκίδα	Φάση Ενεργοποίησης	6i		860	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.8	Υλοποίηση έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Λαμία	Φάση Ενεργοποίησης	6i		842	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.9	Υλοποίηση έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Λάρισα	Φάση Ενεργοποίησης	6i		842	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.11	Υλοποίηση έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Βορ. Έβρος	Φάση Ενεργοποίησης	6i		783	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.12	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		859	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.13	ΟΕΔΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		851	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.14	Υλοποίηση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Λέσβος	Φάση Ενεργοποίησης	6i		838	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.21	ΟΕΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		871	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.22	ΜΕΒΑ Ανατολικής Αττικής	Φάση Ενεργοποίησης	6i		815	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.23	ΜΕΒΑ Δυτικής Αττικής	Φάση Ενεργοποίησης	6i		815	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.24	ΜΕΑ Σχιστού	Φάση Ενεργοποίησης	6i		909	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.25	ΜΕΑ Φυλής	Φάση Ενεργοποίησης	6i		909	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.32	ΜΕΒΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (7 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		838	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.33	Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων	Φάση Ενεργοποίησης	6i		838	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.47	ΜΕΑ-ΜΕΒ ΦΛΟΚΑ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		870	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002063	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		772	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002184	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		779	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002249	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Φάση Ενεργοποίησης	6i		661	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002257	Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μη Επικινδύνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου ΆργουςΜυκηνών	Φάση Ενεργοποίησης	6i		771	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002266	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ I ΡΕΝΤΗ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		774	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002369	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		773	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5002736	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		775	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5003655	ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		701	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΕΡΓΩΝ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Απορρίμματα	14	5010825	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (σ.σ. Βόλου)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		651	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5045594	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		753	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.5	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		768	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.10	Υλοποίηση έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Φωκίδα	Φάση Ενεργοποίησης	6i		762	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.36	Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Μονάδες Κομποστοποίησης Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		655	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.45	ΜΕΒ ΞΕΡΟΛΑΚΚΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		669	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	14.46	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ ΦΛΟΚΑ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		704	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14B	14B.8	ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6a		719	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5037854	ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		479	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα	14	5045242	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		477	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5048183	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)	Φάση Ενεργοποίησης	6i	017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο γής και ανακύκλωσης)	534	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5052679	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		510	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5053881	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		534	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.34	Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (α΄ φάση)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		528	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.35	Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (β΄ φάση)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		623	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.39	Δράσεις μεταφοράς και διαχείρισης βιοαποβλήτων (25 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		520	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.42	Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης	Φάση Ενεργοποίησης	6i		505	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.43	ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (10 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		522	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14B	14B.3	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6a		586	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14B	14B.4	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6a		642	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14B	14B.5	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων και Αστικών Αποβλήτων στο Νότιο Αιγαίο	Φάση Ενεργοποίησης	6a		649	ΜΕΤΡΙΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.2	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Αττικής - Πελοποννήσου (Μοσχάτο, Νίκαια, Ραφήνα, Ηράκλειο, Μαραθώνας, Διόνυσος, Γαλάτσι, Καισαριανή, Χαλάνδρι, Ίλιον, Σαρωνικός, Αμαρούσιο, Ελληνικό, Ανατολική Μάνη).	Φάση Ενεργοποίησης	6i		800	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.26	Δράσεις ανακύκλωσης και συλλογής βιοαποβλήτων (54 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		863	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14B	14B.6	ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6a		818	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14B	14B.9	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Κω	Φάση Ενεργοποίησης	6a		820	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14B	14B.10	Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Νήσου Ρόδου.	Φάση Ενεργοποίησης	6a		842	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5033268	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		712	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5041828	Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		689	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5042232	Δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων	Φάση Ενεργοποίησης	6i		676	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5044949	Κατασκευή Πράσινων Σημείων Δήμου Αγρινίου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		667	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5045553	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		654	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5047962	Πράσινο σημείο Δήμου Πρέβεζας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		671	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5050864	Πράσινο σημείο Δήμου Πάργας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		701	ΥΨΗΛΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΕΡΓΩΝ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5053784	Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά	Φάση Ενεργοποίησης	6i		676	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5053806	Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζίτσας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		705	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5053834	Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζηρού	Φάση Ενεργοποίησης	6i		684	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5053879	Κατασκευή "Πράσινου Σημείου" στο Δήμο Ιωαννιτών	Φάση Ενεργοποίησης	6i		682	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5053893	Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Κόνιτσας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		700	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5067645	Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στον Δήμο Καβάλας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		726	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5067690	Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στο Δήμο Ορεστιάδας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		686	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5067847	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Διδυμοτείχου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		694	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5068823	Προμήθεια κινητών πράσινων σημείων του δήμου Κομοτηνής	Φάση Ενεργοποίησης	6i		676	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5068968	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		721	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5068979	Δημιουργία Πράσινου σημείου στο Δήμο Αβδήρων	Φάση Ενεργοποίησης	6i		698	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5069031	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		726	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.3	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Γλυφάδας	Φάση Ενεργοποίησης	6i		769	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.4	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Χαϊδαρίου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		679	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.28	Δράσεις πράσινων σημείων	Φάση Ενεργοποίησης	6i		759	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.31	Δημιουργία Πράσινων Σημείων	Φάση Ενεργοποίησης	6i		768	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.40	Δράσεις πράσινων σημείων (25 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		668	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.44	ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (8 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		753	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14B	14B.1	Πράσινα Σημεία σε Δήμους Ν. Αιγαίου (Τήνος, Μύκονος, Πάρος, Κύθνος & Κώς).	Φάση Ενεργοποίησης	6a		659	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14B	14B.2	Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και έργο επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου	Φάση Ενεργοποίησης	6a		701	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14B	14B.7	ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6a		662	ΥΨΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5038180	Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμματοφόρων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Αγρινίου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		406	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5041446	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		454	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5041587	Δράσεις Διαλογής στην Πηγή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων	Φάση Ενεργοποίησης	6i		478	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5041655	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		460	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5041742	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		410	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5041752	Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμματοφόρων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου	Φάση Ενεργοποίησης	6i		422	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5048161	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		478	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5050020	Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού	Φάση Ενεργοποίησης	6i		480	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	5050210	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6i		483	ΧΑΜΗΛΟ
Απορρίμματα ΒΠ	14	14.29	Νέες Δράσεις διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	Φάση Ενεργοποίησης	6i		439	ΧΑΜΗΛΟ
Λύματα	14	5044805	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΚ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΤΚ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii	022-Επεξεργασία υγρών λυμάτων	622	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	5045314	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		537	ΜΕΤΡΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΠ	ΚΠΠ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ RISK ΕΡΓΩΝ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Λύματα	14	5051049	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		539	ΜΕΤΡΙΟ
Λύματα	14	14.17	Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμού Ερέτριας	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		792	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	14.18	Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		800	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	14.19	Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος (έργα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού)	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		808	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	14.20	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		840	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	14.27	Νέα Έργα αποχέτευσης σε οικισμούς Γ προτεραιότητας (2 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		839	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	14.37	Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Καναλακίου	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		811	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5007668	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΔ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		718	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	14.41	Προς ένταξη έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης αρ. 32 (Νέα Στύρα, Μαρτίνο)	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		732	ΥΨΗΛΟ
Λύματα	14	5049512	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΛΑΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		488	ΧΑΜΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	14.16	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii	020-Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθή κευσης και διανομής)	637	ΜΕΤΡΙΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5042936	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α' Φάση	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		903	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5045836	Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		933	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Υδρευση - Αφαλάτωση	14	5046462	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΑΝΑΒΑΛΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii		892	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες	14	5052273	2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	6ii	021-Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	461	ΧΑΜΗΛΟ
Φορέας Διαχείρισης - Φύση	14	14.15	ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΦΔΠΠ (11 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ)	Φάση Ενεργοποίησης	6iii	085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή	573	ΜΕΤΡΙΟ

7.3 Πίνακας Βαθμολογίας Παραγόντων κινδύνου για τα Ενταγμένα έργα

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
1	5000267	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5001539	Ηλεκτροκίνηση της νέας δυτλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	50	20	100	87	100	60	60	36	10	20	30	10	20	150	150
1	5002311	Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	80	20	40	0	84	20	20	30	10	20	60	30
1	5002970	Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού, στην Χ.Θ. 9+184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής, στο τμήμα από Σ.Σ. Πλατέος έως Τ.Χ.1 Θεσσαλονίκης	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	43	20	60	0	90	30	60	30	30	30	90	30
1	5003002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'	Ναι	Τελική Φάση	50	20	70	50	100	50	50	30	50	60	120	60	50	30	30	150	10
1	5003288	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ETCS LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	75	30	100	42	100	90	0	120	30	80	120	30	30	150	30
1	5029467	Ηλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση - Τηλεδιόικηση, Τηλεπικοινωνίες και ETCS L1 στην υφιστάμενη Μονή Σιδηροδρομική Γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου - ΒΙΠΕ - ΣΣ Βόλου.	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	53	60	20	80	100	80	30	60	10	20	30	10	20	150	150
1	5033652	Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	53	10	100	40	20	60	0	90	30	40	30	30	30	90	30
1	5041829	Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS – Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη) και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης.	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	55	20	100	60	100	60	0	40	10	20	30	10	20	150	150
3	5001297	Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5002771	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.	Όχι	Τελική Φάση	30	100	60	10	100	24	50	20	0	40	30	60	10	60	30	90	10
3	5002779	Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β΄	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5003048	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β΄	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	67	10	60	48	100	120	40	60	90	80	150	30	30	120	30
3	5005217	Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	88	10	100	44	100	150	100	120	150	20	30	90	30	150	150
3	5030471	Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου – Φάση Β΄	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	75	10	100	50	100	120	100	120	150	20	150	30	30	150	30
3	5033391	Κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	68	10	60	50	100	120	20	60	30	40	30	30	30	150	30
3	5037520	Επεμβάσεις βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στον οδικό άξονα "Πύργος- Καλό Νερό"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	100	100	40	0	60	10	10	30	10	20	120	30
3	5050983	Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο περιοχής Καλοχωρίου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	57	20	20	80	100	80	90	40	10	10	30	20	20	150	30
4	5000278	ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	Όχι	Τελική Φάση	50	100	60	20	100	50	50	40	50	48	90	60	10	60	30	150	10
4	5000393	Σύνδεση κόμβου Μουρινών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	53	20	100	50	40	90	20	72	60	40	90	60	30	90	30
4	5034955	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΑΚ) / ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΧΛΑΔΑ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	56	20	60	50	60	90	20	120	60	20	30	60	30	90	30
5	5001063	Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	60	20	100	50	60	90	80	69	60	60	30	30	30	150	30
6	5001472	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	40	100	20	100	20	0	40	10	20	30	10	20	90	30
6	5001515	Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2΄	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5002506	Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)	Όχι	Τελική Φάση	30	100	60	10	100	10	50	10	0	72	30	40	40	30	30	90	10
6	5029283	Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας	Όχι	Τελική Φάση	30	100	60	10	100	10	40	10	0	60	30	40	20	30	30	60	10
6	5032882	Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	40	100	20	100	40	0	80	10	10	30	10	20	150	30
6	5049540	Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ Φάση	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	69	10	60	50	40	120	20	90	30	20	30	30	30	150	30
7	5001079	Προμήθεια, Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	40	100	20	80	20	0	56	10	20	30	10	20	90	150
7	5028263	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Πλοήγησης (10 DVOR, 13 DME, 6 ILS) σε Αεροδρόμια και θέσεις οριοθέτησης Αεροδιαδρόμων.	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	60	10	10	30	10	20	120	30
7	5028290	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	70	30	100	47	100	90	20	90	30	40	90	90	30	60	30
7	5029348	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού (MLAT) & προηγμένου συστήματος επιτήρησης, ελέγχου & καθοδήγησης (A-SMGCS), με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας (SMR) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	40	20	0	60	10	20	30	30	20	60	30
7	5044992	Εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων, Η/Μ εξοπλισμού και Ιστών, περίφραξη εγκαταστάσεων και αναβάθμιση περιφερειακού δρόμου στη θέση "Υψάριο Θάσου"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	80	20	20	0	60	10	20	30	10	20	30	150
7	5045875	Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	100	10	10	30	10	20	90	150

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
8	5002742	Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β΄	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	59	40	100	50	100	120	100	60	120	40	30	90	30	150	30
8	5003758	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	57	40	100	40	100	120	0	120	30	40	60	30	30	150	30
9	5000660	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	40	100	60	80	20	0	40	10	20	30	10	20	60	30
9	5002859	Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β΄	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	61	30	100	50	100	120	0	90	30	80	30	30	30	150	30
9	5063431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ (πρώην ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΩΝ)	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	60	100	20	0	76	10	10	30	10	20	30	90
9	5054674	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΞΟΧΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΛΗΣΙΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	40	100	20	0	60	10	10	30	10	20	30	30
10	5001870	Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά- Β΄ Φάση	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	90	20	75	10	100	50	100	90	0	105	90	40	30	90	30	60	30
10	5003923	ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Ναι	Τελική Φάση	50	20	90	20	100	50	50	30	0	60	30	60	50	150	30	60	10
10	5009562	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	73	20	100	30	100	60	0	93	30	60	90	90	30	60	30
10	5018328	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	60	80	20	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5021774	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	80	20	20	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5024911	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	60	60	20	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5026214	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	20	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5027217	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	73	10	100	30	100	60	0	90	30	60	30	90	30	60	30
10	5028318	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	60	60	20	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5028327	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	60	60	40	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5028732	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	60	40	40	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5029208	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	60	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5029258	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Δήμου Παύλου Μελά με εφαρμογή δράσεων ΕΞΕ και αξιοποίηση ΑΠΕ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5029268	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	100	53	80	60	0	60	10	10	90	30	20	30	90
10	5029269	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ "Β. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	80	20	20	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5029279	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	40	20	20	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5029291	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	90	40	100	60	40	40	0	60	10	20	30	30	20	60	90
10	5029292	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	60	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5029309	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	100	100	20	60	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5029316	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΑΚ) "ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	60	20	20	0	40	10	10	30	30	20	30	90
10	5029329	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	100	10	100	40	40	30	0	60	60	20	30	90	30	30	30
10	5029333	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	100	60	80	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5029340	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	100	40	0	60	10	20	30	30	20	60	90
10	5029352	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	100	100	20	0	80	10	10	30	30	20	60	90
10	5029388	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	90	20	100	60	100	40	0	80	10	20	30	30	20	30	30
10	5029424	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	80	100	20	0	60	10	20	30	30	20	60	90
10	5029448	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	40	100	60	60	40	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5029451	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	80	60	20	0	60	10	10	60	30	20	30	90
10	5029465	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ»	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	100	60	80	60	0	40	10	10	30	30	20	60	90
10	5029466	Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγίνιου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	60	40	0	40	10	10	30	30	20	30	90
10	5029468	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	80	40	0	60	10	20	30	30	20	60	90
10	5029470	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	80	100	20	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5029477	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	80	100	40	0	40	10	10	30	30	20	30	90
10	5029479	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων "Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	60	100	40	0	40	10	20	30	30	20	30	90

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
10	5029512	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	80	60	40	0	40	10	10	30	30	20	60	30
10	5029516	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΑΚΙ)	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	40	0	40	10	10	30	30	20	60	90
10	5029518	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	80	40	0	40	10	10	30	30	20	30	90
10	5029524	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	100	80	20	0	40	10	10	60	30	20	60	90
10	5029528	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	60	100	40	0	40	10	10	30	30	20	60	90
10	5029536	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου ΑΕΘΛΙΟΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	60	20	20	0	80	10	10	30	30	20	30	90
10	5029537	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ.	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	40	60	0	80	10	10	30	30	20	60	90
10	5029547	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	60	40	40	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5029554	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	80	80	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5029556	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	100	40	0	60	10	20	30	30	20	30	90
10	5029564	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	90	20	100	60	20	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5029805	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	40	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5029825	Ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Δ.Κ Αιγίου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	60	100	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5029828	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	60	100	40	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5029855	Ενεργειακή Αναβάθμιση ΔΑΚ Γέφυρας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	80	20	40	0	60	10	20	30	30	20	30	90
10	5029946	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	70	100	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5030017	Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	60	40	20	0	60	10	10	60	30	20	30	90
10	5030055	ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	40	100	60	100	20	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5030056	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΑΠΕ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	60	100	20	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5030061	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας "Μάρκος Φωνιάδακης"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	100	60	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5030069	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	80	100	20	0	60	10	20	30	30	20	30	90
10	5030139	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	100	40	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5030143	Ένεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	100	60	100	60	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5030145	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	80	80	20	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5030147	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	80	60	40	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5030246	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ ΣΟΦΑΔΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	90	20	100	60	100	40	0	60	10	10	30	30	20	30	90
10	5031247	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	60	100	40	0	60	10	10	30	30	20	60	30
10	5031668	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α΄ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	40	100	60	100	80	0	60	10	10	30	30	20	60	30
10	5032683	Ενεργειακή Αναβάθμιση - Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	65	20	100	60	100	80	0	80	10	10	90	30	20	60	30
10	5032899	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	60	100	40	0	60	10	10	30	30	20	60	30
10	5033819	Ενεργειακή Αναβάθμιση - Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου - ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	62	20	100	60	100	80	0	60	10	10	60	30	20	60	30
10	5034539	Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	72	20	100	60	100	60	0	60	50	10	30	30	20	30	30
10	5035347	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	75	20	100	60	100	60	0	80	50	10	30	30	20	60	30
10	5037601	Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική»	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	100	60	100	60	0	60	50	10	30	30	20	60	30
10	5037944	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Γ.Ν.Α. Λαϊκό	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	69	20	100	60	100	80	0	80	10	10	30	30	20	60	30
10	5037947	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά "Τζάνειο"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	72	20	100	60	100	60	0	80	10	10	120	30	20	60	30
10	5037963	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV,Υ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	100	10	100	50	100	30	0	90	120	20	30	150	30	60	30
10	5038621	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ «ΚΑΤ»	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	100	60	100	60	0	60	10	10	30	30	20	60	30
10	5038719	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	69	20	100	60	100	80	0	60	10	10	30	30	20	60	30
10	5040227	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	72	20	100	60	100	60	0	80	10	10	30	30	20	60	30

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
10	5041380	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	60	100	60	0	60	10	10	30	30	20	60	30
10	5042080	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	69	20	100	60	100	80	0	60	10	10	30	30	20	30	30
10	5042210	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	100	60	100	60	0	60	10	10	30	30	20	60	30
10	5044871	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	65	20	100	60	100	80	0	60	10	10	30	30	20	60	30
10	5044948	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	72	20	100	60	100	60	0	60	10	10	30	30	20	60	30
10	5045172	Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	72	20	100	60	100	60	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5045466	Ενεργειακή αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 στον Πειραιά	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	77	20	100	60	100	60	0	60	10	30	30	30	20	60	90
10	5045541	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΕΡΙΓΝΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	100	40	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5045579	Ενεργειακή Αναβάθμιση των πανεπιστημιακών κτιρίων Π. Τσαλδάρη και προμήθεια δυο (2) αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων.	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	60	100	40	0	60	10	10	30	30	20	60	90
10	5045827	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	65	20	100	60	100	80	0	100	10	20	30	30	20	60	30
10	5045955	Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	75	20	100	60	100	60	0	80	10	20	30	30	20	60	90
10	5047089	Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε.	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	60	60	100	60	0	40	10	10	30	30	20	60	90
10	5051028	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	69	20	100	60	100	80	0	40	10	10	30	30	20	60	30
10	5056309	Α.Π.Θ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	100	40	0	40	10	10	30	30	20	60	90
10	5062140	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	72	20	100	60	100	60	0	82	10	10	30	30	20	60	30
10	5062142	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	66	40	100	60	100	80	0	82	10	10	30	30	20	90	30
11	5001066	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	Όχι	Τελική Φάση	10	100	73	20	100	30	50	40	0	56	90	20	50	90	30	60	10
11	5044981	Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	20	100	80	0	60	10	10	30	20	20	90	30
11	5051042	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	60	100	60	0	80	10	10	30	10	20	90	30
12	5001143	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5001198	Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε όλη τη χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	80	10	100	20	100	120	0	72	30	40	30	60	30	90	30
12	5001233	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	60	20	20	0	62	10	20	30	20	20	30	30
12	5022117	Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	20	20	20	0	60	10	20	30	20	20	30	30
12	5022773	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	60	10	100	50	20	30	0	90	30	60	30	90	30	30	30
12	5023641	Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	60	10	100	20	80	60	0	90	30	60	30	90	30	30	30
12	5030268	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	20	20	20	0	60	10	10	30	20	20	30	30
12	5030478	Επιχορήγηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρωην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	73	10	100	30	80	60	0	90	90	40	150	60	30	60	30
12	5030923	Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	60	10	100	10	20	60	0	60	30	40	30	60	30	30	30
12	5032948	Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	40	100	20	0	40	10	20	30	30	20	30	30
12	5034814	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	40	100	20	0	80	10	30	30	30	20	30	30
12	5038588	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλέργειες	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	60	100	20	0	40	10	30	30	30	20	30	30
12	5045303	Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	60	100	80	0	60	10	10	30	20	20	60	30
13	5001152	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των τμημάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5001223	Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	80	10	100	10	100	60	0	72	30	40	30	60	30	60	30
13	5022117	Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	100	20	20	0	60	10	20	30	20	20	30	30
13	5022773	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	60	10	100	20	20	30	0	90	30	60	30	90	30	30	30
13	5023641	Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	60	10	100	10	80	60	0	90	30	60	30	90	30	30	30

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
13	5030478	Επιχορήγηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρωην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	73	10	100	30	80	60	0	90	30	40	150	60	30	60	30
13	5030923	Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	60	10	100	10	20	60	0	60	30	40	30	60	30	30	30
13	5032948	Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	40	100	20	0	40	10	20	30	30	20	30	30
13	5034814	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	40	100	20	0	80	10	30	30	30	20	30	30
13	5038588	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	60	100	20	0	40	10	30	30	30	20	30	30
14	5000083	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	71	10	60	40	100	120	0	96	30	60	30	120	30	120	30
14	5000456	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	Όχι	Τελική Φάση	30	100	80	10	100	30	50	10	0	58	60	60	20	120	30	60	10
14	5000975	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ	Όχι	Τελική Φάση	50	100	60	10	100	40	50	20	0	52	30	60	10	90	30	90	10
14	5001034	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	40	20	0	46	10	20	90	40	20	60	30
14	5001077	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: α)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ – ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ- Α. ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001080	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	80	30	0	87	30	60	30	120	30	60	30
14	5001084	Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την περίοδο 2016 – 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	60	10	100	20	100	60	0	87	30	40	30	60	30	30	30
14	5001095	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	60	10	100	20	40	60	0	93	60	40	30	60	30	30	30
14	5001122	Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	76	10	100	50	100	90	0	93	30	40	150	90	30	30	30
14	5001123	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - Β' Φάση	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	70	10	100	40	100	90	20	93	150	80	60	90	30	120	30
14	5001130	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	80	20	20	0	52	10	10	90	40	20	30	30
14	5001144	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	60	10	100	20	100	90	20	27	30	40	30	90	30	150	30
14	5001153	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου «Γιάννης Ρίτσος»	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	90	20	100	60	100	40	0	18	10	20	30	30	20	30	30
14	5001154	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	60	10	100	45	100	120	0	27	60	80	120	90	30	90	30
14	5001166	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	60	30	0	27	30	60	30	120	30	60	30
14	5001170	Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουερίου στην Τρίπολη	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001172	Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης με στόχο την ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος του Δήμου Ζηρού	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	96	30	40	60	120	30	60	30
14	5001175	Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	80	10	100	46	20	60	0	96	60	40	150	90	30	30	30
14	5001178	Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνοικίας Αγίου Γεωργίου στην Λάρισα	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001193	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	42	10	30	30	40	20	60	30
14	5001204	Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	63	10	100	14	100	120	0	72	90	80	30	60	30	90	30
14	5001210	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001220	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	70	20	100	60	60	60	0	48	10	10	30	30	20	30	150
14	5001221	Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	73	20	100	40	100	40	0	48	10	20	30	30	20	120	90
14	5001222	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001225	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	Τελική Φάση	50	100	80	10	100	28	50	20	0	44	30	40	30	90	30	60	10
14	5001229	ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001235	Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος Απορριμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου Αρχαίων- Αστερουσίων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	70	10	100	20	100	90	0	96	30	60	30	90	30	60	30
14	5001239	Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσακείου Πατρών	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001247	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά Ακαδημία Αλικαρνασός	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	70	10	100	50	100	60	0	84	30	60	30	120	30	60	30
14	5001254	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ"	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	100	10	100	50	60	30	0	99	30	40	90	90	30	30	30
14	5001255	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	71	10	100	30	100	120	0	117	30	40	60	90	30	60	30

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	5001267	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	100	20	100	80	100	20	0	78	10	20	30	30	20	60	30
14	5001270	ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	63	10	100	30	100	90	0	84	120	60	30	60	30	90	30
14	5001271	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	70	10	60	50	20	60	0	84	30	60	30	120	30	30	30
14	5001274	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	40	30	0	90	30	60	30	120	30	60	30
14	5001275	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	80	30	0	90	30	60	30	120	30	30	30
14	5001285	Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στη Ξερόλακκα Πατρών	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	80	20	100	40	40	40	0	72	10	10	30	30	20	60	30
14	5001296	Αναβάθμιση διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου Συγγρού Μεθώνης	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001315	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	90	20	100	100	100	40	0	74	10	30	30	30	20	60	30
14	5001319	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	70	10	60	45	100	60	0	84	30	20	30	120	30	30	30
14	5001322	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	100	10	100	40	60	30	0	84	30	20	90	120	30	60	30
14	5001336	Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	67	10	100	18	100	60	0	105	120	60	60	60	30	90	30
14	5001341	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 300 Κ.Μ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001342	"Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλέλεγχος/τηλεχειρισμός) στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Καρδίτσας και των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάμπου και Μητρόπολης"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	54	10	20	60	40	20	60	30
14	5001348	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	Τελική Φάση	50	100	60	10	100	10	50	10	0	54	30	40	10	90	30	60	10
14	5001352	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	56	10	20	30	40	20	60	30
14	5001353	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	70	10	60	40	100	90	20	84	30	40	30	90	30	90	30
14	5001356	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	70	20	100	60	100	60	0	80	10	10	30	30	20	30	150
14	5001358	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	20	20	40	0	80	10	10	30	30	20	30	150
14	5001360	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001364	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001367	Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος "Mon Repos"	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001373	Περιαστικό Πάρκο Επιστημών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	84	10	100	50	100	90	0	87	30	40	150	90	30	30	30
14	5001387	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001409	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	40	20	0	60	10	20	30	40	20	60	30
14	5001419	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001420	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001425	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ- ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	55	20	60	65	100	60	0	64	10	20	30	30	20	60	30
14	5001432	ΕΞΥΠΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	80	10	100	40	100	60	0	96	30	60	90	90	30	90	150
14	5001433	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	36	10	20	60	40	20	60	30
14	5001434	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	54	30	60	30	120	30	60	30
14	5001440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	40	20	0	36	10	20	90	40	20	60	30
14	5001446	ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	70	10	100	50	80	90	0	54	90	20	150	90	30	60	30
14	5001448	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	54	30	60	30	120	30	60	30
14	5001458	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001460	Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)»	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	61	10	100	20	100	120	0	54	30	80	150	60	30	90	30
14	5001464	Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις Δημοτικές Ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	5001470	ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001473	ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	45	10	60	40	100	90	0	60	30	40	30	90	30	90	30
14	5001487	Πεζοπορική διαδρομή των μαστόρων της πέτρας Θυμειανών και ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Κουκουναύγιες	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	100	10	100	50	40	30	0	90	30	60	30	90	30	30	30
14	5001496	Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	36	10	20	60	40	20	60	30
14	5001508	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΑΡΤΑΣ	Όχι	Τελική Φάση	30	100	60	10	100	20	50	10	0	36	30	60	30	120	30	60	10
14	5001510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Όχι	Τελική Φάση	30	100	60	10	100	20	20	10	0	54	30	60	30	120	30	60	10
14	5001524	ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001537	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	60	30	0	54	30	60	30	120	30	60	30
14	5001548	Εκσυγχρονισμός - αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού - Ευξεινούπολης	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001551	Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Ολγας.	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001557	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	40	80	20	0	42	10	20	30	40	20	60	30
14	5001558	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας.	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	63	30	60	30	120	30	60	30
14	5001559	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001560	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001562	Παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δήμου Μήλου για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001567	Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου και Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών Ύδρευσης ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ Παραλίας	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	60	30	80	30	120	30	60	30
14	5001570	"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ)"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	60	40	100	40	0	40	10	10	60	40	20	60	30
14	5001572	Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	90	30	60	30	120	30	60	30
14	5001574	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	60	10	20	30	40	20	60	30
14	5001575	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	67	10	100	30	20	60	0	90	90	40	30	60	30	30	30
14	5001590	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	40	30	0	90	30	80	30	120	30	60	30
14	5001593	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης τηλε-ελέγχου, τηλε-χειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	68	10	20	30	40	20	30	30
14	5001600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	102	30	60	30	120	30	30	30
14	5001609	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	40	20	0	56	10	20	30	40	20	60	150
14	5001611	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑ Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	100	10	100	40	100	30	0	90	30	40	120	90	30	30	30
14	5001629	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	67	20	60	60	60	60	0	44	10	20	60	30	20	60	30
14	5001632	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	30	60	30	0	66	30	60	30	120	30	60	30
14	5001634	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α.Π.Θ. (ΤΣ)	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	75	10	100	30	60	90	0	66	30	60	90	90	30	30	30
14	5001641	Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001656	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ.	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	30	100	30	0	69	30	60	30	120	30	60	30
14	5001661	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	60	100	20	40	0	36	10	20	30	40	20	30	30
14	5001664	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	36	10	30	60	40	20	60	30
14	5001669	Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών – Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	67	10	60	33	100	60	0	96	30	60	30	120	30	60	30

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	5001670	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	96	30	60	30	120	30	60	150
14	5001673	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	40	100	20	100	20	0	40	10	20	30	40	20	60	30
14	5001676	«Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας»	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	61	10	100	30	100	120	0	60	30	60	30	60	30	120	30
14	5001678	Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001680	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	40	20	0	60	10	20	30	40	20	60	30
14	5001681	Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	76	10	100	20	100	90	20	90	30	60	30	90	30	120	30
14	5001686	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	20	20	0	60	10	30	30	40	20	60	150
14	5001687	Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	60	10	20	60	40	20	30	30
14	5001689	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΦΑΣΗ Α	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	80	30	0	90	30	60	30	120	30	60	30
14	5001694	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	40	20	0	40	10	20	30	40	20	60	30
14	5001697	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001698	Επέκταση Συστήματος Τηλεέλεγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Υδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	40	60	20	0	40	10	20	30	40	20	60	150
14	5001703	Σύστημα Τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	60	20	0	40	10	20	30	40	20	60	30
14	5001708	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	60	10	100	17	80	90	0	90	30	100	90	90	30	30	30
14	5001709	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	60	30	0	90	30	60	30	120	30	60	30
14	5001711	Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας»	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	60	10	20	30	40	20	60	30
14	5001713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	40	20	0	60	10	20	30	40	20	60	30
14	5001714	Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο της Τροιζήνας έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	90	30	60	30	120	30	60	30
14	5001718	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	90	30	40	90	120	30	60	30
14	5001740	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	100	10	100	50	20	30	0	90	30	60	30	90	30	30	30
14	5001741	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	80	10	60	50	40	60	0	60	30	80	90	120	30	60	30
14	5001743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	60	30	60	30	120	30	60	30
14	5001746	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	60	60	20	0	60	10	20	90	40	20	60	150
14	5001751	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	60	10	30	30	40	20	60	30
14	5001756	Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	60	20	0	60	10	30	30	40	20	60	30
14	5001757	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	60	10	20	60	40	20	60	150
14	5001770	Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	73	10	100	40	20	60	0	90	30	60	30	90	30	60	30
14	5001771	Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λεβαδένων	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001777	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	65	10	60	30	100	90	0	90	30	80	30	90	30	120	30
14	5001778	Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	100	20	100	100	100	20	0	60	10	10	90	40	20	30	30
14	5001786	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	100	30	0	60	30	60	30	120	30	60	30
14	5001787	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	40	10	20	30	40	20	60	30
14	5001797	Προμήθεια και Εγκατάσταση ενιαίου συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού, μείωσης διαρροών και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Σύρου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	20	0	20	10	30	30	40	20	60	30
14	5001816	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	40	20	0	40	10	20	30	40	20	60	30

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	5001837	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	80	10	100	38	80	60	0	90	30	40	90	90	30	30	30
14	5001839	Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	100	10	100	50	60	30	0	90	30	40	90	90	30	30	30
14	5001853	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας	Όχι	Τελική Φάση	50	100	60	10	100	10	10	40	0	70	30	80	30	90	30	30	10
14	5001854	ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001867	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	100	10	100	40	100	30	0	105	30	40	120	90	30	60	30
14	5001881	ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	100	20	100	80	40	20	0	40	10	30	30	30	20	30	30
14	5001884	Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	100	10	100	40	80	30	0	60	30	60	30	90	30	30	30
14	5001889	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001895	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5001908	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	63	20	60	60	100	80	30	40	10	30	30	30	20	60	150
14	5001923	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	80	20	100	40	20	40	0	40	10	20	30	30	20	60	90
14	5001942	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	60	10	100	27	100	90	0	60	30	60	30	90	30	60	30
14	5001959	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	60	100	60	0	40	10	10	30	30	20	30	150
14	5001977	Παρεμβάσεις αποκατάστασης για την αξιοποίηση του Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μεγαρέων	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	90	20	100	60	60	40	0	40	10	30	30	30	20	30	30
14	5001983	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	80	20	100	60	100	40	0	40	10	20	30	30	20	60	30
14	5002006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING) 1 ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΟΓΡΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 148 ΑΤΟΜΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	87	20	100	60	60	40	0	40	10	30	30	30	20	30	30
14	5002022	Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Αρχοντικό Κυρνάσιου” στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών»	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	80	20	100	100	20	40	0	40	10	10	30	30	20	30	30
14	5002026	CretAgroTech: Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	68	20	100	60	100	80	0	40	10	40	30	30	20	30	30
14	5002048	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	100	10	100	41	80	30	0	60	30	40	150	90	30	60	30
14	5002059	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	69	20	60	60	100	80	30	40	10	30	30	30	20	90	90
14	5002076	Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα	Όχι	Τελική Φάση	10	100	100	10	100	50	30	10	0	60	30	60	30	90	30	30	10
14	5002095	Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράικου στο Πεντελικό Όρος	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	80	20	100	60	60	60	0	60	10	20	60	30	20	30	30
14	5002108	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	87	20	100	60	60	40	0	40	20	20	30	30	20	60	30
14	5002113	ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5002117	Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	80	20	100	60	100	60	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5002119	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησίων	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	70	20	100	60	100	60	0	60	10	10	30	30	20	30	150
14	5002123	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	65	20	100	60	40	60	30	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5002124	Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	100	20	100	80	100	20	0	60	10	20	30	30	20	60	30
14	5002125	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5002144	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5002155	Κατασκευή ξενώνα στο Δ.Δ.Σέρβου	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5002210	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	75	10	100	40	40	30	0	76	60	100	50	120	30	60	10
14	5002254	"Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κινητά πράσινα σημεία Δήμου Περιστερίου"	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	40	100	80	0	76	10	20	30	30	20	60	150
14	5002290	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	20	100	20	0	74	10	20	60	30	20	30	30
14	5002291	Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	60	10	100	50	40	90	0	111	60	60	150	120	30	90	30
14	5002300	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	80	20	100	60	100	40	0	84	10	10	30	30	20	90	30
14	5002322	Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	68	20	100	80	100	60	0	72	10	10	30	30	20	60	30
14	5002450	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	80	20	100	60	100	40	0	72	10	30	30	30	20	90	150
14	5002537	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5002547	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ- Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5002560	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	54	10	20	40	40	120	0	72	150	60	60	120	30	120	30
14	5002579	ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	60	100	60	0	82	10	10	30	30	20	60	150

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	5002746	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	60	100	60	0	40	10	10	30	30	20	60	150
14	5002959	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝΟΥ (Β ΦΑΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5003244	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	93	10	100	50	50	30	0	80	60	40	50	120	30	60	10
14	5003263	Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου - Θεσπιένων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	70	10	100	44	100	90	0	120	30	60	150	120	30	60	30
14	5003338	Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης - Φάση Β'	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	90	10	100	44	100	90	0	60	90	40	150	90	30	90	30
14	5003345	Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κάτω Νευροκοπίου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	100	20	100	40	100	20	0	40	10	20	60	40	20	60	30
14	5003360	ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	73	10	100	38	100	60	0	90	30	80	30	120	30	90	30
14	5003401	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	70	10	100	40	100	90	0	90	30	60	150	120	30	120	30
14	5003443	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Β΄ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	68	10	60	50	100	90	0	90	150	100	150	120	30	90	30
14	5003524	Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Κ. Βασιλικού, Αγ. Νικολάου & Ν. Λαμψάκου Δήμου Χαλκιδέων (Β' Φάση)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	71	10	100	37	100	120	0	60	60	40	150	120	30	90	30
14	5003637	Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	72	20	100	60	40	60	0	40	10	10	60	30	20	60	90
14	5003703	Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας Β Φάση	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	70	10	100	50	100	90	0	90	120	40	150	120	30	90	90
14	5003713	ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ - Στάδιο Κατασκευή	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	56	10	100	50	100	90	20	90	60	40	150	90	30	90	30
14	5003792	ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ- ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Όχι	Τελική Φάση	50	100	57	10	100	50	50	30	10	80	150	100	50	90	30	150	10
14	5003820	Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης - Β΄Φάση	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	80	10	100	48	100	90	0	96	150	80	150	120	30	90	30
14	5003825	Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	65	10	60	43	100	90	0	96	30	60	30	120	30	90	30
14	5003830	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5003839	Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου (Α ΦΑΣΗ)	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	66	10	20	37	100	120	0	84	60	40	90	90	30	90	30
14	5003853	Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα - Β΄Φάση	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	72	10	100	50	100	90	0	84	150	60	150	120	30	90	30
14	5003920	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β')	Ναι	Τελική Φάση	50	20	56	10	20	50	50	30	20	60	60	100	10	120	30	150	10
14	5003925	Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας - Β' Φάση.	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	71	10	100	44	100	120	0	90	60	80	120	120	30	90	30
14	5003926	Αποχετευτικό ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας - Β' Φάση	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	76	10	100	46	100	90	0	90	150	80	150	120	30	90	30
14	5003944	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ) - Φάση Β'	Ναι	Τελική Φάση	50	20	87	10	100	47	30	20	0	60	150	60	50	90	30	90	10
14	5003948	Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού - Φάση Β'	Ναι	Τελική Φάση	50	20	80	10	100	50	40	20	0	60	150	80	50	90	30	60	10
14	5003967	Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας - Φάση Β'	Ναι	Τελική Φάση	50	20	80	10	100	40	50	20	0	60	150	40	50	90	30	60	10
14	5004002	Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	53	10	60	50	100	60	0	126	30	80	30	120	30	90	30
14	5004007	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β'	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	63	10	100	40	100	120	0	126	60	40	90	90	30	90	30
14	5004008	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β ΦΑΣΗ	Ναι	Τελική Φάση	50	20	40	10	60	48	50	40	0	84	60	100	40	120	30	90	10
14	5004011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	Όχι	Τελική Φάση	50	100	85	10	100	50	50	30	0	84	150	40	50	90	30	90	10
14	5004021	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	60	10	100	43	50	30	0	40	30	60	50	120	30	90	10
14	5004022	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5004029	Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας - Β' Φάση	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	70	10	60	48	100	90	0	90	90	80	150	120	30	90	30
14	5004037	Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	73	20	100	80	100	40	0	60	10	10	90	40	20	60	150
14	5004038	Δράσεις για την διαλογή στη Πηγή και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	60	20	40	0	60	10	10	30	30	20	60	150
14	5004044	Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	100	10	100	50	100	30	0	90	30	40	30	120	30	60	30
14	5004048	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Β' ΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	100	10	100	40	100	60	0	120	30	60	90	120	30	60	30
14	5004058	Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	65	10	60	50	100	90	0	120	30	60	30	120	30	90	150
14	5004073	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	64	10	20	50	100	90	20	120	30	40	30	120	30	90	150

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	5004085	Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	85	10	100	42	100	90	0	120	30	40	90	120	30	120	30
14	5004091	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Χωριστής	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	100	10	100	21	100	30	0	120	30	60	30	120	30	60	30
14	5004093	Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	70	10	100	40	100	60	0	120	60	40	60	120	30	90	30
14	5004096	Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	53	10	60	40	100	60	0	120	30	40	30	120	30	60	30
14	5004098	Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	64	10	100	41	100	90	0	90	90	40	60	120	30	60	30
14	5004102	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	Τελική Φάση	50	100	100	10	100	40	20	10	0	60	30	20	30	120	30	30	10
14	5004104	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα	Όχι	Τελική Φάση	50	100	80	10	60	40	40	20	0	60	30	80	20	120	30	60	10
14	5004118	Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας - Φάση Β'	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	100	10	100	50	100	60	0	90	30	20	30	90	30	60	90
14	5004136	Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	65	10	100	45	100	90	0	60	30	80	30	120	30	60	30
14	5004137	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	20	40	20	0	40	10	10	60	40	20	60	30
14	5004184	Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	65	10	60	40	100	90	0	60	30	60	30	120	30	60	30
14	5004186	Κατασκευή έργων αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Κύρρου	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	65	10	60	48	100	90	0	90	30	80	90	120	30	60	30
14	5004195	Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	72	20	60	100	100	60	30	60	10	30	30	40	20	90	30
14	5004201	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου Εμμανουήλ Παππά (Α Φάση)	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	65	10	60	40	100	90	0	120	30	60	30	120	30	90	30
14	5006101	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	65	10	60	44	60	90	0	60	30	40	30	120	30	60	30
14	5006302	Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου	Όχι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5007242	Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	72	20	100	100	100	60	0	40	10	10	30	30	20	60	90
14	5007243	Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Παξών	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	75	20	100	100	40	60	0	40	10	10	30	30	20	30	150
14	5007265	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	68	20	100	90	100	60	30	40	10	10	30	40	20	60	30
14	5007692	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	65	10	60	40	100	90	0	90	30	20	60	120	30	90	30
14	5007704	Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	53	10	60	40	100	60	0	90	90	20	30	120	30	90	30
14	5007705	ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	100	20	100	80	40	20	0	60	10	10	90	40	20	30	30
14	5007706	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	80	60	40	0	60	10	10	60	30	20	60	90
14	5007720	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	70	10	60	40	100	90	0	90	60	60	30	120	30	150	150
14	5007730	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	100	20	100	80	100	40	0	58	10	20	60	40	20	90	30
14	5007734	Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτίου (εκτός συσκευασιών) Κέρκυρας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	80	60	40	0	58	10	20	30	30	20	30	150
14	5007735	Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Κέρκυρας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	80	80	40	0	58	10	20	30	30	20	30	90
14	5007736	Κατασκευή και εξοπλισμός Πράσινων Σημείων Κέρκυρας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	80	100	40	0	58	10	20	30	30	20	60	150
14	5007751	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΒΑΛΤΟΥ	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5007754	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΗΛΙΔΑΣ) - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	87	10	100	43	60	60	0	60	30	20	120	90	30	60	150
14	5007756	Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχής Μώλου Δ. Σκύρου	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	70	10	100	20	100	60	0	60	30	20	30	120	30	60	30
14	5007769	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	100	10	100	40	100	60	0	60	30	40	30	120	30	60	30
14	5007773	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	65	20	100	80	100	60	0	40	10	20	90	40	20	60	30
14	5007830	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	70	10	60	40	100	60	0	60	90	40	30	120	30	60	30
14	5007974	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, ΒΑΤΕΡΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	64	10	60	40	100	120	20	66	30	60	30	120	30	90	30
14	5008123	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ	Όχι	Τελική Φάση	50	100	65	10	100	43	50	30	0	80	150	40	50	120	30	60	10
14	5008909	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΗΒΑΣ	Όχι	Τελική Φάση	50	100	66	10	100	37	50	40	10	60	150	40	50	120	30	60	10
14	5008942	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β ΦΑΣΗ 2014-2020)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	87	10	60	47	100	90	0	90	30	60	150	120	30	90	30
14	5009076	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ	Όχι	Τελική Φάση	50	100	53	10	100	40	50	20	0	62	30	20	10	120	30	90	10
14	5009753	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	60	10	100	50	100	90	0	96	120	20	60	120	30	90	90

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	5009762	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	56	10	100	45	100	90	0	96	30	40	30	120	30	90	90
14	5009784	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	65	10	100	40	100	90	0	96	30	20	30	120	30	60	90
14	5009816	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	67	20	100	80	100	60	30	64	10	20	30	40	20	90	90
14	5009825	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	70	10	100	46	100	90	20	120	30	40	30	120	30	90	90
14	5009843	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	48	20	60	40	100	60	0	80	10	20	30	30	20	120	30
14	5009844	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Ναι	Φάση Ενεργοποίησης	50	20	78	20	100	100	100	80	0	80	10	30	30	30	20	90	150
14	5009847	Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	60	10	100	35	100	60	0	90	30	40	30	90	30	120	30
14	5009865	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	73	20	100	70	100	40	0	60	10	10	30	30	20	120	30
14	5009884	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	80	10	100	50	80	90	20	120	150	40	60	90	30	60	30
14	5010157	ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	100	20	100	40	100	20	0	80	10	10	30	40	20	60	30
14	5010174	ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	100	10	100	20	100	30	0	90	30	40	30	120	30	60	30
14	5010474	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	60	10	20	50	40	90	20	90	120	60	60	90	30	90	90
14	5010501	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	67	10	60	40	100	60	20	90	30	80	90	90	30	60	30
14	5010589	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	40	100	40	0	60	10	10	30	30	20	150	150
14	5010594	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	80	80	60	0	40	10	20	60	30	20	60	30
14	5010808	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	100	10	100	45	100	60	0	90	30	60	30	120	30	90	30
14	5010830	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	65	10	100	50	40	90	0	90	60	40	120	120	30	90	30
14	5010856	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	70	10	100	20	60	60	0	90	90	40	30	60	30	60	30
14	5010880	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υπο-περιοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	30	100	63	10	100	20	60	120	0	60	60	40	30	60	30	90	30
14	5010905	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	48	20	60	0	40	10	10	30	30	20	30	30
14	5011041	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	70	20	60	40	100	40	0	40	10	20	30	40	20	90	30
14	5011456	ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	40	100	60	30	40	10	10	90	30	20	90	30
14	5014383	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΧΙΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	73	20	60	40	100	40	30	60	10	10	30	30	20	60	30
14	5016111	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	55	20	60	100	60	60	30	60	10	10	30	40	20	150	30
14	5030337	Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Κυλίκις	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	100	20	100	55	60	20	0	80	10	20	30	30	20	90	30
14	5030709	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	33	40	40	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5030765	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	33	100	60	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5030806	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαπόβλητων στο Δήμο Φλώρινας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	33	100	40	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5030897	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	33	100	60	0	40	10	10	30	30	20	30	30
14	5030935	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	33	100	60	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5030949	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	40	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5030967	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	20	60	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5030970	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμος Καστοριάς	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	60	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5030973	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	40	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5030977	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	20	60	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5031852	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων νήσου Λέσβου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	50	20	100	100	100	60	0	80	10	20	30	30	20	60	30
14	5032510	ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 3ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β')	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	80	20	100	100	100	40	0	80	10	10	30	30	20	60	30
14	5032589	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	80	10	100	30	100	60	0	120	30	20	30	60	30	30	30
14	5032671	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	80	10	100	30	100	30	0	90	30	20	30	60	30	30	30

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	5032679	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	65	10	100	30	100	90	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5032753	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	85	10	100	30	100	90	0	120	30	20	30	60	30	30	30
14	5032910	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	70	20	100	60	100	40	0	60	10	10	30	20	20	30	30
14	5032966	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	70	10	100	30	100	60	0	60	30	20	30	60	30	30	30
14	5033022	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	80	10	100	30	100	30	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5033024	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	80	10	100	18	100	30	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5033035	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδότης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	65	10	100	18	100	90	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5033059	Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Χίου	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	60	10	100	10	60	60	0	90	30	40	30	90	30	30	30
14	5033072	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ.	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	20	20	0	60	10	10	60	30	20	30	30
14	5033127	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	80	20	40	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5033173	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	95	10	100	40	100	90	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5033190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	70	10	100	18	100	60	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5033216	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	80	10	100	20	100	30	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5033224	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑ-ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	96	20	100	40	100	60	0	60	10	10	30	20	20	30	30
14	5033228	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	80	10	100	20	100	30	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5033233	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	67	10	100	25	100	60	0	90	30	40	30	60	30	30	30
14	5033240	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	64	10	100	25	100	90	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5033258	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	83	10	100	15	100	90	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5033259	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	90	10	100	15	100	60	0	60	30	20	30	60	30	30	30
14	5033267	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού για δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	67	10	100	20	100	60	0	60	90	20	30	60	30	30	30
14	5033396	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	67	10	100	20	100	60	0	60	30	20	30	60	30	30	30
14	5033615	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	70	10	100	20	100	60	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5033657	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	80	10	100	20	100	90	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5033697	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	67	20	100	40	100	40	0	60	10	10	30	20	20	30	30
14	5035327	Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	40	100	60	60	80	10	20	30	30	20	150	150
14	5037423	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	20	100	40	0	80	10	10	30	30	20	30	150
14	5037435	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	67	10	60	20	100	60	0	90	30	60	30	90	30	60	30
14	5037440	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑΣ)	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	73	20	100	40	100	40	0	60	10	10	30	30	20	150	30
14	5037507	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	40	60	40	0	60	10	10	30	30	20	30	150
14	5037835	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	40	80	40	0	60	10	10	30	30	20	30	150
14	5037844	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Θερμαϊκού	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	40	40	40	0	60	10	10	30	30	20	30	150
14	5037845	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Χαλκηδόνας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	40	20	40	0	60	10	10	30	30	20	30	150
14	5037978	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ-ΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	150	100	65	10	60	40	100	90	0	90	30	40	30	120	30	60	30
14	5038606	Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριτιδιανά - Αχλαδές και Μεσιδιόνη Δήμου Μυλοποτάμου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	100	100	40	0	40	10	20	30	40	20	60	30
14	5038687	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	20	20	0	60	10	10	30	30	20	30	30

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	5038731	Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	78	40	100	100	100	80	150	80	10	10	30	40	20	150	150
14	5039507	Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση - Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	71	20	100	100	100	80	30	80	10	10	30	40	20	150	150
14	5040396	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	53	20	60	40	100	40	0	80	10	10	30	40	20	120	30
14	5040764	Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Σάμου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	60	20	0	60	10	20	60	30	20	30	30
14	5041535	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Όχι	Φάση Εκτέλεσης	90	100	80	10	100	10	100	60	0	90	30	20	30	60	30	30	30
14	5041661	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	64	20	60	20	100	60	0	60	10	10	30	40	20	90	150
14	5041858	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	65	20	60	80	100	60	0	40	10	10	30	40	20	60	30
14	5041968	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτών Δήμου Πέλλας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	73	20	100	80	20	40	0	60	10	10	30	30	20	30	150
14	5041983	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Νέας Ζίχνης	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	80	100	40	0	60	10	10	30	30	20	30	150
14	5042641	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	67	20	100	80	100	40	0	60	10	10	30	30	20	30	150
14	5042914	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	80	20	100	100	100	40	0	60	10	10	30	30	20	30	150
14	5045016	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	64	20	60	100	100	60	0	60	10	10	30	40	20	90	150
14	5045323	Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	100	20	100	100	100	40	0	60	10	10	30	30	20	60	150
14	5045462	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	67	40	60	100	100	60	30	60	10	10	30	40	20	150	150
14	5045879	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	65	20	60	100	100	60	0	80	10	10	30	40	20	90	150
14	5046467	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΑΝΗΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	80	60	40	0	80	10	10	30	30	20	30	30
14	5046474	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΛΑΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	100	20	100	80	100	20	0	60	10	10	30	30	20	30	30
14	5046733	ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	60	20	100	20	60	20	0	60	10	10	30	30	20	60	30
14	5047363	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	64	20	60	20	100	60	0	40	10	10	30	40	20	90	150
14	5047436	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	20	20	0	40	10	10	30	30	20	30	30
14	5047786	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	80	0	40	10	10	30	20	20	90	30
14	5048164	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ (Β' ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	70	20	60	20	100	60	0	40	10	10	30	40	20	90	150
14	5048178	Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμο Αλίμου	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	80	40	0	40	10	10	30	30	20	60	30
14	5049422	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	40	0	40	10	10	30	30	20	90	30
14	5050807	2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	10	100	60	20	100	20	100	60	0	60	10	10	30	20	20	90	30
14	5051036	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	60	20	100	20	100	60	0	40	10	10	30	30	20	60	30
14	5052057	Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	100	20	100	20	80	20	0	80	10	10	30	30	20	60	150
14	5052059	Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού.	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	100	20	100	20	100	20	0	60	10	10	30	30	20	60	150
14B	5010484	Κατασκευή ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου - Φάση Β'	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5041382	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας	Όχι	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	55	20	60	40	100	60	0	60	10	20	30	30	20	120	150
14B	5000940	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ-Β' ΦΑΣΗ(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5000986	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5001010	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ	Ναι	Τελική Φάση	50	20	76	10	20	47	50	30	0	52	150	80	10	120	30	60	10
14B	5001047	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΙΑΣΜΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5001253	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	66	10	20	47	100	120	0	99	30	100	120	120	30	90	30
14B	5001477	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	73	10	100	50	60	60	0	60	150	80	150	120	30	60	30
14B	5001486	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ-Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	60	10	100	50	80	60	0	90	30	60	150	120	30	60	30
14B	5001904	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	70	10	60	45	80	90	0	120	120	100	150	120	30	60	30

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14B	5001954	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ).	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	66	10	60	46	100	120	0	60	120	100	90	120	30	90	30
14B	5002036	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	80	10	100	40	50	30	0	40	30	100	10	120	30	60	10
14B	5002185	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5002336	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	80	10	100	45	50	30	0	72	30	80	50	120	30	60	10
14B	5002566	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	Ναι	Τελική Φάση	50	20	70	10	100	50	10	20	0	48	90	100	50	120	30	60	10
14B	5002580	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΝΕΣΤΟΥ _ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ , ΕΡΑΤΕΙΝΟ, ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5002634	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β ΦΑΣΗ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5002639	Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης (Β' Φάση)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	53	10	60	50	50	20	0	40	150	80	40	120	30	60	10
14B	5002659	ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	55	10	100	50	30	30	0	60	90	60	50	120	30	60	10
14B	5002661	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	73	10	60	47	40	30	0	60	150	40	50	120	30	60	10
14B	5002668	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	100	10	100	46	50	20	0	40	30	60	50	120	30	60	10
14B	5002916	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5003029	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003029	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5003291	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	64	10	100	48	40	30	0	40	60	40	30	120	30	60	10
14B	5003381	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	68	10	100	50	50	30	0	60	60	80	50	120	30	120	10
14B	5003413	ΈΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5003473	«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	69	10	20	49	30	40	0	60	120	60	20	120	30	60	10
14B	5003520	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ α) Δ.Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, β) Δ.Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Β ΦΑΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5003521	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων (του τ. Δήμου Κομποτίου) και των οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας - Β' ΦΑΣΗ	Ναι	Τελική Φάση	50	20	65	10	60	50	50	30	0	40	150	100	20	120	30	60	10
14B	5003537	«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»	Ναι	Τελική Φάση	50	20	60	10	100	40	10	20	0	40	90	60	30	120	30	60	10
14B	5003540	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	85	10	100	46	100	90	0	60	90	80	150	120	30	90	30
14B	5003577	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003577	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	73	10	60	47	100	120	20	60	30	60	150	120	30	120	30
14B	5003617	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ- Β ΦΑΣΗ	Ναι	Τελική Φάση	50	20	73	10	60	50	50	20	0	40	150	40	50	120	30	60	10
14B	5003630	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5003662	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	75	10	100	43	100	90	0	90	60	60	150	120	30	90	30
14B	5003714	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	Ναι	Τελική Φάση	50	20	80	10	100	43	50	30	0	60	30	80	10	120	30	90	10
14B	5003800	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ Β ΦΑΣΗ	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	73	10	100	49	100	90	0	90	90	80	150	120	30	120	30
14B	5003809	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5003813	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	64	10	60	50	100	120	0	90	90	60	150	120	30	90	30
14B	5003960	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ - Β' ΦΑΣΗ	Ναι	Τελική Φάση	50	20	70	10	100	50	50	30	0	60	150	80	50	120	30	90	10
14B	5005589	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	73	10	60	40	50	30	0	60	60	80	50	120	30	90	10
14B	5006004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ, ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -Β' ΦΑΣΗ	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5007244	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Β.Κ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	Ναι	Τελική Φάση	50	20	80	10	100	48	50	30	0	40	30	60	50	120	30	90	10
14B	5007289	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5007594	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	71	10	60	42	50	40	10	40	30	100	50	120	30	60	10

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (PHASING)	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14B	5007639	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5007670	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	100	10	100	49	100	60	0	60	60	60	150	120	30	120	30
14B	5007717	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Β' ΦΑΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5007718	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)	Ναι	Φάση Εκτέλεσης	150	20	62	10	60	40	100	120	0	90	150	80	150	120	30	90	30
14B	5007724	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού - Λιμεναρίων Θάσου - Δίκτυα Αποχέτευσης (Β' Φάση)	Ναι	Τελική Φάση	50	20	89	10	100	50	50	40	0	58	150	80	50	120	30	90	10
14B	5007992	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5008024	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ,ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)	Ναι	Ολοκληρώθηκε	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14B	5008966	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β ΦΑΣΗ	Ναι	Φάση Ενεργοποίησης	50	20	63	20	20	87	100	80	30	62	10	20	30	40	20	120	150
14B	5009739	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Ναι	Τελική Φάση	50	20	87	10	100	45	20	20	0	64	30	40	50	120	30	30	10

7.4 Πίνακας Βαθμολογίας Παραγόντων κινδύνου για τα Προγραμματικά έργα

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
1	1.1	GSM-R & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ, ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΙΔΟΜΕΝΗ)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	20	0	75	80	0	10	15	0	0	0	30	0	150	150
1	1.2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΚΑ) - ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - ΡΙΟ (ΕΠΙΔΟΜΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	75	100	0	30	15	0	0	0	60	0	150	150
2	2.1	ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΟ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	50	0	105	60	0	20	15	0	0	0	60	0	150	90
4	4.1	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΡΕΣ (ΧΘ 36+000 - 47+300) ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	80	0	15	20	0	0	0	50	0	90	150
4	4.2	ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΙ (ΦΟΔΕΛΕ - ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	40	0	60	40	0	20	20	0	0	0	64	0	60	150
6	6.1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (VTMIS)	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	75	100	0	10	20	0	0	0	40	0	150	150
7	7.1	DATIS – ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΟΥΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	45	20	0	10	17	0	0	0	30	0	60	30
7	7.2	ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΡΑΝΤΑΡ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	40	0	150	100	0	10	17	0	0	0	54	0	150	90
7	7.3	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ Α/Φ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ Α/Δ ΛΗΜΝΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	120	100	0	10	18	0	0	0	54	0	90	90
7	7.4	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ CNS/ATM, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FLIGHT INSPECTION SYSTEM)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	50	0	120	100	0	40	18	0	0	0	80	0	120	30
7	7.5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (MLAT/WAM) ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α/Δ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	50	0	75	100	0	10	18	0	0	0	36	0	60	150
7	7.6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ (VCS)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	105	100	0	10	18	0	0	0	54	0	60	150
7	7.7	ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α/Δ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ RADAR	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	105	100	0	10	17	0	0	0	36	0	90	150
7	7.8	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	90	100	0	10	20	0	0	0	36	0	150	90
7	7.9	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	90	100	0	10	20	0	0	0	56	0	120	90
7	7.10	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	90	100	0	10	20	0	0	0	40	0	90	150
7	7.11	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΗΛΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	105	100	0	10	20	0	0	0	46	0	90	150
7	7.12	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ	Φάση Εκτέλεσης	150	100	20	90	20	84	30	30	90	40	20	10	30	105	30	150	30
9	9.1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	56	0	60	80	0	10	24	0	0	0	64	0	150	90
9	9.2	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ο.Σ.Τ.Ι)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	50	0	84	100	0	10	19	0	0	0	30	0	90	150

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
9	9.3	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Ο.Σ.Π.Ε)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	50	0	90	100	0	10	19	0	0	0	30	0	60	150
9	9.5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	56	0	60	100	0	10	19	0	0	0	64	0	150	90
9	9.6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ 8ης ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	45	100	0	10	19	0	0	0	46	0	150	90
9	9.7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	40	0	45	100	0	10	10	0	0	0	40	0	60	150
10	5035491	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	26	0	0	0	44	0	60	90
10	5038137	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤ4 ΚΤ5α ΚΤ5β ΚΤ5δ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	24	0	0	0	44	0	60	30
10	5038718	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κτίρια Β' Γ' του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	32	0	0	0	44	0	60	30
10	5038745	Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	30	0	0	0	44	0	60	30
10	5041453	Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	29	0	0	0	44	0	60	30
10	5041778	Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Κατερίνης	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	37	0	0	0	44	0	60	30
10	5041830	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	37	0	0	0	44	0	60	30
10	5041850	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	28	0	0	0	44	0	60	30
10	5044769	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικών	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	36	0	135	100	0	10	24	0	0	0	40	0	60	30
10	5044902	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο Πατησίων	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	36	0	135	100	0	10	31	0	0	0	40	0	60	30
10	5045516	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων Εξοικονόμησης ενέργειας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	36	0	135	100	0	10	31	0	0	0	44	0	60	30
10	5047095	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	36	0	135	100	0	10	23	0	0	0	40	0	60	30
10	5048176	Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	22	0	0	0	44	0	60	30
10	5049216	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΜΤΥ ΤΜΑΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	25	0	0	0	44	0	60	30
10	5049418	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΓΓΗ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	23	0	0	0	44	0	60	30
10	5049917	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	36	0	135	100	0	10	25	0	0	0	44	0	60	30
10	5050479	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΚοργιαλένειοΜπενάκειο ΕΕΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	28	0	0	0	40	0	60	30
10	5051065	Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίτολης	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	30	0	0	0	44	0	60	30
10	5052382	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	36	0	135	100	0	10	30	0	0	0	44	0	60	30
10	5052425	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	30	0	0	0	44	0	60	30
10	5052612	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	25	0	0	0	40	0	60	30
10	5052625	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη Αγλαΐας Κυριακού	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	24	0	135	100	0	10	22	0	0	0	44	0	60	30
11	5032692	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	45	100	0	20	22	0	0	0	54	0	150	30
11	5032695	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 18536 ΕΩΣ ΧΘ 9300 ΣΙΦΩΝ ΜΟΡΝΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	45	40	0	20	22	0	0	0	56	0	90	30
11	5035554	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0000 ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π ΚΗΦΙΣΟ ΕΩΣ ΧΘ 12000	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	45	100	0	20	22	0	0	0	58	0	120	30
11	5046065	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0824 ΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Π ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΕΩΣ ΧΘ 8161 ΣΥΜΒΟΛΗ Ρ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	45	80	0	20	22	0	0	0	50	0	120	30
11	5049565	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΦΑΣΗ Β	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	60	0	15	22	0	0	0	46	0	90	30
14	5001862	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	60	0	15	31	0	0	0	50	0	90	150
14	5001925	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	75	100	0	25	28	0	0	0	50	0	90	150
14	5002057	Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σκύρου	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	24	0	105	100	0	20	30	0	0	0	46	0	60	150
14	5002063	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	60	100	0	15	31	0	0	0	46	0	60	150
14	5002184	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	60	100	0	20	27	0	0	0	50	0	60	150
14	5002245	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	80	0	20	26	0	0	0	50	0	30	90
14	5002249	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	100	0	20	29	0	0	0	46	0	60	90
14	5002257	Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μη Επικινδύνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου ΆργουςΜυκηνών	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	24	0	60	100	0	20	30	0	0	0	46	0	60	150
14	5002266	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	60	100	0	20	30	0	0	0	46	0	60	150

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	5002363	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	60	100	0	20	34	0	0	0	50	0	60	150
14	5002369	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	60	100	0	20	28	0	0	0	46	0	60	150
14	5002616	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΥΤΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	75	100	0	20	22	0	0	0	50	0	90	30
14	5002736	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	60	100	0	20	31	0	0	0	46	0	60	150
14	5003655	ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	75	100	0	25	26	0	0	0	50	0	90	90
14	5007668	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΔ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	120	100	0	20	25	0	0	0	50	0	90	90
14	5010434	Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	75	100	0	25	36	0	0	0	60	0	30	30
14	5010825	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (σ.σ. Βόλου)	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	105	100	0	20	27	0	0	0	50	0	150	30
14	5021581	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	135	100	0	25	28	0	0	0	50	0	90	150
14	5033268	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	20	28	0	0	0	40	0	30	150
14	5036158	ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	100	0	20	31	0	0	0	46	0	60	30
14	5037854	ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	40	0	20	25	0	0	0	46	0	30	30
14	5038180	Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμματοφόρων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Αγρινίου	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	20	0	60	20	0	10	24	0	0	0	36	0	30	30
14	5041446	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	20	0	60	100	0	10	27	0	0	0	40	0	30	30
14	5041587	Δράσεις Διαλογής στην Πηγή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	36	0	75	40	0	10	27	0	0	0	46	0	60	30
14	5041655	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	100	0	10	30	0	0	0	40	0	30	30
14	5041742	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	20	0	60	20	0	10	26	0	0	0	38	0	30	30
14	5041752	Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμματοφόρων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	20	0	60	40	0	10	23	0	0	0	40	0	30	30
14	5041828	Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	80	0	15	22	0	0	0	40	0	30	150
14	5042232	Δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	80	0	15	27	0	0	0	30	0	30	150
14	5042936	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α' Φάση	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	120	100	0	15	22	0	0	0	56	0	150	150
14	5044805	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΚ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΤΚ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	75	100	0	20	22	0	0	0	60	0	120	30
14	5044949	Κατασκευή Πράσινων Σημείων Δήμου Αγρινίου	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	20	0	15	24	0	0	0	40	0	30	150
14	5045242	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	20	26	0	0	0	44	0	30	30
14	5045314	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	100	0	15	31	0	0	0	44	0	60	30
14	5045553	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	20	0	15	27	0	0	0	30	0	30	150
14	5045594	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	18	23	0	0	0	30	0	90	150
14	5045836	Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	135	100	0	10	30	0	0	0	90	0	120	150
14	5046462	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΑΝΑΒΑΛΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	135	60	0	20	38	0	0	0	90	0	90	150
14	5047962	Πράσινο σημείο Δήμου Πρέβεζας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	40	0	15	27	0	0	0	40	0	30	150
14	5048161	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	15	28	0	0	0	46	0	30	30
14	5048183	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	15	20	0	0	0	46	0	90	30
14	5049443	Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτνίας	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	45	100	0	20	32	0	0	0	50	0	120	30
14	5049512	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΛΑΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	20	0	75	60	0	18	35	0	0	0	46	0	30	30
14	5050020	Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	15	31	0	0	0	46	0	30	30
14	5050210	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	25	27	0	0	0	46	0	30	30
14	5050818	Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Ηρακλείου	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	50	0	45	100	0	15	23	0	0	0	50	0	150	150
14	5050864	Πράσινο σημείο Δήμου Πάργας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	100	0	15	27	0	0	0	40	0	30	150
14	5051049	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	20	0	75	100	0	15	28	0	0	0	50	0	60	30
14	5052273	2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	20	0	60	60	0	10	22	0	0	0	40	0	60	30
14	5052679	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	15	31	0	0	0	46	0	60	30
14	5053784	Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	40	0	18	33	0	0	0	40	0	30	150
14	5053806	Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζίτσας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	100	0	18	32	0	0	0	40	0	30	150

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	5053834	Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζηρού	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	60	0	18	30	0	0	0	40	0	30	150
14	5053879	Κατασκευή "Πράσινου Σημείου" στο Δήμο Ιωαννιτών	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	60	0	18	25	0	0	0	40	0	30	150
14	5053881	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	40	0	75	100	0	15	10	0	0	0	46	0	90	30
14	5053893	Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Κόνιτσας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	100	0	18	21	0	0	0	40	0	30	150
14	5067645	Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στον Δήμο Καβάλας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	36	0	75	100	0	18	22	0	0	0	30	0	60	150
14	5067690	Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στο Δήμο Ορεστιάδας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	36	0	75	80	0	18	23	0	0	0	30	0	30	150
14	5067847	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Διδυμοτείχου	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	18	25	0	0	0	30	0	30	150
14	5068823	Προμήθεια κινητών πράσινων σημείων του δήμου Κομοτηνής	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	40	0	10	27	0	0	0	40	0	30	150
14	5068968	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΗΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	18	31	0	0	0	46	0	30	150
14	5068979	Δημιουργία Πράσινου σημείου στο Δήμο Αβδήρων	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	18	33	0	0	0	30	0	30	150
14	5069031	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	18	28	0	0	0	30	0	60	150
14	14.1	ΣΜΑ ΣΕ ΚΡΗΤΗ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Δήμος Αποκωρώνου, Μαλεβίζι, 12 ΣΜΑ ΣΔΙΤ Πελοποννήσου). 6 δράσεις	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	60	100	0	18	18	0	0	0	60	0	120	150
14	14.2	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Αττικής - Πελοποννήσου (Μοσχάτο, Νίκαια, Ραφήνα, Ηράκλειο, Μαραθώνας, Διόνυσος, Γαλάτσι, Καισαριανή, Χαλάνδρι, Ίλιον, Σαρωνικός, Αμαρούσιο, Ελληνικό, Ανατολική Μάνη).	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	120	100	0	20	22	0	0	0	46	0	90	150
14	14.3	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Γλυφάδας	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	20	22	0	0	0	40	0	90	150
14	14.4	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Χαιδαρίου	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	40	0	20	22	0	0	0	40	0	30	150
14	14.5	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	84	60	0	20	28	0	0	0	46	0	60	150
14	14.6	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων περιοχής Δυτικής Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας - Δυτικός Τομέας	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	45	100	0	20	19	0	0	0	50	0	150	150
14	14.7	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Χαλκίδα	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	45	100	0	20	19	0	0	0	50	0	150	150
14	14.8	Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Λαμία	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	45	100	0	20	19	0	0	0	40	0	150	150
14	14.9	Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Λάρισα	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	45	100	0	20	18	0	0	0	40	0	150	150
14	14.10	Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Φωκίδα	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	45	60	0	20	19	0	0	0	40	0	90	150
14	14.11	Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Βορ. Έβρος	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	45	100	0	20	20	0	0	0	40	0	90	150
14	14.12	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	45	100	0	20	17	0	0	0	50	0	150	150
14	14.13	ΟΕΔΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	105	100	0	20	27	0	0	0	60	0	90	150
14	14.14	Υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Λέσβος	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	90	100	0	18	28	0	0	0	40	0	120	150
14	14.15	ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΦΔΠΠ (11 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	40	0	90	100	0	10	18	0	0	0	66	0	90	30
14	14.16	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	90	100	0	18	10	0	0	0	50	0	150	30
14	14.17	Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμού Ερέτριας	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	60	100	0	18	26	0	0	0	40	0	90	150
14	14.18	Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	60	100	0	18	24	0	0	0	46	0	90	150
14	14.19	Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος (έργα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού)	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	60	100	0	18	29	0	0	0	46	0	90	150
14	14.20	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	135	100	0	18	19	0	0	0	46	0	90	150
14	14.21	ΟΕΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ)	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	60	100	0	20	22	0	0	0	70	0	120	150
14	14.22	ΜΕΒΑ Ανατολικής Αττικής	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	60	0	18	18	0	0	0	66	0	90	150
14	14.23	ΜΕΒΑ Δυτικής Αττικής	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	60	0	18	19	0	0	0	66	0	90	150
14	14.24	ΜΕΑ Σχιστού	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	90	100	0	18	19	0	0	0	70	0	150	150
14	14.25	ΜΕΑ Φυλής	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	90	100	0	18	19	0	0	0	70	0	150	150
14	14.26	Δράσεις ανακύκλωσης και συλλογής βιοαποβλήτων (54 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	20	0	90	100	0	18	15	0	0	0	64	0	150	150
14	14.27	Νέα Έργα αποχέτευσης σε οικισμούς Γ προτεραιότητας (2 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	105	100	0	18	15	0	0	0	40	0	120	150
14	14.28	Δράσεις πράσινων σημείων	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	90	100	0	15	40	0	0	0	44	0	60	150
14	14.29	Νέες Δράσεις διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	90	20	0	15	33	0	0	0	40	0	30	30
14	14.30	Δράσεις μεταφοράς και διαχείρισης βιοαποβλήτων	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	90	40	0	18	33	0	0	0	40	0	30	90
14	14.31	Δημιουργία Πράσινων Σημείων	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	60	100	0	15	40	0	0	0	40	0	90	150

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17
14	14.32	ΜΕΒΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (7 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	100	0	18	25	0	0	0	66	0	90	150
14	14.33	Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	60	100	0	20	25	0	0	0	50	0	120	150
14	14.34	Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (α΄ φάση)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	75	100	0	18	22	0	0	0	40	0	90	30
14	14.35	Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (β΄ φάση)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	105	80	0	18	22	0	0	0	40	0	60	90
14	14.36	Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Μονάδες Κομποστοποίησης Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	90	100	0	18	22	0	0	0	40	0	90	90
14	14.37	Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Καναλακίου	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	84	100	0	18	22	0	0	0	46	0	90	150
14	14.38	Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (4 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	105	100	0	20	25	0	0	0	50	0	90	30
14	14.39	Δράσεις μεταφοράς και διαχείρισης βιοαποβλήτων (25 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	120	100	0	15	25	0	0	0	40	0	60	30
14	14.40	Δράσεις πράσινων σημείων (25 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	120	100	0	18	18	0	0	0	40	0	90	90
14	14.41	Προς ένταξη έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης αρ. 32 (Νέα Στύρα, Μαρτίνο)	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	105	100	0	18	40	0	0	0	60	0	90	90
14	14.42	Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	90	100	0	15	25	0	0	0	40	0	60	30
14	14.43	ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (10 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	90	100	0	15	40	0	0	0	46	0	60	30
14	14.44	ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (8 δράσεις)	Φάση Ενεργοποίησης	30	100	0	30	0	90	100	0	15	40	0	0	0	40	0	60	150
14	14.45	ΜΕΒ ΞΕΡΟΛΑΚΚΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	90	100	0	15	23	0	0	0	50	0	60	90
14	14.46	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ ΦΛΟΚΑ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	90	100	0	15	23	0	0	0	50	0	90	90
14	14.47	ΜΕΑ-ΜΕΒ ΦΛΟΚΑ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	90	100	0	20	23	0	0	0	60	0	120	150
14B	14B.1	Πράσινα Σημεία σε Δήμους Ν. Αιγαίου (Τήνος, Μύκονος, Πάρος, Κύθνος & Κώς).	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	90	100	0	18	29	0	0	0	40	0	60	90
14B	14B.2	Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και έργο επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	90	100	0	18	29	0	0	0	66	0	60	90
14B	14B.3	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	60	20	0	12	35	0	0	0	46	0	30	90
14B	14B.4	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	90	40	0	15	35	0	0	0	46	0	60	90
14B	14B.5	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων και Αστικών Αποβλήτων στο Νότιο Αιγαίο	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	90	60	0	15	28	0	0	0	46	0	60	90
14B	14B.6	ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	100	0	20	30	0	0	0	50	0	90	150
14B	14B.7	ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	100	0	20	31	0	0	0	46	0	60	90
14B	14B.8	ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	40	0	75	100	0	25	27	0	0	0	60	0	90	90
14B	14B.9	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Κω	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	36	0	75	100	0	20	40	0	0	0	46	0	90	150
14B	14B.10	Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Νήσου Ρόδου.	Φάση Ενεργοποίησης	50	100	0	30	0	75	100	0	20	31	0	0	0	46	0	120	150
